



Sprawozdanie za 2018 rok z postępu realizacji
Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego na lata 2016-2023

Ostrowiec Świętokrzyski, 11.03.2019 r.


Spis treści

I.	Wstęp	3
II.	Sposób i zakres monitorowania Programu	4
	1. Stopień realizacji projektów i założonych celów Programu Rewitalizacji.....	5
	2. Zakres i przedmiot zmian w projektach Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016 -2023.....	6
III.	Źródła finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych.....	7
IV.	„Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”	9
V.	Wskaźniki postępu wdrażania Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023.....	9
VI.	Wskaźniki społeczno-gospodarcze rewitalizowanego obszaru.....	13
	1. Badane kryteria (wskaźniki rezultatu).....	13
VII.	Podsumowanie.....	16

I. Wstęp.

W 2016 r. Uchwałą Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego nr XL/140/2016 z dnia 28.12.2016 r. został przyjęty Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023. Dokument został opracowany w oparciu o nowe podejście do procesu odnowy obszarów miejskich, zaprezentowane w rządowych „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020”. Przygotowana została diagnoza całego miasta w oparciu o podziały urbanistyczne, bazujące na utrwalonych związkach przestrzennych, funkcjonalnych i społeczno-ekonomicznych jakimi są osiedla. Diagnoza zawiera szczegółową analizę problemów społecznych oraz gospodarczych, technicznych, przestrzenno-funkcjonalnych i środowiskowych. Na jej podstawie zostały wyznaczone obszary zdegradowane, a spośród nich obszar rewitalizacji (składający się z 6 podobszarów) obejmujący (zgodnie z wytycznymi) nie więcej niż 20% powierzchni miasta (664,730 ha) i zamieszkały przez nie więcej niż 30% mieszkańców (16 622 mieszkańców) - Rys.1.

Rys.1. Mapa obszarów zrewitalizowanych i zdegradowanych.

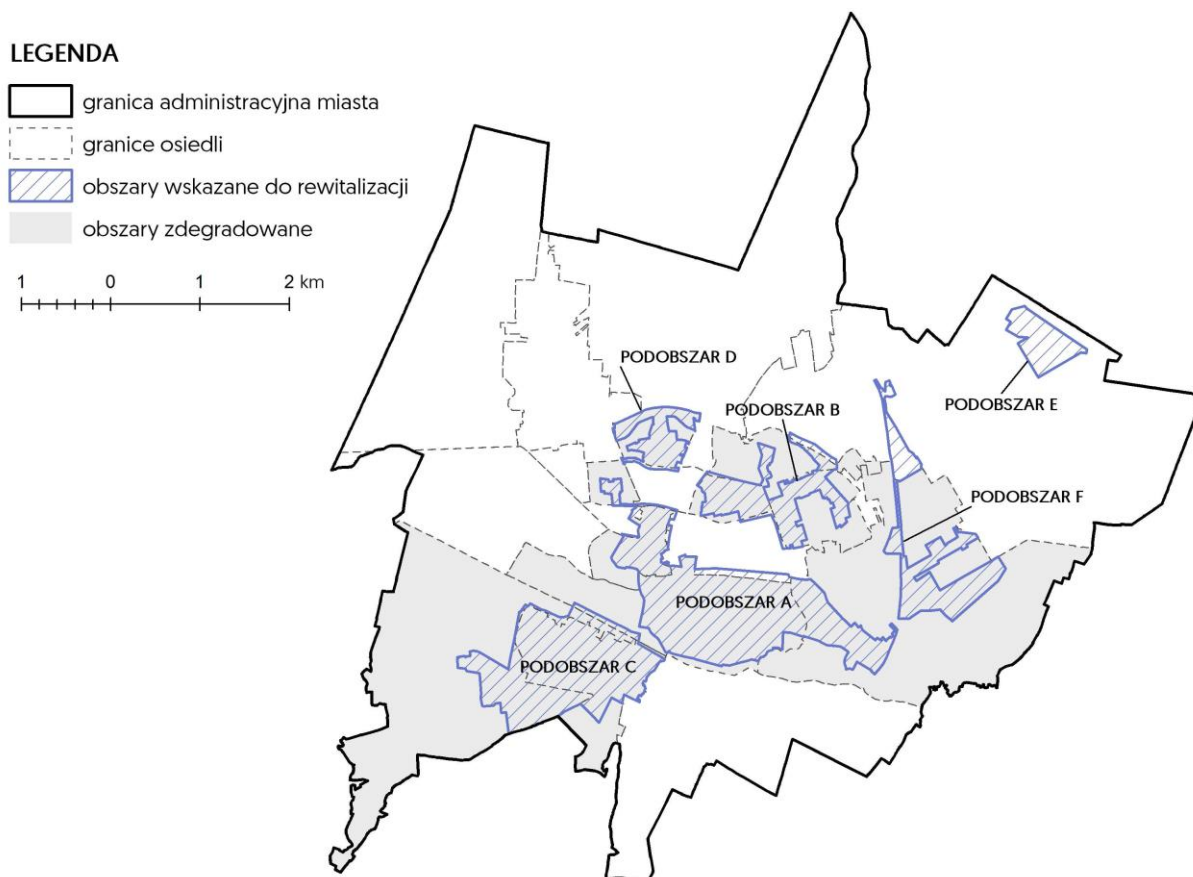

Źródło: opracowanie własne

II. Sposób i zakres monitorowania Programu.

Podstawowym narzędziem służącym monitorowaniu Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023 są coroczne sprawozdania monitorujące przebieg realizacji Programu. Projekt rocznego sprawozdania przygotowany jest w oparciu o dane i informacje, które przekazywane są przez podmioty realizujące projekty rewitalizacyjne wpisane do Programu, a także podmioty, takie jak: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy, Urząd Miasta, które są źródłem danych umożliwiających zbadanie wskaźników społeczno-gospodarczych. Wyrażone w postaci liczbowej wskaźniki obrazują w sposób syntetyczny sytuację społeczno – gospodarczą rewitalizowanego terenu a także skuteczność realizacji Programu. Pozyskane z kolei od podmiotów informacje o postępie wdrażania projektów pozwalają:

1) Dla projektów planowanych do realizacji i realizowanych:

- przedstawić stopień zaawansowania realizowanych zadań,

2) Dla projektów zakończonych:

- wykazać osiągnięte wartości wskaźników produktu rezultatu,
- wykazać istotne zmiany wpływające na charakter projektu, jego cele, lub inne ważne warunki wdrażania, które mogły by wpłynąć na zmianę jego celów.

Program Rewitalizacji obejmuje dwie listy projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych, których postęp monitoruje się poprzez coroczne sprawozdania:

- listę planowanych podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych obejmujących charakteryzujące się różnym stopniem zaawansowania planów realizacji. Są to ponadto projekty, które zlokalizowane są na obszarze rewitalizacji oraz wykazują silną zbieżność z celami i kierunkami działań rewitalizacji. Ponadto lista podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych zawiera projekty, które wykazują zbieżność z zakresem wsparcia przewidzianym dla Działania 6.5. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (Priorytet Inwestycyjny 9b) i w zakresie projektów infrastrukturalnych w większości nie mogły by być realizowane w ramach innych Priorytetów Inwestycyjnych. Celem szczegółowym tego działania jest wzmocnienie rozwoju społeczno-gospodarczego, fizycznego i przestrzennego obszarów miejskich, w tym przemysłowych,
- listę pozostałych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych obejmujących projekty i zadania, które wpisują się w cele i kierunki rewitalizacji zdefiniowane w Programie i uzupełniają podstawowe działania rewitalizacyjne.

Wszystkie działania są istotne z punktu widzenia osiągnięcia założonych celów rewitalizacji. Ostatecznie lista projektów podstawowych zamknęła się ilością 32 projektów, zaś lista projektów pozostałych liczbą 42 projektów złożonych przez 21 podmiotów.

1. Stopień realizacji projektów i założonych celów Programu Rewitalizacji.

Na koniec 2018 r. żaden z podmiotów (oprócz zgłoszonych w 2017 r.) nie wycofał swojego projektu, ani też nie zgłosił nowego przedsięwzięcia na listę projektów. W 41,89% projekty są w trakcie ich realizacji, a w 28,38% projektów nie podjęto żadnych działań i nie planuje się realizacji w następnym roku sprawozdawczym tj. w 2019.


Z przesłanych przez 23 beneficjentów 44 kartach monitorujących postęp realizacji przedsięwzięcia oraz w oparciu o informacje Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego dotyczące projektów Gminy i jej jednostek, opracowano sprawozdanie z realizacji projektów wpisanych do Programu Rewitalizacji. Poniższa Tab.1 i Wyk.1 pokazują ilości projektów w różnych fazach ich realizacji.

Tab.1. Ilość realizowanych projektów wpisanych na listy przedsięwzięć Programu Rewitalizacji z podziałem na obszary oraz na projekty zakończone, realizowane, planowane i projekty od realizacji których odstąpiono.

Obszar	liczba projektów	Liczba projektów z listy pozostałych	Liczba projektów z listy podstawowych	Projekty zakończone	Projekty w trakcie realizacji	Projekty planowane do realizacji w 2019r.	Projekty nie planowane do realizacji w 2019r.	Projekty od których odstąpiono
Podobszar A	20	11	9	4	9	2	5	2
Podobszar B	15	11	4	1	4	0	7	0
Podobszar C	13	5	8	2	8	0	3	0
Podobszar D	3	3	0	0	0	0	2	1
Podobszar E	2	1	1	0	1	1	0	0
Podobszar F	4	3	1	0	1	1	2	0
Podobszar ABCD	6	2	4	0	3	3	0	0
Podobszar ABCDEF	6	2	4	0	5	0	1	0
Podobszar ABCDE	1	1	0	0	1	0	0	0
Podobszar BD	1	1	0	0	0	1	0	0
Podobszar ABD	1	1	0	0	1	0	0	0
Podobszar AD	1	1	0	0	1	1	0	0
Poza obszarem	1	0	1	0	0	0	1	0
Suma	74	42	32	7	34	9	21	3

Źródło: opracowanie własne.

Wyk.1. Ilość realizowanych projektów rewitalizacyjnych z podziałem na projekty zakończone, realizowane, planowane i odstąpione od realizacji.

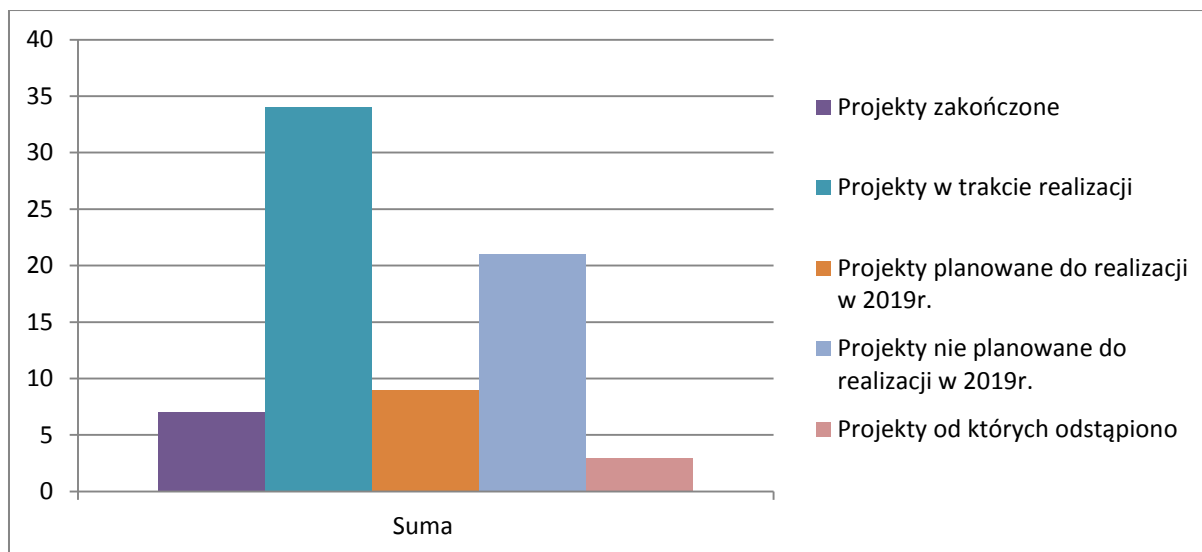

Źródło: opracowanie własne.

Z analizy kart wynika również, że jeden z projektów, od których beneficjent odstąpił od realizacji, w 2018 roku został wznowiony i jest planowany do realizacji. Jest to projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim. pn. „Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie”. Pozostałe 3 projekty z listy pozostałych przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych Programu Rewitalizacji, od których odstąpiono w 2017 r nadal są wycofane z realizacji. Są to:

1. Projekt nr 14. pn. „Aktywni na rynku pracy” Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
2. Projekt nr 15. pn. „Aktywni bezrobotni” Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
3. Projekt nr 34. pn. „Sięgamy po sukces”, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Zakończonych zostało w sumie siedem projektów, z czego cztery projekty z obszaru A, B i C zrealizowano w 2018r.

2. Zakres i przedmiot zmian w projektach Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023.

Analiza złożonych przez beneficjentów kart postępu realizacji projektów wykazała również konieczność wprowadzenia drobnych aktualizacji i zmian w zakresie takich elementów jak: nazwa projektu lub beneficjenta, zakres rzeczowy projektów, termin realizacji, źródło finansowania, budżet projektu. Zmiany zgłoszone zostały przez następujące podmioty:

Lista podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

1. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Budowa drogi łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi - Projekt nr 1
2. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Przebudowa ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego - Projekt nr 6
3. Powiat Ostrowiecki - Rozbudowa i przebudowa ulicy Samsonowicza w Ostrowcu świętokrzyskim - II etap - projekt nr 8
4. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Zagospodarowanie terenu oraz modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej - Projekt nr 10
5. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu - Projekt nr 11
6. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Modernizacja obiektów kultury - przebudowa budynku Kina Etiuda - projekt nr 18
7. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Ogród Zdrowia na Osiedlu Ogrody - Projekt nr 25
8. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń. - Rewitalizacja, adaptacja i modernizacja terenów byłej Cukrowni „Częstocice” w celu nadania im nowej funkcji użytkowej i kulturalnej – Utworzenie Parku Przemysłowego z Izbą Pamięci Cukrownictwa - Projekt nr 13
9. Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa - Rewitalizacja parku w Osiedlu Spółdzielców - Projekt nr 20
10. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim - Rozwój wysokiej jakości usług społecznych - Projekt nr 26
11. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim - Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie - Projekt nr 30

Lista pozostałych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

1. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I - Projekt nr 1
2. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Budowa hali targowej przy ul. J. Słowackiego przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu - Projekt nr 7
3. Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Nasz Dom”- Wyrównajmy pas startowy - przygotowanie wychowanków Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Nasz Dom” w Ostrowcu Świętokrzyskim do integracji ze środowiskiem i usamodzielnienia się - Projekt nr 10
4. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych - Projekt nr 18
5. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Centrum Tradycji Hutnictwa - Projekt nr 19

6. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Budowa placów zabaw przy gminnych placówkach oświatowych - Projekt nr 24
7. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Nowoczesna Szkoła – modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej - Projekt nr 27
8. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski/PSP14 - „Nowoczesne nauczanie przyszłością edukacji” - Projekt nr 29

Zakres zgłoszonych przez beneficjentów zmian oraz zaktualizowane informacje zawiera Tab.4 i Tab.5

Zmiany zgodnie z zapisami Programu Rewitalizacji zostaną wprowadzone przy najbliższej aktualizacji tego dokumentu, która planowana jest w 2019 r.

III. Źródła finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Zabezpieczenie finansowe działań związanych z realizacją Programu Rewitalizacji stanowią przede wszystkim środki budżetowe gminy i beneficjentów oraz środki zewnętrzne pochodzące m.in. z Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Spójności). Ponadto zadania realizowane są lub będą ze środków budżetu państwa, budżetów samorządów – wojewódzkich, powiatowych, innych środków publicznych, środków prywatnych oraz środków organizacji pozarządowych.

Oprócz „projektu rewitalizacyjnego”, realizowanego w ramach działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”, skupiającego aż 13 przedsięwzięć z Programu Rewitalizacji i pozostałych 4 projektów realizowanych przez Gminę ze środków RPO WŚ na lata 2014-2020 oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. W 2017 r. 13 podmiotów zgłosiło swoje projekty do dofinansowania szukając ich źródeł finansowania. Przeważały dofinansowania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W 2018 r. dołączyły 4 kolejne podmioty. Są to:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - „Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie” - Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (ponownie aplikowany).
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych” - Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
3. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” - „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z wymianą pokrycia dachowego” - Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym.
4. „Podniesienie jakości kształcenia w PSP 14 poprzez indywidualizację procesu nauczania uczniów oraz zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli” pod nową nazwą

„Nowoczesne nauczanie przyszłością edukacji” - działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego (ponownie aplikowany).

Ponadto wnioskowano o środki z Programu Usuwania Klęsk Żywiolowych dla zadania realizowanego przez Powiat Ostrowiecki - „Rozbudowa i przebudowa ulicy Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim” oraz ze środków PFRON i Funduszu Kościelnego dla zadania „Przebudowa placówki opiekuńczo-wychowawczej „Nasz dom” Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi”. Szczegółowe informacje zawierają Tab.4 i Tab.5

IV. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”.

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski w partnerstwie ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Krzemionki” i Ostrowiecką Spółdzielnią Mieszkaniową złożyła w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi priorytetowej 6 „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”.

W dniu 20 kwietnia 2018 r. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, jako partner wiodący, podpisała z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego umowę o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-00. Obejmuje ona realizację projektu składającego się z 10 zadań, które wpisane są na listę podstawowych i pozostałych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych, z czego dwa zadania są realizowane przez partnerów. Rodzaj oraz zakres realizacji poszczególnych zadań wyżej wymienionego projektu został opisany w Tab.2 oraz w zbiorczych Tab.4 i Tab.5 przedstawiających stan realizacji wszystkich projektów wpisanych do Programu.

V. Wskaźniki postępu wdrażania Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023.

Do dwóch projektów zakończonych w ubiegłym roku sprawozdawczym, w 2018r. dołączyło pięć kolejnych zrealizowanych przedsięwzięć.

1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Ostrowcu Świętokrzyskim, pn. „Lepsza edukacja - lepsza przyszłość”.
2. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, pn. „Budowa hali targowej przy ul. J. Słowackiego, przeznaczona na cele promocji lokalnych produktów wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu”.
3. Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr. 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim, pn. „One Two Three – eksperymentujemy z matematyką i językiem angielskim - program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

4. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, pn. „Budowa ul. bocznej od ul. Kilińskiego”.
5. Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach, pn. „Utworzenie ścieżki edukacyjno-sportowej poprzez modernizację boiska sportowego, zakup urządzeń zabawowych, doposażenie klasopracowni matematycznej i przyrodniczej oraz zlikwidowanie bariery architektonicznej dla osób niepełnosprawnych przy głównym wejściu budynku szkoły w Częstocicach”.

Zakończone w 2018r. zadania stanowią 6,66% wszystkich zaplanowanych w Programie Rewitalizacji. W sumie przez dwa lata realizacji Programu zakończono 9,33% wszystkich zadań z listy przedsięwzięć. Sukcesywna realizacja i postęp w zakresie osiągania wskaźników dotyczących bezpośrednio produktów poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, pozwala na stopniowe osiąganie założonych w Programie rezultatów. Cele i założone rezultaty Programu w pełni osiągnięte zostaną po rzeczowej realizacji większości zaplanowanych w Programie działań. Wartości wskaźników produktu osiągnięte do końca 2018r. w poszczególnych projektach zawiera Tab.4 i Tab.5

Tab.2. Stan realizacji projektu pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego” realizowanego przez Partnerów: Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, Ostrowiecką Spółdzielnię Mieszkaniową i Spółdzielnię Mieszkaniową „Krzemionki” .

Lp.	Nazwa zadania	Stan realizacji zadania do końca 2018r.
1	Budowa drogi łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi	Trwają prace nad dokumentacją projektową i pozyskaniem niezbędnych do rozpoczęcia prac budowlanych dokumentów, realizacja robót budowlanych nie została rozpoczęta. Planowany początek robót w II półroczu 2019r.
2	Przebudowa ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego	Trwają prace nad dokumentacją projektową i pozyskaniem niezbędnych dokumentów zezwalających na rozpoczęcie prac budowlanych, realizacja robót budowlanych nie została rozpoczęta. Planowany początek robót w II półroczu 2019r.
3.	Zagospodarowanie części dziedzica browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych	Przeprowadzono konkurs architektoniczny na wykonanie zagospodarowania części dziedzica browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych. Wykonano rozbiórkę istniejącego budynku. Zakończono prace związane z budową parkingu na dziedzicu. Rozpoczęcie modernizacji budynku planowane jest w II kwartale 2019r, a budowa ogrodu sensorycznego w III kwartale 2020r.
4.	Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej Zagospodarowanie terenu	Przygotowano dokumentację projektową wraz z niezbędnymi do rozpoczęcia prac budowlanych dokumentami. Realizacja robót budowlanych nie została rozpoczęta. Wykonano aktualizację kosztorysów na potrzeby wykonania szacunku wartości zamówienia. Planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego w II kwartale 2019r.
5.	Rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu	Realizacja robót budowlanych nie została rozpoczęta. Przygotowano dokumentację do postępowania na wyłonienie wykonawcy części zadania polegającej na przeniesieniu centrum monitoringu. Zakończenie przeniesienia centrum monitoringu planowane jest w III kwartale 2019r. , zaś budowa monitoringu w II kwartale 2020r.
6	Budowa zadaszenia części placu targowego wraz z zagospodarowaniem	Przygotowano dokumentację projektową oraz pozyskano niezbędne do rozpoczęcia prac budowlanych dokumenty. Przygotowano postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót dotyczących budowy wiaty handlowej oraz przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku handlowo-usługowego oraz zmiany sposobu jego

użytkowania na budynek biurowo-socjalny wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. Zakończenie prac budowlanych przewidziane jest w II kwartale 2019 r. a w przypadku zagospodarowania w III kwartale 2019r.

7	Budowa strefy rekreacji i wypoczynku	Przygotowano dokumentację projektową wraz z niezbędnymi do rozpoczęcia prac budowlanych dokumentami. Realizacja robót budowlanych nie została rozpoczęta. Przygotowywana jest aktualizacja kosztorysów na potrzeby wykonania szacunku wartości zamówienia. Planowane oddanie do użytku w IV kwartale 2019r.
8	Modernizacja obiektów kultury – przebudowa budynku Kina Etiuda oraz CTH	Trwają prace nad dokumentacją projektową i pozyskaniem dokumentów zezwalających na realizację zadania.. Realizacja robót budowlanych nie została rozpoczęta. Planowany początek robót I kwartał 2020.
9	Ogród Zdrowia na Osiedlu Ogrody	Przygotowana jest dokumentacja projektowa. Realizacja robót budowlanych nie została rozpoczęta. Planowany początek robót w II/III kwartale 2019r.
10	OSM - Rewitalizacja Parku Spółdzielców	Wykonano remont fontanny parkowej wraz z infrastrukturą techniczną, remont chodników i alejek spacerowych, wykonano nowe nasadzenia drzew, krzewów, roślin ozdobnych oraz rekultywację trawników. Kontynuacja zadania w 2019r.
11	SM Krzemionki - place zabaw, siłownię	Przygotowano dokumentację projektową oraz niezbędne do rozpoczęcia prac budowlanych dokumenty. Przygotowano postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych przy parkingu wraz z odwodnieniem, oświetleniem, drogą manewrową, poszerzeniem drogi dojazdowej oraz remont chodników i schodów zewnętrznych. Planowana realizacja w 2019 r.

VI. Wskaźniki społeczno-gospodarcze rewitalizowanego obszaru


Proces monitorowania programu prowadzony jest jednocześnie na kilku płaszczyznach. Systematycznej obserwacji podlegają również zmiany zachodzące w ramach poszczególnych wskaźników społeczno-gospodarczych. Umożliwia to dostarczenie informacji na temat postępów w osiąganiu przyjętych celów oraz kwantyfikację efektów zrealizowanych projektów (zarówno ekonomicznych, jak i społecznych). Analiza wskaźnikowa, służy również do odpowiedzi na pytanie o zbieżność podejmowanych działań z osiąganymi wynikami społeczno-gospodarczymi gminy. W Tab.3 ujęto wartości wskaźników z podziałem na badane kryteria, a na wyk. 5 przedstawiono wartości wskaźników dla badanych roczników.

1. Badane kryteria (wskaźniki rezultatu).

Zmiana lub zahamowanie negatywnego trendu spadku liczby mieszkańców.

Liczba ludności na obszarze rewitalizowanym w 2018r. wyniosła 15 537 mieszkańców. Jest to niższa wartość niż w roku ubiegłym, kiedy to wynosiła 16 088 osób (wyk.2). Nadal zatem mamy do czynienia z negatywnym trendem spadku liczby mieszkańców. Spadek ten obejmuje nie tylko obszar rewitalizowany ale całe miasto. Na koniec 2017 r. liczba ludności w całym mieście wynosiła 67 669 mieszkańców a w 2018 r. już o 1090 osób mniej tj. 66 579 mieszkańców. Miasto zmagają się ze zjawiskiem depopulacji z uwagi na niewyhamowane ujemne saldo migracji, niski wskaźnik przyrostu naturalnego oraz starzenie się społeczeństwa.

Wyk. 2. Liczba mieszkańców na obszarze rewitalizacji.

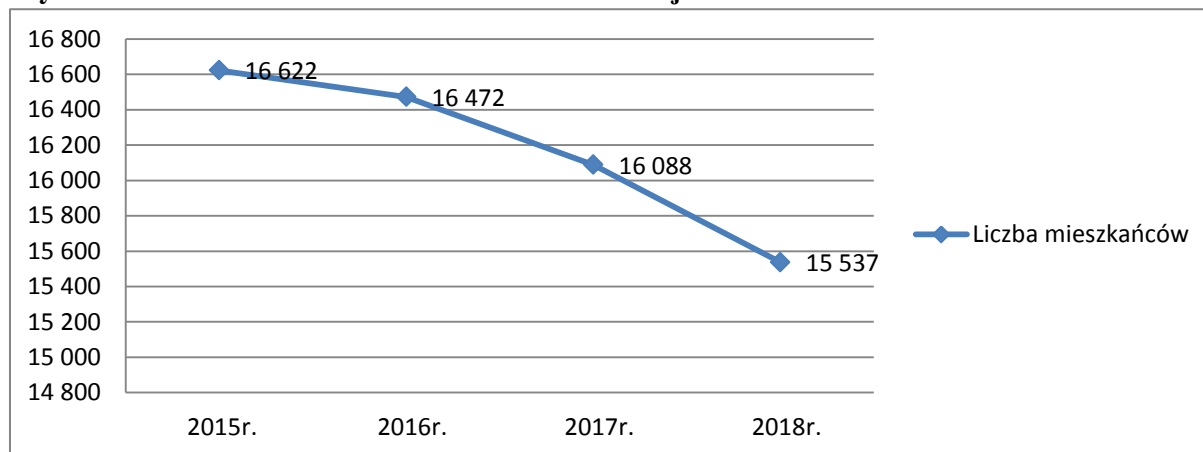


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Zmniejszenie liczby osób długotrwale bezrobotnych

Analiza wskaźnikowa tego kryterium, wskazuje na utrzymującą się poprawę na lokalnym rynku pracy na obszarach rewitalizowanych. Liczba długotrwale bezrobotnych na obszarze rewitalizowanym wynosiła na koniec 2018 r. 321 osób i zmniejszyła się wobec 2017 r. o 43 osoby (wyk.3). Wskaźnik ten nie odbiega od średniej wartości bezrobocia w całym mieście. W 2017 r. liczba osób trwale bezrobotnych wynosiła 1445 osób, podczas gdy w 2018 r. już

tylko 1243 osoby. Realizowane w programie projekty z zakresu aktywizacji zawodowej są skuteczne i podtrzymują utrzymujący się trend spadkowy oraz korzystnie wpływają na sukcesywne zmniejszanie się bezrobocia.

Wyk.3. Liczba osób długotrwale bezrobotnych zamieszkujących obszar rewitalizacji.

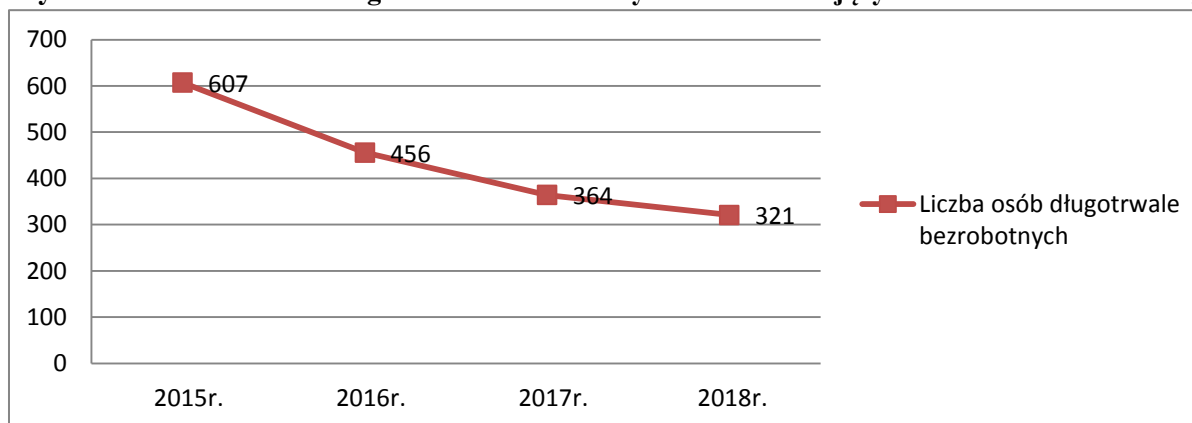


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z PUP w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Spadek liczby osób korzystających z pomocy społecznej

Przeprowadzona w programie rewitalizacji diagnoza ujawniła zjawiska społeczne, wymagające szczególnej uwagi przy planowaniu działań z zakresu pomocy społecznej. Zaliczono do nich ubóstwo. Do programu wpisano zatem szereg zadań zmierzających do ograniczenia tego problemu. Od 2016 r. obserwuje się spadek osób korzystających z usług oferowanych przez MOPS. Zmniejszyła się liczba osób, którym przyznawane są świadczenia socjalne. W 2018 r. liczba ta spadła w stosunku do 2017 r. o 49 osób (wyk.4). Jest to ściśle powiązane z poprawą sytuacji zawodowej mieszkańców i ogólną tendencją wzrostu zamożności, a z drugiej strony z silnym nastawieniem na działania prorodzinne. W rezultacie, w wyniku stopniowej realizacji przedsięwzięć i ww. czynników, zaobserwowano utrzymujący się pozytywny trend spadkowy w liczbie osób korzystających z pomocy społecznej. Po uzyskaniu dofinansowania na realizację pozostałych zaplanowanych działań „miękkich”, efekt poprawy w zakresie zmniejszenia ubóstwa zostanie zwiększony i utrwalony.

Wyk.4. Liczba osób z obszarów rewitalizacji korzystających z pomocy społecznej.

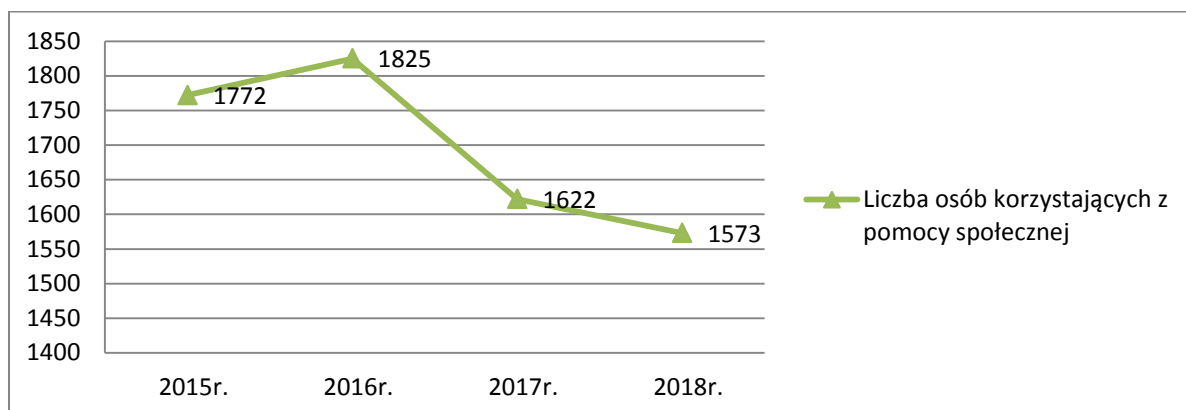


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z MOPS w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Wzrost liczby osób prowadzących działalność gospodarczą.


Poziom przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji mierzony jest liczbą podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Do 2018 r. trwała tendencja wzrostowa, która uległa zahamowaniu. Na koniec 2017 r. roku w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na obszarze rewitalizowanym zarejestrowanych było 1043 podmioty. W ciągu roku liczba ta spadła do 1022 podmiotów gospodarczych (wyk.5). Oznacza to, że na obszarze rewitalizowanym wskaźnik wzrostu ilości podmiotów gospodarczych jest niestabilny, a prowadzone działania aktywizujące na chwilę obecną minimalizują skutki negatywnego odchylenia się trendu.

Wyk.5. Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą na obszarach rewitalizacji (zarejestrowana w CEDG)

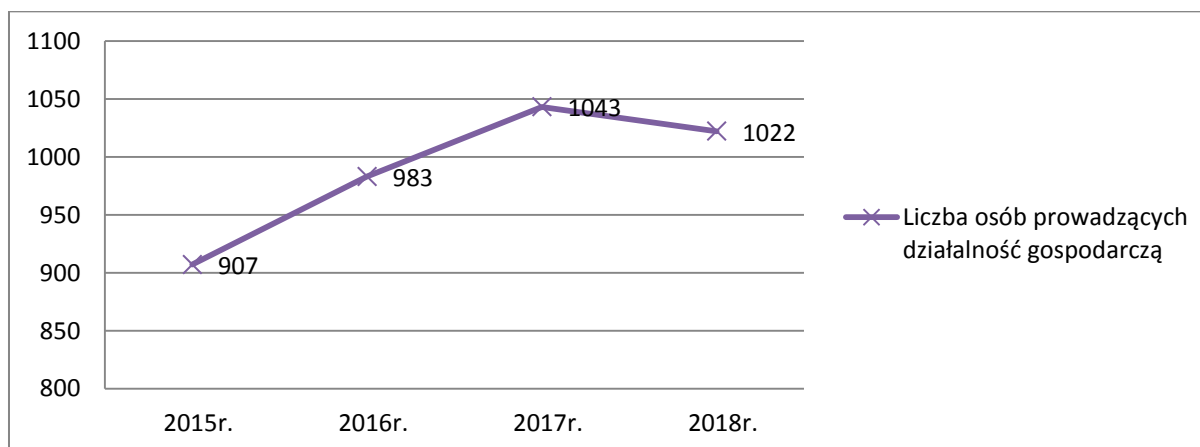

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z CEI

Wyk. 6. Wartości monitorowanych wskaźników w latach 2015-2018.

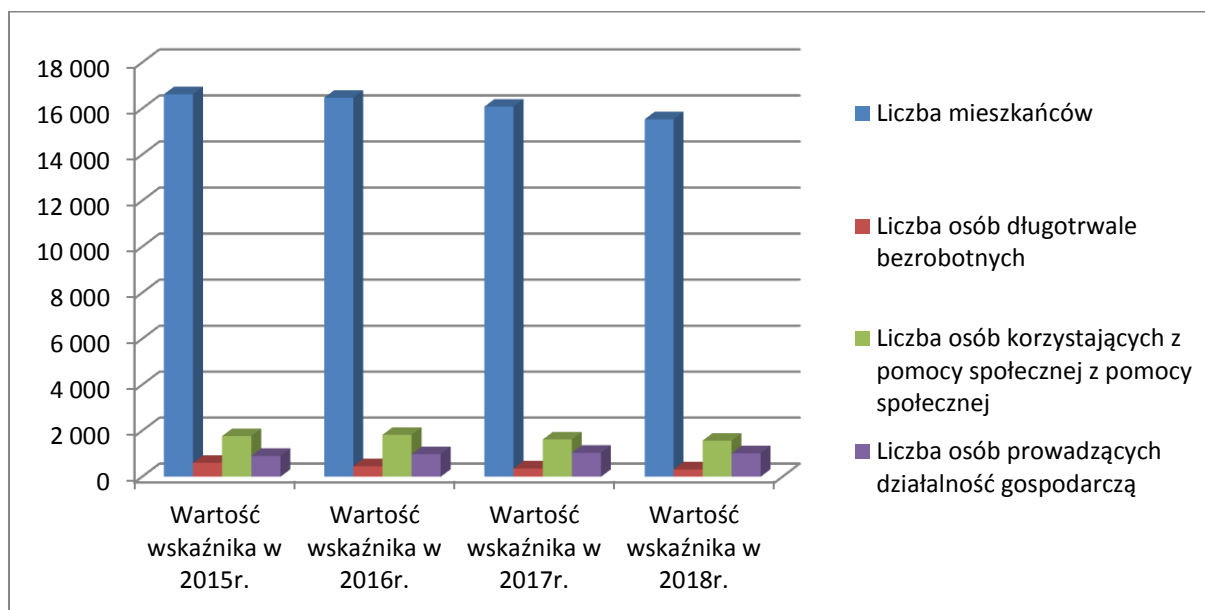

Źródło: dane gminy

VII. Podsumowanie

Podsumowując realizację zadań rewitalizacyjnych, na 74 projekty wpisane do dwóch list projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych umieszczonych w Programie Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023, dwa podmioty odstąpiły od realizacji 3 projektów, 34 projekty realizowane są przy udziale środków zewnętrznych (24 ze środków unijnych), w tym jeden projekt Gminy oraz partnerów skupiający 13 przedsięwzięć z Programu, realizowany w partnerstwie, w ramach działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi priorytetowej 6 „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2023. Na koniec roku sprawozdawczego 7 projektów zostało pomyślnie zakończonych, 34 jest w trakcie realizacji, a realizacja 9 następnych planowana jest do rozpoczęcia w 2019 r. Wykonanie 21 pozostałych projektów zostało zaplanowane na ostatnie lata obowiązywania Programu. Wartości wskaźników w przypadku czterech badanych kryteriów, na chwilę obecną w dwóch przypadkach wykazują pozytywny wpływ i oddziaływanie realizowanych zadań na osiągnięcie celów zamierzonych w Programie, co świadczy o właściwym doborze zadań w stosunku do założeń całego procesu rewitalizacji miasta.

Zgodnie z systemem monitorowania i oceny określonym w Programie Rewitalizacji ocena aktualności i stopnia realizacji programu rewitalizacji wykonywana jest co najmniej raz na trzy lata. Oznacza to, że w 2019 r. zostanie przeprowadzona aktualizacja Programu Rewitalizacji mająca na celu wprowadzenie wszystkich zgłoszonych zmian. Ogłoszony zostanie również nabór nowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Tab.3 Wartości wskaźnika dla badanych kryteriów.

Badane kryterium	Nazwa wskaźnika	Źródło pozyskania danych	Jednostka	Wartość wskaźnika w 2015r.	Wartość wskaźnika w 2016r.	Wartość wskaźnika w 2017r.	Wartość wskaźnika w 2018r.
Zmiana lub zahamowanie negatywnego trendu spadku liczby mieszkańców	Liczba mieszkańców	UM	Liczba osób	16 622	16 472	16 088	15 537
Zmniejszenie liczby osób długotrwale bezrobotnych	Liczba osób długotrwale bezrobotnych	PUP	Osoby	607	456	364	321
Spadek liczby osób korzystających z pomocy społecznej	Liczba osób korzystających z pomocy społecznej	MOPS	Liczba osób	1772	1825	1622	1573
Wzrost liczby osób prowadzących działalność gospodarczą	Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą	UM	Liczba osób	907	983	1043	1022

Źródło: dane udostępnione przez jednostki organizacyjne Gminy i PUP.

Tab.4 Lista podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz z osiągniętymi wskaźnikami produktu i stopniem realizacji projektu.

Lp	Beneficjent	Nazwa projektu	Obszar Termin realizacji	Planowany zakres realizacji projektu	Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika w okresie sprawozdawczym stan na 31.12.2018r.	Stopień realizacji projektu
1	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	Budowa drogi łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi	A 2016-2020	Zakres realizowanych zadań: Budowa alternatywnego dojazdu do Targowiska Miejskiego od ulic Chrzanowskiego, Denkowskiej oraz Kilińskiego o łącznej długości 1,975 km, w skład, której wchodzić będzie budowa jezdni, chodników, ścieżki rowerowej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, miejsc parkingowych, przepustów	Liczba zmodernizowanych / wybudowanych ciągów komunikacyjnych -1 szt.	0	Zadanie w ramach projektu pn. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, na które podpisano umowę o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-00 w dn. 20.04.2018r. Do końca roku 2018 trwały prace nad przygotowaniem dokumentacji projektowej oraz pozyskaniem niezbędnych dokumentów zezwalających na prace budowlane.
2	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	Budowa ul. bocznej od ul. Kilińskiego	A 2016-2018	Zakres realizowanych zadań: Budowa ulicy od ul. Kilińskiego do cieku Denkowskiego o łącznej długości 0,8km, w skład, której wchodzić będzie budowa jezdni, chodników, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, miejsc parkingowych, przepustów.	Liczba zmodernizowanych / wybudowanych ciągów komunikacyjnych - 1 szt.	1	Projekt zrealizowany ze środków Budżetu Gminy w 2018r.
3	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	Przebudowa ulicy Siennieńskiej od ul. Okólnej do ul. Polnej wraz z ulicami bocznymi	A 2017-2021	Zakres realizowanych zadań: Przebudowa dróg o długości ok. 1,5 km wraz z zagospodarowaniem terenu, małą architekturą, oświetleniem.	Liczba zmodernizowanych / wybudowanych ciągów komunikacyjnych - 1szt.	0	Projekt zaplanowany do realizacji w latach 2019-2021 ze środków pozyskanych z Funduszu Dróg Samorządowych.
4	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski/ Polskie Koleje Państwowe	Remont kładki pieszej przy ul. F. Focha i kładki pieszej nad torami kolejowymi	C 2017-2020	Zakres realizowanych zadań: Projekt przewiduje remont kładki pieszej nad rzeką Kamienną w postaci wykonania dywanika z nawierzchni asfaltowej, odnowienia konstrukcji stalowych, remont schodów, wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, wykonanie	Liczba zrewitalizowanych obiektów komunikacyjnych - 2 szt	0	Projekt zaplanowany do realizacji w partnerstwie w późniejszym okresie.

				izolacji fundamentów, montaż balustrady mostowej. Projekt przewiduje remont kładki pieszej nad torami kolejowymi pomiędzy ul. Kolejową a ul. O. Zagłoby, która łączy tereny przemysłowe i pokolejowe z drogą do centrum miasta i dworcem PKS w postaci wykonania dywanika z nawierzchni asfaltowej, odnowienia konstrukcji stalowych, remontu schodów na perony i parking zlokalizowany przy byłym dworcu PKP, wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, wykonanie izolacji fundamentów, montaż balustrady mostowej.			
5	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Krzemionki" w Ostrowcu Św.	Budowa parkingu na ok. 58 miejsc postojowych wraz z odwodnieniem, oświetleniem, drogą manewrową oraz poszerzeniem drogi dojazdowej w rejonie budynków nr: 35-37 i 41-44 na os. Rosochy w Ostrowcu Św. oraz remont parkingu, chodników i schodów zewnętrznych przy budynku nr 5 na os. Ogrody w Ostrowcu Św.	B 2016-2023	Zakres realizowanych zadań: - odwodnienie terenu - poszerzenie drogi do wymaganych rozmiarów - budowa miejsc parkingowych, - remont chodników, - budowa parkingu.	Liczba zrewitalizowanych przestrzeni – 2 szt. Liczba zmodernizowanych / wybudowanych ciągów komunikacyjnych – 1 szt.	0	Zadanie w ramach projektu pn. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, na które podpisano umowę o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-00 w dn. 20.04.2018r. Wykonano dokumentację projektową, pozyskano niezbędne dokumenty zezwalające na prace budowlane. Przygotowano postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych przy parkingu wraz z odwodnieniem, oświetleniem, drogą manewrową, poszerzeniem drogi dojazdowej oraz remont chodników i schodów zewnętrznych.
6	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	Przebudowa ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego	C 2017-2021	Zakres realizowanych zadań: przebudowa ulicy o długości ok. 1,1 km wraz z orurowaniem cieków, parkingami, chodnikami i dojazdem do zrewitalizowanych budynków przy ul. Świętokrzyskiej	Liczba zmodernizowanych / wybudowanych ciągów komunikacyjnych – 1 szt.	0	Zadanie w ramach projektu pn. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, na które podpisano umowę o

							dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-00 w dn. 20.04.2018r. Trwają prace nad dokumentacją projektową i pozyskaniem niezbędnych dokumentów zezwalających na rozpoczęcie prac budowlanych.
7	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	Budowa otwarcia komunikacyjnego terenów inwestycyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	E 2018-2021 Zmiana terminu realizacji na 2019-2020	Zakres realizowanych zadań: Budowa otwarcia komunikacyjnego od strony ul. Bałtowskiej o długości ok.300 m do terenów inwestycyjnych wraz z zagospodarowaniem, oświetleniem, chodnikami, kanalizacją deszczową.	Liczba zmodernizowanych / wybudowanych ciągów komunikacyjnych – 1 szt.	0	Projekt planowany do realizacji w latach 2019-2020 ze środków Funduszu Dróg Samorządowych
8	Powiat Ostrowiecki	Rozbudowa i przebudowa ulicy Samsonowicza w Ostrowcu Św. – II etap	F 2019 Zmiana terminu realizacji na 2018-2021	Zakres realizowanych zadań: Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu zostaną osiągnięte poprzez: - zastosowanie nowej nawierzchni; - zmianę geometrii jezdni; - przebudowę oświetlenia ulicznego; - budowę ścieżki rowerowej; - budowę kanalizacji deszczowej; - budowę azyli na przejściach dla pieszych	Liczba zmodernizowanych / wybudowanych ciągów komunikacyjnych – 1 szt.	1	W 2018r. pozyskano środki z Programu Usuwania Klęsk Żywiolowych na wykonanie następującego zakresu: - budowa nakładki asfaltowej na długości 1830mb z wymianą krawężników, - wykonanie nawierzchni asfaltowej, - budowa 2 zatok autobusowych i 7 azyli dla pieszych, - wykonanie chodników i przejść dla pieszych o powierzchni 1620 m ² . Kontynuacja zadania w zakresie oświetlenia i ciągów pieszo-rowerowych odbędzie się w latach 2019-2021.
9	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	Zagospodarowanie części dziedzica browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych	A 2016-2020	Zakres realizowanych zadań: Utworzenie terenów zielonych z małą architekturą, chodnikami, oświetleniem, terenem do wystaw plenerowych oraz modernizacją dwóch budynków i przystosowaniem ich na potrzeby aktywizacji mieszkańców osiedli oraz spotkania rad osiedlowych.	Liczba zrewitalizowanych przestrzeni publicznych – 1szt.	0	Zadanie w ramach projektu pn. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, na które podpisano umowę o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-00 w dn. 20.04.2018r.

							Przeprowadzono konkurs architektoniczny na wykonanie zagospodarowania części dziedzińca browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych. Wykonano rozbiórkę istniejącego budynku. Zakończono prace związane z budową parkingu na dziedzińcu.
10	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	Zagospodarowanie terenu oraz modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej	C 2016-2020 Nowy termin 2016-2021	Zakres realizowanych zadań: Modernizacja i odnowienie budynków wielorodzinnych (socjalnych i komunalnych), zaliczonych do ewidencji zabytków gminnych zlokalizowanych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej oraz Parkowej o powierzchni zabudowy ok. 3.564 m ² i powierzchni użytkowej 4.325 m ² – termomodernizacja i modernizacja elewacji, remont instalacji wewnętrznych, remont dachu, urządzenia zorientowane na efektywne wykorzystanie energii wraz z zagospodarowaniem terenu (parkingi, oświetlenie, place zabaw, odwodnienie) oraz przystosowaniem infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych;	Liczba zrewitalizowanych obiektów mieszkalnych – 7 szt. Liczba zrewitalizowanych przestrzeni publicznych – 3 szt.	Liczba zrewitalizowanych obiektów mieszkalnych - 0	Zadanie w ramach projektu pn. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, na które podpisano umowę o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-00 w dn. 20.04.2018r. Przygotowano dokumentację projektową wraz z niezbędnymi do rozpoczęcia prac budowlanych dokumentami dla budynku na ul. Osadowej 6. Realizacja robót budowlanych nie została rozpoczęta. Wykonano aktualizację kosztorysów.
11	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	Rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu	ABCD 2019 Zmiana terminu 2019-2020	Zakres realizowanych zadań: Uzupełnienie istniejącego systemu monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych i jego rozbudowanie o 5 punktów kamerowych wraz z zakupem niezbędnych licencji, sprzętu i oprogramowania oraz przeniesieniem centrum monitoringu do siedziby Straży Miejskiej, zlokalizowanej w dzielnicy Częstocice.	Liczba obszarów, na których zwiększono bezpieczeństwo – 4 szt.	0	Zadanie w ramach projektu pn. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, na które podpisano umowę o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-00 w dn. 20.04.2018r. Przygotowano dokumentację wykonawczą i kosztorysy.
12	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	Budowa zadaszania części placu targowego wraz z zagospodarowaniem	A 2016-2019	Zakres realizowanych zadań: Przebudowa przestrzeni publicznej i budowa, w miejsce starych zniszczonych magazynów oraz na otwartej przestrzeni, zadaszanej wiaty handlowo-	Wskaźniki produktu: Liczba zrewitalizowanych przestrzeni publicznych	0	Zadanie w ramach projektu pn. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i

				usługowej wraz z utwardzeniem, odwodnieniem i oświetleniem części placu targowego oraz stworzeniem miejsc parkingowych	– 1 szt.		rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, na które podpisano umowę o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-00 w dn. 20.04.2018r. Przygotowano dokumentację projektową oraz pozyskano niezbędne do rozpoczęcia prac budowlanych dokumenty. Przygotowano postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót dotyczących budowy wiaty handlowej oraz przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku Handlowo-Usługowego oraz zmiany sposobu jego użytkowania na budynek biurowo-socjalny wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną
13	Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń	Rewitalizacja, adaptacja i modernizacja terenów byłej Cukrowni „Częstocice” w celu nadania im nowej funkcji użytkowej i kulturalnej – Utworzenie Parku Przemysłowego z Izbą Pamięci Cukrownictwa.	C 2017-2020	Zakres realizowanych zadań: Przedmiotem realizacji projektu jest przygotowanie zabudowanej powierzchni inwestycyjnej (magazynowo-produkcyjno-biurowej), na terenach przemysłowych. Działania w ramach realizacji przedmiotowego projektu obejmują: - kompleksową przebudowę (modernizację) budynku zabytkowego po cukrowni; - częściową przebudowę (modernizację) pozostałych budynków; - budowę systemu dróg, parkingów, chodników itp.; - budowę sieci oświetlenia terenu wokół i wewnątrz obiektu; - przebudowę i remont istniejącego uzbrojenia terenu.	Liczba zrewitalizowanych przestrzeni publicznych – 1 szt. Liczba zrewitalizowanych obiektów przemysłowych – 1 szt.	1	Nie aplikowano o środki zewnętrzne. Projekt jest w trakcie realizacji z własnych środków. Dotychczasowy zakres wykonanych prac w 2017r.- remont piętra w celu utworzenie izby pamięci. W 2018r - rozbudowano budynek o zewnętrzną klatkę schodową, wykonano remont na poziomie parteru budynku izby pamięci cukrownictwa. Zatwierdzono projekt rozbudowy budynku, uzyskano decyzję na jej budowę.
14	Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim	Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem otoczenia Centrum Aktywności	Poza obszarem 2018-2020	Projekt zakłada kompleksowy remont i adaptację budynku byłej Szkoły Podstawowej nr 4. na potrzeby Centrum Aktywności Obywatelskiej: remont/przebudowę sal szkoleniowych, biur, toalet, ciągów komunikacyjnych oraz dostosowanie	Liczba obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej, poddanych	0	Nie aplikowano o środki zewnętrzne z uwagi na brak spełniania kryteriów naboru w ogłaszanych konkursach. Nie planuje się realizacji projektu w 2019r. W przypadku nie uzyskania

		Obywatelskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim		budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo (zakup i montaż platformy schodowej), dostosowanie do potrzeb osób niedosłyszących (zakup i instalacja pętli indukcyjnych w salach szkoleniowych), zakup nowoczesnego sprzętu multimedialnego na potrzeby wyposażenia sali. Planuje się również modernizację terenu przyległego i budowę parkingu i posadzenie zieleni na obszarach rewitalizowanych.	rewitalizacji – 1 szt. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 1 szt.		dofinansowania realizowany zakres projektu będzie ograniczony.
15	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych na osiedlu Stawki	B 2019-2023	Zakres realizowanych zadań: Budowa terenów rekreacyjno-sportowych i wypoczynkowych w pobliżu zbiornika retencyjnego Stawki II (plac zabaw, siłownia plenerowa, tereny zielone, mała architektura, ścieżki piesze i rowerowe, miejsca wypoczynku, parkingi, tereny pod imprezy okolicznościowe)	Liczba zrewitalizowanych przestrzeni publicznych – 1 szt.	0	Projekt zaplanowany do realizacji w późniejszym okresie.
16	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	Budowa strefy rekreacji i wypoczynku	C 2016-2019	Zakres realizowanych zadań: Budowa strefy rekreacji składającej się z placu zabaw, siłowni zewnętrznej, boiska wielofunkcyjnego	Liczba zrewitalizowanych przestrzeni publicznych – 1 szt.	0	Zadanie w ramach projektu pn. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, na które podpisano umowę o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-00 w dn. 20.04.2018r. Przygotowano niezbędną dokumentację i kosztorysy.
17	Powiat Ostrowiecki	Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim	C 2018-2023	Zakres realizowanych zadań: Projekt będzie polegał na: - budowie boiska wielofunkcyjnego do gry w piłkę ręczną, siatkówkę i tenisa; - budowie hali sportowej; - zagospodarowaniu terenu, tj. budowie dróg wewnętrznych i parkingów oraz urządzeniu terenów zielonych	Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury sportowej – 2 szt	0	Nie aplikowano o środki ze źródeł zewnętrznych. Nie planuje się realizacji projektu w 2019r. W przypadku nie pozyskania środków finansowych projekt nie będzie realizowany.
18	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski /	Modernizacja obiektów kultury – przebudowa budynku Kina Etiuda	A 2015-2019	Zakres realizowanych zadań: Modernizacja budynku Kina Etiuda znajdującego się w Gminnej Ewidencji Zabytków, roboty	Liczba zrewitalizowanych obiektów kultury – 1	0	Zadanie w ramach projektu pn. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale

	Miejskie Centrum Kultury		Zmiana terminu 2015-2021	ogólnobudowlane całego budynku wraz z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, wymiana instalacji sanitarnych, elektrycznych, wykonanie klimatyzacji i wentylacji mechanicznej sali kina, remont, dachu, zakup wyposażenia, itp.	szt.		gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, na które podpisano umowę o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-00 w dn. 20.04.2018r. Trwają prace nad dokumentacją projektową i pozyskaniem dokumentów zezwalających na realizację zadania. Realizacja robót budowlanych nie została rozpoczęta.
19	Powiat Ostrowiecki / Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim	„Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich”.	C Aktualny termin realizacji 2018-2019	Zakres realizowanych zadań: -Remont i przebudowa budynku Pałacu Wielopolskich wraz z przebudową wewnętrznej instalacji wod-kan., instalacji C.O., instalacji elektrycznej oraz budowę instalacji wentylacji mechanicznej. -Rewaloryzacja fragmentu Parku Częstocice obejmujący rewaloryzację szaty roślinnej, remont wewnętrznego układu drogowego, budowę placu przeznaczony na organizację wydarzeń plenerowych, budowę ekspozycji pieców dymarskich, lokalizację obiektów małej architektury oraz remont ogrodzenia parku. Lata realizacji 2018-2019	Liczba zrewitalizowanych obiektów kultury – 1 szt.	0	Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach działania 8.1 oś Priorytetowa: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, który przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną. 22 grudnia 2017r. podpisano umowę na dofinansowanie. Realizacja robót budowlanych nie została rozpoczęta.
20	Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa	Rewitalizacja parku w Osiedlu Spółdzielców	A 2017-2023	Zakres realizowanych zadań: Rewitalizacja parku osiedlowego polegająca na: - remoncie boiska z na boisko wielofunkcyjne/ korty tenisowe, - remoncie fontanny i zagospodarowaniu terenu wokół niej, - remoncie alejek spacerowych i terenów zielonych - montażu urządzeń zabawowych oraz sztucznej nawierzchni na placach zabaw w celu zwiększenia bezpieczeństwa osób korzystających, - powiększeniu siłowni zewnętrznej o nowe urządzenia do ćwiczeń, - zwiększeniu ilości miejsc do (ławki, kosze itp.)	Liczba zrewitalizowanych przestrzeni publicznych – 1 szt.	0	Zadanie w ramach projektu pn. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, na które podpisano umowę o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-00 w dn. 20.04.2018r. W 2018r. wykonano remont fontanny parkowej wraz z infrastrukturą techniczną, remont chodników i alejek spacerowych, wykonano nowe nasadzenia drzew, krzewów, roślin

							ozdobnych oraz rekultywację trawników.
21	Towarzystwo Przyjaciół Denkowa Parafia Rzymsko Katolicka pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim; Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ostrowieckiej	Budowa ścieżki rekreacyjno-edukacyjnej	A 2017-2023	Zakres realizowanych zadań: - wytyczenie, oznaczenie i urządzenie ścieżki edukacyjnej - urządzenie miejsc parkingowych - odnowienie zabytkowych figurek, krzyży i kapliczek - remont zabytkowej dzwonnicy wraz z opracowaniem stałej ekspozycji pn. „Z dziejów Denkowa i Parafii Denkowskiej” - zagospodarowanie terenu przy ul. Mostowej przy kładce pieszej - modernizację chodników oraz zieleńców - przebudowę/budowę nawierzchni ulic - ustawienie tablic informacyjno-edukacyjnych - wkomponowanie przy projektowanej ścieżce edukacyjnej trwałych elementów zieleni	Liczba zrewitalizowanych przestrzeni publicznych – 1 kpl. Liczba ścieżek edukacyjnych – 1 kpl	0	Nie aplikowano o środki zewnętrzne z powodu braku środków na wkład własny. Projekt planowany do realizacji w późniejszym okresie.
22	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	Zagospodarowanie terenów zielonych, sportowo-rekreacyjnych i centrów osiedli	ABDC 2017-2023	Zakres realizowanych zadań: Rewitalizacja centrów osiedli poprzez renowację boiska przy ul. Dziewuńskiego, przebudowę kortów tenisowych, zagospodarowanie obszarów małą architekturą, budowę placów zabaw, wyposażenia w urządzenia terenów rekreacyjno-sportowych, budowę parkingów, doposażenie placów zabaw, budowę oświetlenia boisk i placów zabaw, budowę punktów monitorowania bezpieczeństwa publicznego.	Liczba zrewitalizowanych przestrzeni i obiektów publicznych – 6 szt.	4	W 2018r wykonano następujący zakres zadań: - Budowa placu zabaw przy PSP7 sfinansowana ze środków Gminy, - instalacja 8 punktów monitoringowych na os. Ogrody, os. Patronackie, os. Rosochy, ul. Denkowska - zrealizowane ze środków Gminy w ramach budżetu obywatelskiego, - doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe przy ul. Traugutta - zrealizowane ze środków Gminy w ramach budżetu obywatelskiego - doposażenie strefy rekreacji w urządzenia do siłowni zewnętrznej przy ośrodku Gutwin ze środków budżetu Gminy.
23	Spółdzielnia Mieszkaniowa	Budowa placu zabaw w rejonie budynków nr 31	B 2016-2023	Zakres realizowanych zadań: Budowa placu zabaw: dostawa i montaż urządzeń	Liczba zrewitalizowanych	0	Zadanie w ramach projektu pn. Rewitalizacja obszarów

	'Krzemionki" w Ostrowcu Św.	- 34 na os. Rosochy oraz budowa siłowni zewnętrznej pomiędzy budynkami nr 25 - 27 na os. Rosochy, a ul. Słoneczną w Ostrowcu Św.		zabawowych, - wykonanie ogrodzenia placu zabaw, zagospodarowanie terenu, budowa siłowni zewnętrznej, zagospodarowanie terenu	przestrzeni – 2 szt		zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, na które podpisano umowę o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-00 w dn. 20.04.2018r. W 2018 r. przygotowano dokumentację i pozyskano niezbędne zezwolenia na realizację robót.
24	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	Zagospodarowanie parku Fabrycznego oraz parku w Częstocicach	C 2017-2023	Zakres realizowanych zadań: Zagospodarowanie parków poprzez małą architekturę, zieleni, urządzenia sportowo-rekreacyjne.	Liczba zrewitalizowanych przestrzeni publicznych – 2 szt.	0	W 2018 roku doposażono plac zabaw w nowe urządzenia do Croos-fitu. W 2019r. planuje się dalszą realizację zadania przy udziale środków pozyskanych w ramach Programu Otwarte Strefy Aktywności
25	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	Ogród Zdrowia na Osiedlu Ogrody	B 2017-2019 Nowy termin 2017-2020	Zakres realizowanych zadań: Ogród podzielony zostanie na 5 stref zmysłów służących terapii i edukacji. Zakres zadań obejmuje: - wykonanie ciągów komunikacyjnych, placów, nawierzchni sensorycznych - zagospodarowanie placu zabaw - zagospodarowanie siłowni zewnętrznej - zagospodarowanie zielonej klasy - montaż elementów małej architektury i elementów wyposażenia tj. pergola, ławki, kosze stojaki na rowery - nasadzenia roślin - założenie trawników - roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i budowlane.	Liczba zrewitalizowanych przestrzeni – 1 szt.	0	Zadanie w ramach projektu pn. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, na które podpisano umowę o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-00 w dn. 20.04.2018r. Przygotowano dokumentacja wykonawczą i kosztorysy. Zgłoszono wykonanie robót w starostwie powiatowym. Realizacja robót budowlanych nie została rozpoczęta.
26	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Rozwój wysokiej jakości usług społecznych	ABCD 2017-2020 Nowy termin realizacji 201-2021	Zakres realizowanych zadań: Ułatwianie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych, poprzez: 1. Deinstytucjonalizację opieki nad osobami niesamodzielnymi, obejmującą: a) tworzenie miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie usług świadczonych w lokalnej społeczności w nowych jak i istniejących	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w	0	Projekt planowany jest do realizacji w 2019. W 2018r. rozpoczęto aplikowanie o środki z RPO WŚ na lata 2014-2020 , działanie 9.2.1. jako projekt pozakonkursowy w partnerstwie z PCPR i OPS.

				<p>placówkach zapewniających opiekę dzienną i całodobową; b) wsparcie dla usług asystenckich, opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach opieki rodzinnej i środowiskowej, m.in. w formie rodzinnych domów pomocy, usług asystenta osoby niepełnosprawnej, c) usługi świadczone w ramach mieszkalnictwa wspomaganego - chronionego, treningowego i wspieranego. 2. Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób związanych ze świadczeniem usług społecznych.</p>	<p>kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu – 50</p>		
27	<p>Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim</p>	<p>Rozwój i wsparcie przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie Targowisk Miejskich</p>	<p>A 2017-2023</p>	<p>Zakres realizowanych zadań: Działania w ramach projektu prowadzić będą do zapewnienia organizacji parasolowej, wspierającej przedsiębiorców. Działania będą związane także z podnoszeniem kwalifikacji kadr Agencji Rozwoju Lokalnego jako instytucji otoczenia biznesu, tak, by zapewnić ostrowieckim przedsiębiorcom dostęp do fachowych usług i konsultantów posiadających aktualną wiedzę z zakresu nowoczesnego wsparcia przedsiębiorczości. Ponadto odbiorcą projektu będą przedsiębiorcy prowadzący działalność handlową na terenie Targowisk Miejskich. Obejmuje działania takie jak: preferencyjne ceny usług dla biznesu, tj. prowadzenia księgowości, obsługi prawnej, pozyskiwania środków na rozwój działalności gospodarczej, a także bezpłatne usługi w zakresie marketingu i doradztwa dla przedsiębiorców, coaching, mentoring, organizacja izby gospodarczej, rzecznictwo interesów przedsiębiorców, promocja oferty handlowej przedsiębiorców, podnoszenie standardów obsługi klienta, szkolenia w zakresie sprzedaży, merchandising, budowa marki i inne działania świadomościowe, których celem jest zwiększenie liczby osób robiących zakupy na terenie Targowisk Miejskich, a tym samym wsparcie rozwoju przedsiębiorstw działających w ramach Targowisk.</p>	<p>Liczba osób/podmiotów objętych wsparciem – 30 / 10</p>	<p>80/47</p>	<p>Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. przygotowała ofertę szkoleń dla osób zamieszkujących lub zatrudnionych na terenie Ostrowca Św., w tym na terenach objętych Programem Rewitalizacji, która jest realizowana w ramach projektu „UMIĘTNOŚCI DROGĄ DO SUKCESU” ze środków zewnętrznych z RPO WŚ w ramach poddziałania 8.5.3 Edukacja formalna i poza formalna osób dorosłych, na które otrzymano dofinansowanie (200 355,00zł). W latach 2017-2018r Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. przygotowała także w ramach projektu ofertę wsparcia dla przedsiębiorców prowadzących działalność handlową na terenie Targowisk Miejskich. Obejmuje ona działania takie jak: preferencyjne ceny usług dla biznesu, tj. prowadzenia księgowości, obsługi prawnej, pozyskiwania środków na rozwój działalności gospodarczej, a także bezpłatne usługi w zakresie marketingu i doradztwa dla przedsiębiorców, coaching, mentoring, organizacja izby gospodarczej, rzecznictwo interesów</p>



zmieniających się przepisów, nowinek gospodarczych. Zamieszczony jest również wykaz usług oferowanych przez ARL.

- w budynku Centrum Biurowo – Konferencyjnym działa punkt informacyjny gdzie można uzyskać informacje jak założyć własną działalność gospodarczą, skąd pozyskać fundusze na jej otworzenie, czy też rozwój.
- możliwość nieodpłatnej promocji towarów i usług w Barze Mlecznym Czwórka
- przeprowadzono akcję „Dobre, bo lokalne!”, której celem była promocja lokalnych przedsiębiorców.
- wysłano oferty promocji do dziewięciu firm produkujących produkty regionalne, - zorganizowano szkolenia z dziedziny funduszy europejskich
- zorganizowano wizyty studyjne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, uczestniczyło w 2017r - 80 uczniów, w 2018 - 130 uczniów.
- zorganizowano promocję przedsiębiorczości za pośrednictwem programu informacyjnego „Telewizja Ostrowiecka”.
- podjęto współpracę ze Świątokrzyską Izbą Gospodarczą świadcząc doraźną pomoc prawną.
- w 2017 roku współpracowano z 13 podmiotami a w 2018 z 16, dla których świadczono usługę księgowości po preferencyjnych stawkach.
- z konsultacji w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej skorzystało w

							2017r. 40 osób a w 2018r. 30 osób (w tym informacja na temat źródeł pozyskania dotacji na rozpoczęcie i rozwój działalności). W 2018r. zrealizowano działanie dla ostrowieckiej młodzieży pod nazwą Profilaktyczne ABC przedsiębiorczości. -przeprowadzono szkolenia dla osób prowadzących działalność gospodarczą i zainteresowanych (udział wzięło 69 pracowników)
29	Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim	Gminne Centrum Informacji w Ostrowcu Świętokrzyskim	ABCD 2017-2023	Zakres realizowanych zadań: Projekt przewiduje pomoc i koordynację działań mających na celu rozwiązywanie problemów w sferze społecznej, edukacyjnej wśród mieszkańców miasta zamieszkujących obszary rewitalizacji. Wśród działań przewidywane są: 1. Szkolenia aktywizacji zawodowej, przedsiębiorczości i rynku pracy: szkolenia z obszaru umiejętności osobistych pracownika, z zakresu umiejętności informatycznych, warsztaty z przedsiębiorczości, warsztaty tematyczne. 2. Wsparcie osób poszukujących pracy poprzez indywidualne doradztwo zawodowe, pomoc w procesie aplikowania do pracy – w szczególności dla osób nie posiadających dostępu do komputera i internetu, a także dla osób potrzebujących pomocy w trakcie aplikowania do pracy za granicą Działania te byłby skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób bezrobotnych poszukujących zatrudnienia, zwłaszcza osób młodych – absolwentów szkół średnich, zawodowych oraz uczelni wyższych.	Liczba osób uczestniczących w projekcie – 100	20	Nie aplikowano o środki zewnętrzne ze względu na brak dostępnych źródeł finansowania. Projekt planowany do realizacji ze środków samorządowych, niewykluczone że w ograniczonym zakresie. Dotychczas zrealizowano następujące zadania: -udzielono wsparcia, w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych dla 43 osób i przeprowadzono 170 spotkań, konsultacyjnych dotyczących ofert pracy -przeprowadzono akcję informacyjną na temat projektów związanych z dofinansowaniem zakładanej działalności gospodarczej, -udzielano informacji dotyczących szkoleń i możliwości przekwalifikowania zawodowego, - podjęto współpracę z klubami seniora i organizacjami przygotowując spotkania informacyjne.
30	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie	ABCD 2017-2020 Nowy termin realizacji	Zakres realizowanych zadań: 1. Kompleksowa i zindywidualizowana aktywizacja społeczno – zawodowa wykorzystująca w zależności od potrzeb elementy aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zawodowej, obejmująca	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych	0	W 2018 roku ze względu na pojawiające się możliwości pozyskania dofinansowania wznowiono realizację projektu i rozpoczęto przygotowywanie dokumentacji do konkursu.

			2019-2021	<p>następujące działania:</p> <p>a) narzędzia oraz formy aktywnej integracji i pracy socjalnej, w szczególności: kontrakty socjalne (praca socjalna, prace społecznie użyteczne, usługi aktywnej integracji, działania o charakterze środowiskowym), programy aktywności lokalnej (zastosowanie w ramach projektu: środowiskowej pracy socjalnej realizowanej przez pracownika socjalnego lub inną osobę, usług aktywnej integracji, prac społecznie użytecznych, działań o charakterze środowiskowym)</p> <p>b) kursy, szkolenia i inne zajęcia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych;</p> <p>c) aktywizację zawodową poprzez staże, subsydiowane zatrudnienie, zatrudnienie wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami oraz działania wspierające, w tym poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, trener pracy;</p> <p>d) terapię oraz poradnictwo indywidualne i grupowe wspierające umiejętności społeczne i zawodowe umożliwiające powrót do życia społecznego, w tym aktywizację zawodową i powrót na rynek pracy;</p> <p>e) wsparcie środowiskowe na rzecz integracji zawodowej i społecznej (m.in. działania związane z animacją lokalną, streetworkingiem, coachingiem, treningiem pracy) z uwzględnieniem wolontariatu</p>	<p>wsparcie w programie – 100</p> <p>Liczba osób z niepełnosprawnościami i objętych wsparciem w programie – 20</p>	<p>Zakres zmian:</p> <p>Zaktualizowano budżet projektu:</p> <p>Ogółem: 4 000 000</p> <p>Środki własne: 15%</p> <p>Środki zewnętrzne: 85%</p>	
31	Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim	Centrum Wspierania Inicjatyw społeczno-Ekonomicznych	ABCDEF 2017-2023	<p>Nowy zakres projektu.</p> <p>Zakres realizowanych zadań:</p> <p>Odbiorcami projektu są organizacje pozarządowe działające na obszarze objętym rewitalizacją w Ostrowcu Św., a także takie, które chcą rozpocząć swoją działalność na tym obszarze lub na terenie miasta; przedstawiciele grup nieformalnych, aktywni obywatele społeczności, którzy chcą realizować projekty i inicjatywy społeczne.</p> <p>Wsparcie będzie udzielane bez względu na wiek – będą z niego korzystać zarówno przedstawiciele</p>	<p>Liczba osób uczestniczących w projekcie – 100</p>	50	<p>Realizacja projektu opiera się na środkach budżetu Gminy Ostrowiec Św.</p> <p>W latach 2017-2018 zrealizowano następujący zakres:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 100 usług doradczych - 17 szkoleń/seminariów - Przygotowano wspólnie z organizacjami wnioski: Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu „Nowe perspektywy dla mieszkańców



młodzieży, jak i seniorzy realizujący inicjatywy na tych obszarach. Wsparcie w ramach projektu udzielane będzie bezpłatnie i obejmować będzie następujący zakres usług:

- poradnictwo
- szkolenia, seminaria, spotkania informacyjne,
- udostępnianie zaplecza techniczno-lokalowego
- wydanie broszury informacyjnej „ABC uzależnień. Vademecum organizacji pomocowych i pozarządowych”.

Ostrowca Świętokrzyskiego”, Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu „Umiejętności drogą do sukcesu”, Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu „Aktywni na rynku pracy”, „Co seniorom w duszy gra”, „Szansa na przyszłość” - przeprowadzono konsultacje ofert składanych przez Stowarzyszenie Głusi Nad Kamienną (Urząd Gminy Ostrowiec Św., PFRON) - przeprowadzono wizyty studyjne: przedstawiciele ostrowieckich organizacji pozarządowych na Regionalnych Targach Ekonomii Społecznej w Kielcach., wizyta studyjna młodzieży ostrowieckich szkół zorganizowana we współpracy z Stowarzyszenie KP KSZO 1929 Ostrowiec., wizyty studyjne w CAO, wizyty w ośrodku Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu i Inkubatorze Przetwórczym w Dwikozach, spotkanie Grupy Tematycznej ds. współpracy pomiędzy nauką, NGO, biznesem i administracją w Agencji Rozwoju Regionalnego w Starachowicach. - Prowadzenie Centrum Aktywności Obywatelskiej w Centrum Aktywności Obywatelskiej realizowane są wspólne inicjatywy, szkolenia, konferencje, projekty; prowadzony jest punkt informacyjny czynny pięć dni w tygodniu, w którym dostępne osoby świadczące usługi wspierające organizacje pozarządowe, w tym w zakresie doradztwa prawnego, księgowego, technicznego, organizacyjnego, merytorycznego;



projektu odbywało się w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej z osób. Zastosowane zostały instrumenty i narzędzia aktywnej integracji na rzecz osób doświadczających wykluczenia społecznego w wymiarze zawodowym i społecznym, zmierzające do eliminacji barier w procesie aktywizacji społeczno-zawodowej i prowadzących do zmniejszenia ryzyka zjawiska wykluczenia: doradztwo psychospołeczne i zawodowe, warsztaty psychospołeczne oraz rozwoju zawodowego, szkolenia zawodowe: Kucharz z modułem obsługi kasy fiskalnej i Brukarz oraz staże zawodowe. Promocja działań aktywizacyjnych prowadzona była również za pośrednictwem Telewizji Ostrowieckiej.

Tab.5 Lista pozostałych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz z osiągniętymi wskaźnikami produktu i stopniem realizacji projektu.

Lp.	Beneficjent	Nazwa projektu	Obszar Termin realizacji zadania	Planowany zakres	Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika w okresie sprawozdawczym stan na 31.12.2018r.	Stopień realizacji projektu
1	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I	E 2015- 2021	Zakres realizowanych zadań: - opracowanie dokumentacji projektowej - badania geotechniczne i dokumentacja techniczna dotycząca rekultywacji/remediacji, prac rozbiórkowych, wycinki drzew, budowy dróg, uzbrojenie w infrastrukturę techniczną	Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych – 11,80 ha	0	Trwają prace nad realizacją projektów w zakresie uzyskania niezbędnych zezwoleń na rozpoczęcie robót budowlanych. W 2019r. planuje się budowę wodociągu, kanalizacji sanitarnej, przyłącza energetycznego i budowę dróg. W latach kolejnych uzyskanie pozwoleń na budowę
2	Gmina Ostrowiec	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w	E 2020-	- roboty budowlane – rekultywacja/remediacja	Powierzchnia przygotowanych	0	

	Świętokrzyski	Ostrowcu Świętokrzyskim - etap II	2023	<p>gruntów, prace rozbiórkowe, wycinka drzew, budowa dróg, oświetlenia, kanalizacji deszczowej, uzbrojenie w infrastrukturę techniczną</p> <p>- promocja projektu – wykonanie tablicy informacyjnej/promocyjnej, udział w konferencjach/targach/forach branżowych; realizacja spotu radiowego; reklama w prasie, wykonanie filmu i folderu promocyjnego</p> <p>- inne – opracowanie studium wykonalności, przygotowanie terenów do sprzedaży (scalenie, podziały, operaty, ogłoszenia)</p> <p>Zakres realizowanych zadań:</p> <p>- opracowanie dokumentacji projektowej</p> <p>- roboty budowlane – budowa dróg, oświetlenia, kanalizacji deszczowej, uzbrojenie w infrastrukturę techniczną (w szczególności: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, gazowa, innych sieci specjalistycznych)</p> <p>- przygotowanie terenów do sprzedaży (scalenie, podziały, operaty, ogłoszenia)</p>	terenów inwestycyjnych – 40 ha		dróg.
3	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	Budowa ulicy Nowotrzeciaków wraz z zagospodarowaniem Strugi Denkowskiej	D 2020-2023	<p>Zakres realizowanych zadań:</p> <p>Budowa drogi o długości ok. 1,1 km wraz z zagospodarowaniem terenu, małą architekturą, oświetleniem, urządzeniem miejsc parkingowych. Budowa ścieżek rowerowych oraz miejsc wypoczynku, wkomponowanie przy projektowanej ścieżce trwałych elementów zieleni. Regulacja i usprawnienie przepływu wód Strugi Denkowskiej.</p>	Liczba zmodernizowanych / wybudowanych ciągów komunikacyjnych – 1 szt.	0	Projekt zaplanowany do realizacji w późniejszym okresie.
4	„Fundacja Pomocna Dłoń”	„Ostrowiec pięknieje”	B 2017-2018 Zmiana terminu realizacji na 2019-2021	<p>Zakres realizowanych zadań:</p> <p>„Fundacja Pomocna Dłoń” prowadząc Centrum Integracji Społecznej, a także działalność gospodarczą, posiada odpowiednie doświadczenie w pracach związanych z zakładaniem zieleńców, rabat kwiatowych i doposażania tych miejsc elementami małej architektury. Jest w stanie również prowadzić zabiegi polegające na stałym utrzymaniu obszarów zieleni, ich konserwacji i wprowadzania zmian</p>	Liczba zrewitalizowanych przestrzeni – 1 szt.	0	Nie aplikowano o żadne środki zewnętrzne. Nie planuje się realizacji w 2019 roku w przypadku nie uzyskania środków zewnętrznych.

8	Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim	Ostrowiecka Młodzież – Kreatywna Młodzież	ABCD 2017- 2023	Zakres realizowanych zadań: - indywidualne doradztwo zawodowe - warsztatowe zajęcia grupowe - młodzieżowych saloniki dyskusyjne	Liczba uczniów korzystających z doradztw i warsztatów – 200	385	<p>Projekt realizowany z Gminnych Programów Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 i 2018.</p> <p>W 2017 roku zrealizowano następujące działania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organizacja saloników dyskusyjnych „Młodzi z pasją – wolni od uzależnień, twórczy i aktywni w życiu”, Salonik dyskusyjny, pod hasłem „Zaprojektuj swoją przyszłość – decyduj świadomie”. - zrealizowano zadanie „ZDROWO-KOMFORTOWO” finansowane z budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017, - Zostały przeprowadzone zajęcia grupowe, dyżury specjalistyczne oraz konkurs profilaktyczny pod wspólną nazwą „ZDROWO - KOMFORTOWO”. - zorganizowano konkurs, w ramach którego uczniowie we współpracy z Telewizją Ostrowiecką przygotowywali spoty promocyjne, dotyczące profilaktyki uzależnień. - kontynuowano również podjętą w 2016 roku współpracę z Niepubliczną Szkołą Podstawową, Gimnazjum i Liceum im. Stanisława Konarskiego, w ramach której prowadzone były zajęcia i warsztaty na temat rynku pracy, autoprezentacji i rozwoju kompetencji psychospołecznych uczniów gimnazjum i liceum. - prowadzono indywidualne doradztwo, z których skorzystało 51 uczniów. - promowano zdrowy styl życia i postawy przedsiębiorcze młodzieży <p>W 2018r. zrealizowano następujące</p>
---	--	---	-----------------------	--	---	-----	--

							<p>działania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zajęcia w ramach zadania „Profilaktyczne ABC z przedsiębiorczością” - zajęcia profilaktyczne dla uczniów gimnazjów ostrowieckich (warsztaty, debaty „Siłownia Profilaktyczna”, dyżury specjalistyczne, spotkania) - zajęcia w ramach zadania „Odlotowo-Zdrowo-komfortowo” (dyżury specjalistyczne, spotkania profilaktyczne oraz konkurs dla młodzieży gimnazjalnej) <p>W działaniach udział wzięło 590 uczniów.</p>
9	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim	Świetlica środowiskowa przy Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim	A 2017 - 2023	<p>Zakres realizowanych zadań:</p> <ul style="list-style-type: none"> - adaptacja i odnowienie budynku w zakresie niezbędnym do funkcjonowania świetlicy środowiskowej. - zakup niezbędnego wyposażenia 	<p>Liczba nowo uruchomionych świetlic środowiskowych – 1 szt.</p> <p>Liczba osób korzystających ze świetlicy środowiskowej – 20</p>	0	<p>Nie aplikowano o środki zewnętrzne. Nie planuje się do realizacji w 2019r.</p>
10	Nowa nazwa Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Nasz Dom”	Wyrównajmy „pas startowy”- przygotowanie wychowanków Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Nasz Dom” w Ostrowcu Świętokrzyskim do integracji ze środowiskiem i usamodzielnienia się..	A 2018- 2020 Nowy termin 2018 - 2022	<p>Zakres realizowanych zadań:</p> <p>Cel projektu zostanie zrealizowany poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kształtowanie kompetencji społecznych umożliwiających prawidłową integrację ze środowiskiem poprzez realizację warsztatów psychoedukacyjnych, indywidualnych spotkań z psychologiem - organizację działań integracyjnych z biologicznymi rodzinami wychowanków placówki - indywidualne i grupowe wychowanków oraz ich rodzin, - organizację Dnia Rodziny. - rozwijanie zdolności i zainteresowań wychowanków placówki poprzez udział w zajęciach plastycznych i teatralnych umożliwiających integrację ze środowiskiem, udział w zimowym i wakacyjnym obozie socjoterapeutycznym, organizację wycieczki edukacyjnej, kurs prawa jazdy dla najstarszych 	<p>Liczba osób uczestniczących w projekcie – 30</p>	16	<p>Pozyskano środki w kwocie 5250 zł z Fundacji Towarzystwo Nasz Dom. W ramach tych środków przeprowadzono szkolenia i warsztaty kształtujące umiejętności i społeczne i praktyczne wychowanków placówki.</p>

				wychowanków, korepetycje przedmiotowe - podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników placówki poprzez realizację warsztatów umiejętności wychowawczych, indywidualnych i grupowych spotkań z psychologiem			
11	Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi	Przebudowa budynków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasz Dom” Zgromadzenia Sióstr franciszkanek Rodziny Maryi	A Termin realizacji 2018-2020 Nowy termin 2018-2022	Zakres realizowanych zadań: Przebudowa placówki jest zaplanowana w etapach, aby nie przerywać jej funkcjonowania. Pierwszy etap to remont dotychczasowej części biurowej i kilku pomieszczeń istniejącego wcześniej specjalnego ośrodka wychowawczego – budynki 17 i 19 b. Ma tu powstać placówka opiekuńczo-wychowawcza dla 14 dzieci. Drugi etap to remont budynku nr 19 i przystosowanie go do potrzeb małej, bardziej rodzinnej placówki oraz przygotowanie pomieszczeń dla specjalistów. Trzeci etap to remont budynku po specjalnym ośrodku wychowawczym – ul. Szkolna 19a i przystosowanie go na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej z miejscami dla niepełnosprawnych dzieci. Kolejnym etapem będzie termomodernizacja budynku, doposażenie placu zabaw i wykonanie nowego ogrodu.	Liczba zrewitalizowanych budynków – 1 szt.	0	Nie aplikowano o środki zewnętrzne. Realizację projektu rozpoczęto ze środków Funduszu Kościelnego i dotacji starostwa. Do 2017r. wyremontowano część budynku, w którym mieści się placówka opiekuńczo- wychowawcza.
12	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim	Prowadzenie zajęć integracyjno-profilaktycznych w świetlicy środowiskowej przy Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim	A 2018 - 2023	Zakres realizowanych zadań: - prowadzenie zajęć integracyjno-profilaktycznych poprzez umożliwianie dzieciom i młodzieży wszechstronnego rozwoju z udziałem wykwalifikowanych instruktorów w takich dziedzinach aktywności jak: sport, kultura i sztuka, edukacja i rekreacja co przyczyni się do kształtowania pożądanych zachowań społecznych i cech osobowości - planuje się ćwiczenia grup sportowych pod kierunkiem instruktorów (np. zajęcia kulturystyczne, szachy, tenis stołowy) - przygotowanie do rywalizacji młodzieży w zawodach o zasięgu gminnym, powiatowym oraz regionalnym i ponadregionalnym. - w zakresie kultury i sztuki planuje się rozwój talentów w zakresie: malarstwa, rzeźby, ceramiki,	Liczba osób uczestniczących w projekcie – 30	0	Nie aplikowano o środki zewnętrzne. Nie planuje się zadania do realizacji w 2019r.

				grafiki komputerowej i fotografii - projekcja wartościowych filmów posiadających walor wychowawczo-edukacyjny - planuje się organizację wycieczek krajoznawczych i rajdów pieszych oraz rowerowych - przewiduje się również prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży wymagającej wsparcia w tym zakresie			
13	Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim	Prowadzenie Punktów Konsultacyjnych ds. Uzależnień w Ostrowcu Świętokrzyskim	ABCD 2017-2023	Zakres realizowanych zadań: Punkt konsultacyjny ds. uzależnień to miejsce, w którym specjalista dokonuje wstępnej diagnozy problemu, zbiera wywiad dotyczący stopnia zaawansowania uzależnienia, edukuje, udziela informacji, motywuje do podjęcia leczenia. Działanie prowadzone będzie dwutorowo: 1. Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych, eksperymentujących z narkotykami i ich rodzin, prowadzony w budynku Centrum Edukacji Obywatelskiej 2. Punkty konsultacyjne prowadzone w gminnych placówkach oświatowych publicznych Zadania punktów konsultacyjnych: - prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, - udzielanie osobom i rodzinom konsultacji oraz porad terapeutycznych, psychologicznych i profilaktycznych w sprawach uzależnień, - wspomaganie osób używających ryzykownie i szkodliwie w podjęciu decyzji w sprawie zmiany, - motywowanie osób współuzależnionych do ewentualnego podjęcia psychoterapii w zakładach leczenia odwykowego, - gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb i instytucji z terenu gminy, zajmujących się systemową pomocą dla rodziny, - współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień, w	Liczba osób uczestniczących w projekcie – 100	103	Zadanie finansowane ze środków Gminnych Programów Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2017 i 2018. W latach 2017-2018 zrealizowano następujący zakres: - „Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i eksperymentujących z narkotykami i członków ich rodzin”. -indywidualne poradnictwo terapeutyczne – skorzystało 61 osób; w umowie przewidziano 150 godzin konsultacji terapeutycznych; - indywidualne poradnictwo psychologiczne – skorzystało 22 osób, w umowie przewidziano 50 godzin konsultacji psychologicznych. - indywidualne poradnictwo prawne- skorzystało 22 osoby, w umowie przewidziano 40 godzin. Ogółem przeprowadzono 240 godzin konsultacji. Promocja Punktów konsultacyjnych odbywała się również za pośrednictwem Telewizji Ostrowieckiej.



14	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	"Aktywni na rynku pracy"	A 2017- 2019	szczegółowości lekarzami psychiatrii;	Liczba osób biorących udział w projekcie – 40	0	Nie aplikowano o środki zewnętrzne. Zrezygnowano z realizacji projektu.
				Zakres realizowanych zadań: - 96-godzinny Kurs programowania i obsługi obrabiarek CNC - zakup dwóch programów: do nauki programowania obrabiarek CNC i nauki komputerowego wspomaganie wytwarzania - 150-godzinne staże zawodowe na lokalnym rynku pracy - indywidualne doradztwo zawodowe - stypendia stażowe - materiały szkoleniowo-piśmiennicze, - szkolenia bhp, - zakup odzieży ochronnej, - materiały szkoleniowo-piśmiennicze, - catering, obsługa projektu, zakupy biurowe			
15	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	"Aktywni bezrobotni!"	A 2017- 2019	Zakres realizowanych zadań:	Liczba osób biorących udział w projekcie – 40	0	Nie aplikowano o środki zewnętrzne. Zrezygnowano z realizacji projektu.
				- 96-godzinny Kurs programowania i obsługi obrabiarek CNC - 96-godzinny Kurs wizażu i stylizacji paznokci - kursy na prawo jazdy kategorii: B, B+E, A2, C - zakup dwóch programów: do nauki programowania obrabiarek CNC i nauki komputerowego wspomaganie wytwarzania, - zakup materiałów, środków i sprzętu do makijażu oraz stylizacji paznokci, - szkolenia bhp, - zakup odzieży ochronnej, - materiały szkoleniowo-piśmiennicze, - catering, obsługa projektu, zakupy biurowe			

16	Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim	Aktywni seniorzy- aktywna społeczność	ABCD Nowy termin realizacji 2018-2020	Nowy zakres realizowanych zadań: Projekt będzie obejmował wsparcie organizacji, inicjatyw i instytucji zajmujących się tematyką senioralną w pozyskaniu środków zewnętrznych na organizację zajęć angażujących czas wolny seniorów np. zajęć komputerowych, plastycznych, gimnastycznych w zakresie zdrowego stylu życia i żywienia, nauki radzenia sobie ze stresem i animacją czasu wolnego, a także warsztaty dla liderów z zakresu samoorganizacji i prowadzenia grup seniorskich. Ostatecznym odbiorcą projektu będą osoby starsze zamieszkujące w Ostrowcu Św.	Liczba osób uczestniczących w projekcie – 100	50	Realizacja projektu rozpoczęta została w 2018r. Ze względu na niepozyskanie dofinansowania działania były realizowane w ograniczonym zakresie przy współpracy Stowarzyszenia EGO. - udzielono wsparcia w rejestracji stowarzyszenia Osiedlowemu Klubowi Aktywnych Seniorów - udzielono pomocy przy aplikowaniu o środki zewnętrzne innym organizacjom -udzielono pomocy przy realizacji przedsięwzięć lokalnych i realizacji projektu „Co seniorom w duszy gra”
17	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” w Ostrowcu Św.	Poprawa społeczno - gospodarczego wykorzystania Osiedlowego Domu Społecznego „Malwa” w Ostrowcu Św.	B 2016-2023	Zakres realizowanych zadań: - promowanie przedsiębiorczości i aktywności społecznej poprzez organizację różnego rodzaju szkoleń - utworzenie nowych miejsc pracy - promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego	Liczba osób uczestniczących w spotkaniach – 50 osób	0	Zakres zmian w projekcie: Aktualizacja terminu realizacji. Nie aplikowano o środki zewnętrzne. Projekt nie będzie realizowany w przypadku braku dofinansowania.
18	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych	A 2015-2018 Zmiana terminu 2015-2019	Zakres realizowanych zadań: - rozbiorczy części suszarni, magazynu, słodowni, warzelnii, magazynu zbożowego, - rewitalizacja zespołu obiektów polegająca na przebudowie i adaptacji do nowych funkcji budynku, - wykonanie fragmentów dobudowanych do budynku, - prace termomodernizacyjne, - nawierzchnie utwardzone i ciągi pieszo-jezdne, - parkingi, zieleni, - sieci zewnętrzne, - wyposażenie, mała architektura (ławki, kosze na śmieci, oświetlenie, stacja trafo, itp.).	Liczba zrewitalizowanych obiektów kultury – 1 szt.	0	Aplikowano o środki z działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” w ramach RPO WŚ. Wniosek złożony w dn.20.01.2016r, w dn. 15.12.2017r. podpisano umowę i rozpoczęto realizację projektu. Wartość dofinansowania: 13 900 115,27 zł Wyłoniono wykonawcę dokumentacji i prac budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Opracowana została dokumentacja projektowa, uzyskano pozwolenie na budowę, rozpoczęto realizację robót budowlanych. w 2018 roku wykonywane były prace w zakresie robót budowlanych, termomodernizacyjnych, sanitarnych oraz



							instalacji elektrycznych. Trwały prace przy dobudowie obiektu od strony dziedzińca, prace w zakresie zagospodarowania terenu (drogi, chodniki, zieleń) oraz sieci zewnętrznych (kanalizacja deszczowa i sanitarna, przyłącze wody, roboty elektryczne, urządzenia techniczne). Stan zaawansowania robót na koniec 2018 roku wyniósł ok. 80 %.
19	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski / Miejskie Centrum Kultury	Centrum Tradycji Hutnictwa	C 2018-2020 Nowy termin 2018-2021	Zakres realizowanych zadań: - prace budowlane i konserwatorskie - prace instalacyjne (branża elektryczna, wod. - kan. c. o., wentylacja i klimatyzacja) - zakup sprzętu, eksponatów i wyposażenia - digitalizacja zbiorów.	Liczba zrewitalizowanych obiektów kultury – 1 szt.	0	Zadanie w ramach projektu pn. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, na które podpisano umowę o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-00 w dn. 20.04.2018r. Trwają prace nad dokumentacją projektową i pozyskaniem dokumentów zezwalających na realizację zadania. Realizacja robót budowlanych nie została rozpoczęta.
20	Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim	„Rozbudowa Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia o salę koncertową wraz z instalacjami wod.-kan., gazu, c.o., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, energii elektrycznej, techniczną i niskoprądową – na działkach nr ew. 48/9, 49/2, 50 (obręb 36, arkusz 1) położonych przy ul. Iłżeckiej w Ostrowcu Św.”	A 2018 Nowy termin 2020	Zakres realizowanych zadań: Projekt dotyczy rozbudowy, przebudowy i remontu nie zabytkowej infrastruktury na cele działalności kulturalnej. Beneficjentem projektu będzie Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia prowadzona i nadzorowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zakres inwestycji będzie obejmował rozbudowę budynku o budowę Sali koncertowej wraz z zapleczem i wyposażeniem.	Liczba zrewitalizowanych obiektów kultury – 1 szt.	0	W 2017r. aplikowano o środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury. Projekt nie uzyskał dofinansowania. Planowane jest aplikowanie o środki zewnętrzne w 2019r. i realizacja w przyszłych latach. W przypadku braku środków zewnętrznych inwestycja nie zostanie zrealizowana ze środków własnych.
21	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	Budowa ścieżek rowerowych	ABCDEF 2017-2023	Zakres realizowanych zadań: Budowa ścieżek rowerowych na terenach rewitalizowanych o długości ok. 6 km wraz z małą architekturą oraz stacjami umożliwiającymi naprawę rowerów.	Liczba wybudowanych/ zmodernizowanych ścieżek rowerowych – 6 km	1	Projekt zaplanowany do realizacji w późniejszym okresie.

22	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski / MOSiR Ostrowiec Św.	Remont i doposażenie Miejskiego Stadionu Sportowego KSZO	C 2017-2023	Zakres realizowanych zadań: - malowanie konstrukcji stalowej trybun stadionu - wymiana siedzisk dla kibiców - budowa nowego ogrodzenia od strony ul. Zgoda - wykonanie instalacji nawadniającej płytę boiska - montaż nowego systemu nagłośnienia stadionu - montaż piłko chwytów za bramkami	Liczba zrewitalizowanych obiektów infrastruktury sportowej – 1 szt.	0	Nie aplikowano o środki zewnętrzne. Nie planuje się realizacji projektu w 2019r. W przypadku braku możliwości pozyskania środków z zewnątrz projekt zostanie zrealizowany w ograniczonym zakresie.
23	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	Budowa zbiornika retencyjno-rekreacyjnego Stawki II	B 2020-2023	Zakres realizowanych zadań: - budowa zbiornika retencyjno-rekreacyjnego o pojemności 49tys.m3 - odbudowa koryta Strugi Denkowskiej - budowa przepustu z piętrzeniem - formowania podwyższenia zbiornika - budowa kanału deszczowego, przerzutowego, rowów izolacyjnych - budowa przystani kajakowej - odmulenie przepustów, mlich spustowych - budowa ciągów spacerowych oraz ścieżek rowerowych, oświetlenia,	Liczba zrewitalizowanych przestrzeni publicznych – 1 szt. Liczba utworzonych zbiorników retencyjno-rekreacyjnych – 1 szt	0 0	Projekt zaplanowany do realizacji w późniejszym okresie
24	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	Budowa placów zabaw przy gminnych placówkach oświatowych	BD 2019-2023 Nowy termin 2017-2023	Zakres realizowanych zadań: Projekt obejmuje budowę 3 ogólnodostępnych placów zabaw przy gminnych przedszkolach, przystosowanych dla różnych grup wiekowych i składających się m.in.: z nawierzchni sztucznej amortyzującej upadek wraz z różnymi elementami zabawowymi (np. karuzele, zjeżdżalnie, słuchawki, zestawy sprawnościowe, urządzenia interaktywne, itp).	Liczba zrewitalizowanych przestrzeni przy obiektach publicznych – 3 szt	2	W 2017r. wykonano w ramach budżetu obywatelskiego ze środków gminnych plac zabaw przy PSP nr 9 oraz w 2018r. plac zabaw przy PSP nr 1. Projekt będzie kontynuowany w latach kolejnych.
25	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski / Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	Działamy-matematykę odkrywamy	A 2016-2017	Zakres realizowanych zadań: W ramach projektu będą prowadzone zajęcia innowacyjnymi metodami, w szczególności metodą eksperymentu: - zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze z matematyki dla uczniów posiadających braki edukacyjne z zakresu matematyki, - dodatkowe zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania z zakresu matematyki, - zajęcia psychologiczne zwiększające kompetencje uczenia się i kompetencje społeczne.	Ilość osób uczestniczących w projekcie – 182	182	Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach RPO na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Spójności z działania 8.3.2 Wartość Projektu: 315680,00 -UE+BP, 45240,00 -środki własne Projekt został zakończony i rozliczony w roku 2017r.

				Ponadto uczniowie otrzymają poczęstunek oraz materiały piśmiennicze. Dodatkowo zostanie utworzona jedna pracownia międzyszkolna oraz zostaną wyposażone pracownie przedmiotowe w pomoce dydaktyczne do nauczania matematyki metodą eksperymentu			
26	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski / Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	Lepsza edukacja - lepsza przyszłość	A 2016-2018	Zakres realizowanych zadań: - zwiększenie kompetencji matematycznych, - poprawa porozumiewania się w języku obcym, również u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, - utworzenie kół zainteresowań - zajęcia z zakresu umiejętności uczenia się i technik szybkiego zapamiętywania z wykorzystaniem zakupionej w ramach projektu bazy dydaktycznej, - wycieczki edukacyjne - uczniowski projekt edukacyjny - zwiększenie kompetencji zawodowych u nauczycieli	Ilość osób uczestniczących w projekcie – 132	144	Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach RPO na lata 2014-2020 ze Środków Europejskiego Funduszu Spójności z działania 8.3.2. Realizowany od 2016 do 2018r. W roku 2017r. zrealizowano 7 z 12 zadań w zakresie objęcia wsparciem 21 nauczycieli i 132 uczniów. W 2018r. zrealizowano pozostałe zadania w zakresie objęcia wsparciem uczniów i nauczycieli oraz wyposażono szkołę w pomoce multimedialne.
27	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	Nowoczesna Szkoła – modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej	ABD 2016-2018 Nowy termin realizacji 2016-2019	Zakres realizowanych zadań: - modernizacja dwóch boisk wielofunkcyjnych przy PSP nr 4 i ZSP nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu - wyposażenie placówek w nowoczesne pomoce dydaktyczne - modernizacja PSP nr 3 i ZSP nr 2 (szatnie, korytarze, łazienki, sale gimnastyczne)	Liczba placówek oświatowych biorących udział w projekcie – 8 szt.	8	Projekt został zakończony w 2018r. Aplikowano o środki zewnętrzne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 „Sprawne usługi publiczne”, Działanie 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”. Podpisano umowę o dofinansowanie. Wartość ogółem: 5242 758,65 zł Wartość dofinansowania: 2 999 347,60 zł (75% kosztów kwalifikowanych). Wykonano modernizację boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 14, montaż platformy przyschodowej wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w PSP nr 14, modernizację i wyposażenie szatni w PSP Nr 3. Wykonana została budowa instalacji zasilającej i sieci komputerowej z nadajnikami Wi-Fi w szkołach podstawowych. Dostarczono pomoce

						dydaktyczne w postaci komputerów przenośnych z oprogramowaniem, urządzeń wielofunkcyjnych, tablic interaktywnych, rzutników oraz szaf na laptopy.	
						Zakres zmian w projekcie: Nowy termin realizacji.	
28	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski / Zespół Szkół i Placówek Publicznych Nr 3	„One Two Three – eksperymentujemy z matematyką i językiem angielskim - program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim	B 2016- 2018	Zakres realizowanych zadań: Główne działania w projekcie: - dodatkowe zajęcia matematyczne, językowe, doradztwo edukacyjno-zawodowe - spartakiada umiejętności matematycznych i językowych - wycieczka do CN Kopernik i British Council - program wspomagania nauczycieli, - wyposażenie międzyszkolnej pracowni matematycznej w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK, co zapewni warunki do nauczania opartego na metodzie eksperymentu.	Ilość osób uczestniczących w projekcie – 186	186	W 2016r. aplikowano o środki zewnętrzne z działania 8.3.2. W ramach projektu realizowane były następujące zadania: Zdanie 1 - zajęcia grupowe matematyczne oparte na metodach eksperymentalnych, badawczych i kreatywnych - zajęcia grupowe ruchowe nauka matematyki w oparciu na połączeniu zajęć ruchowych z nauką (gry terenowe, zabawy z orientacją przestrzenną, pomiar czasu itp.) - gra w szachy Zadanie 2 - zajęcia grupowe z języka angielskiego z użyciem nowych technik eksperymentalnych , aktywizujących i komunikacyjnych. Zadanie nr 3 - zajęcia grupowe z doradztwa edukacyjno-zawodowego. Celem zajęć był rozwój samopoznania uczestników, ocena własnych zdolności i możliwości, a także pomoc w wyborze szkoły i zawodu. Zadanie nr 4 - doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli Zadanie 5 - wyposażenie międzyszkolnej pracowni matematycznej Zadanie 6

							-wsparcie w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów - spartakiada Projekt został zakończony w 2018r.
29	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski / Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	„Nowoczesne nauczanie przyszłością edukacji”	B 2019- 2020	Zakres rzeczowy Zakres rzeczowy: W ramach projektu zaplanowano wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkole, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej. Projekt przewiduje także kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń.	Ilość osób uczestniczących w projekcie – 100		W 2017r. aplikowano o środki z Europejskiego Funduszu Spójności z działania 8.3.2. Projekt nie przeszedł oceny formalnej i wstrzymano się z jego realizacją. Z uwagi na pojawienie się możliwości wzięcia udziału w nowym konkursie na dofinansowanie wprowadzono zmiany do projektu w zakresie nazwy, budżetu projektu i zakresu rzeczowego i w 2018r. ponownie nieskutecznie aplikowano o środki zewnętrzne z działania 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK . Planuje się aplikować jeszcze raz o środki w 2019r. i realizować projekt.
30	Niepubliczny Żłobek i Przedszkole „Pajacyk” s.c.	Stworzenie warunków do lepszego rozwoju dzieci uczęszczających do Niepublicznego Żłobka i Przedszkola „Pajacyk”	B 2016 - 2020	Zakres realizowanych zadań: Projekt przewiduje zwiększenie intensywności i różnorodności oferty zajęć dodatkowych, np. zajęć gimnastycznych, relaksacyjnych, muzycznych, tanecznych, logopedycznych, terapeutycznych, pracy z psychologiem, teatralnych, wycieczek w ciekawe miejsca, plastycznych, naukowych, językowych itp. Zaprojektowania, przystosowania i wyposażenia pomieszczeń na których przebywają dzieci w pomoce dydaktyczne, naukowe, meble, meblościanki, zabawki rozwijające funkcje poznawcze, społeczne i rozwijające talenty, tablice lub ekrany multimedialne, kąciki relaksacyjne, sprzęt gimnastyczny itp. Zaprojektowanie i wykonanie ogrodu połączonego z edukacyjno – relaksacyjnym placem zabaw Organizacja wspólnych imprez, festynów i pikników rodzinnych dla dzieci i ich opiekunów oraz dziadków i babci, które sprzyjać będą integracji środowiska i	Liczba osób uczestniczących w projekcie – 25	0	Projekt w fazie planowania, koncepcji i przygotowania merytorycznego. Planowane aplikowanie o środki z EFS w 2019r.

31	Niepubliczny Żłobek i Przedszkole „Pajacyk” s.c.	Rozbudowa i adaptacja budynku oraz przebudowa placu zabaw i ogrodu Niepublicznego Żłobka i Przedszkola „Pajacyk	B 2016-2020	<p>budowaniu pozytywnych relacji z otoczeniem</p> <p>Zakres realizowanych zadań: Projekt polega na adaptacji i remoncie istniejących pomieszczeń budynku Niepublicznego Żłobka i Przedszkola „Pajacyk” oraz rozbudowie budynku o dodatkowy moduł, w którym to znajdują się sala gimnastyczna, przynajmniej jedna dodatkowa grupa dziecięca oraz inne potrzebne do realizacji zamierzonych celów pomieszczenia. Remont i adaptacja budynku polegać będzie na renowacji dachu, kuchni i innych pomieszczeń w których przechowywana lub przetwarzana jest żywność, biur, łazienek, korytarzy, grup dziecięcych, pomieszczeń gospodarczych. Planowane działania dotyczą również, instalacji poprawiającej bezpieczeństwo, termomodernizacji budynku, wyposażenia go w urządzenia do alternatywnego wytwarzania energii. Projekt zakłada remont dróg wewnętrznych, parkingów, chodników i terenów zielonych oraz placu zabaw i ogrodu. Wraz z rozwojem żłobka i przedszkola zwiększyła się, a docelowo zwiększy się jeszcze bardziej, liczba dzieci stale uczęszczających do placówki, stąd też powiększenia wymagają pomieszczenia gospodarcze, kuchnie, zmywalnie, obieralnie, magazynki żywności, szatnie, biura itp.</p>	Liczba miejsc żłobkowych i / lub przedszkolnych – 12 Liczba wybudowanych/ zmodernizowanych obiektów – 1 szt.	0	Projekt w fazie koncepcyjnej. Planowane aplikowanie w 2019r. ze środków RPO WŚ na lata 2014-2020.
32	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach	Utworzenie ścieżki edukacyjno-sportowej poprzez modernizację boiska sportowego, zakup urządzeń zabawowych, doposażenie klasopracowni matematycznej i przyrodniczej oraz zlikwidowanie bariery architektonicznej dla osób niepełnosprawnych przy głównym wejściu budynku szkoły w Częstocicach	C 2017-2018	<p>Zakres realizowanych zadań:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modernizacja boiska szkolnego: wymiana nawierzchni z asfaltowej na nawierzchnię bezurazową, montaż elementów do gry w piłkę nożną, siatkowa i ręczną, - wyposażenie placu szkolnego w urządzenia zabawowe dla dzieci, zjeżdżalnie, huśtawki, bujaczki, urządzenia równoważne, piaskownicę, Likwidacja barier architektonicznych - wyposażenie sal lekcyjnych 	Liczba przebudowanych obiektów rekreacyjno-sportowych – 1 szt. Liczba osób korzystających z nowej infrastruktury – 600 osób	1	<p>Złożono wnioski w ramach RPO WŚ, Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. W 2018r. wykonano boisko sportowe, plac zabaw, oraz zagospodarowano teren wokół budynku szkoły.</p> <p>Projekt został zrealizowany i rozliczony w 2018r.</p>
33	Stowarzyszenie	Edukacja szansą na lepszą	C	Zakres realizowanych zadań:	Liczba uczniów którzy	30	Aplikowano o środki zewnętrzne z EFS w

	na Rzecz Szkoły w Częstocicach	przyszłość	2016-2017	<ul style="list-style-type: none"> - dodatkowe zajęcia z języka angielskiego i informatyki - dodatkowe zajęcia z pedagogiem - zakup tablicy multimedialnej - zakup pomocy dydaktycznych - wycieczka edukacyjna 	nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu – 30		ramach działania 8. 3.2. Kwota uzyskanego dofinansowania 58 787,50 zł. Projekt zrealizowany i rozliczony w 2017r.
34	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski / Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	Sięgamy po sukces	D 2017-2019	<p>Zakres realizowanych zadań:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwiększenie kompetencji matematycznych, - poprawa porozumiewania się w języku obcym, również u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, - utworzenie kół zainteresowań - zakup nowoczesnej bazy dydaktycznej, - wycieczki edukacyjne - zwiększenie kompetencji zawodowych u nauczycieli 	Ilość osób uczestniczących w projekcie – 120	0	Aplikowano o środki z Europejskiego Funduszu Spójności z działania 8.3.2. Projekt nie przeszedł oceny formalnej. Odstąpiono od realizacji w 2017r.
35	Fundacja Szkoła bez Barier	Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią trawiastą i poliuretanową wraz z ogrodzeniem i oświetleniem przy Zespole Edukacyjnym „Dwunastka”	F 2017-2018	<p>Zakres realizowanych zadań:</p> <p>Projekt przewiduje budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem (trawiastego do gry w piłkę nożną oraz z nawierzchnią syntetyczną do gry w piłkę ręczną, siatkówkę, koszykówkę) oraz:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rewitalizację zdewastowanego terenu boiska - powstanie szkolnego klubu sportowego, oraz pozaszkolnych młodzieżowych zespołów sportowych - prowadzenie dwóch dodatkowych pozalekcyjnych zajęć sportowych tygodniowo - przeprowadzenie corocznej imprezy sportowo-rekreacyjnej - integrację z innymi osiedlami poprzez organizowanie wspólnych rozgrywek sportowych. 	Liczba wybudowanych obiektów sportowo-rekreacyjnych – 1 szt.	0	Nie aplikowano o środki zewnętrzne. Ze względu na brak środków na wkład własny odstąpiono od realizacji zadania w 2017r.
36	Fundacja Szkoła bez Barier	Utworzenie pracowni do nauki języków dla uczniów Zespołu Edukacyjnego „Dwunastka”	F 2017	<p>Zakres realizowanych zadań:</p> <p>W ramach projektu stworzona zostanie pracownia językowa oraz zorganizowane zostaną zajęcia dodatkowe z języka angielskiego i niemieckiego. Ponadto powstanie nowoczesna pracownia językowa z 20 stanowiskami komputerowymi, tablicą interaktywną. W ramach współpracy z Partnerem na zajęciach dodatkowych opracowana zostanie przez uczniów broszura informacyjna na temat Muzeum Historyczno-Archeologicznego ”Krzemionki” w języku polskim, angielskim i niemieckim.</p>	Liczba osób uczestnicząca w projekcie – 30	0	Nie aplikowano o środki zewnętrzne. Ze względu na brak środków na wkład własny Odstąpiono od realizacji zadania.



37	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	Termomodernizacja budynków mieszkalnych	A 2020-2023	Zakres realizowanych zadań: - docieplenie ścian, stropu, dachu, piwnic - wymiana stolarki okiennej, drzwiowe - wymiana oświetlenia w częściach wspólnych budynku na energooszczędne - wymiana elementów metalowych, remont daszków, kominów	Liczba budynków wielorodzinnych poddanych termomodernizacji – 2 szt	0	Projekt zaplanowany do realizacji w późniejszym okresie.
38	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Krzemionki" w Ostrowcu Św.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych wraz z wymianą pokrycia dachowego.	B 2016-2023	Zakres realizowanych zadań: - ocieplenie budynku - wymiana okien, drzwi zewnętrznych i oświetlenia w częściach wspólnych budynku - instalacja OZE, wymiana pokrycia dachowego	Liczba budynków wielorodzinnych poddanych termomodernizacji – 3 szt.	0	Aplikowano o środki z 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Projekt nie uzyskał dofinansowania. W 2018r. rozpoczęto częściowy remont budynków w ramach własnych środków. Wykonano częściowe prace termomodernizacyjne i dociepleniowe na pięciu budynkach. Nie aplikowano o środki zewnętrzne. Poddano termomodernizacji jeden z budynków w 2017r. Inwestycja została wykonana ze środków własnych. Termin planowanych do termomodernizacji w 2018r. 3 budynków przesunął się na 2019r.
39	Zarządzenie i Administrowanie Nieruchomościami "TWÓJ DOM" Sp. z o.o.	Termomodernizacja budynków Wspólnot Mieszkaniowych	A 2017-2023	Zakres realizowanych zadań: Izolacja fundamentów, docieplenie ścian, docieplenie stropu, remont dachów, remont instalacji centralnego ogrzewania oraz wod.- kan.	Liczba budynków wielorodzinnych poddanych termomodernizacji – 13 szt.	1	Nie aplikowano o środki zewnętrzne. Poddano termomodernizacji jeden z budynków w 2017r. Inwestycja została wykonana ze środków własnych. Termin planowanych do termomodernizacji w 2018r. 3 budynków przesunął się na 2019r.
40	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE – Urząd Miasta, Kino Etiuda, Środowiskowy Dom Samopomocy "Przystań", Ośrodek Interwencji Kryzysowej	AD 2014-2021	Zakres realizowanych zadań: - opracowanie dokumentacji projektowej - docieplenie ścian, stropu, dachu, piwnic - wymiana stolarki okiennej, drzwiowej - wymiana elementów metalowych, remont daszków, kominów - wymiana rynien i rur spustowych - modernizacja instalacji c.w.u, c.o., wentylacji - montaż kolektorów słonecznych - wymiana oświetlenia na energooszczędne	Liczba obiektów użyteczności publicznej poddanych termomodernizacji – 4 szt.	0	Aplikowano o środki zewnętrzne w ramach RPO WŚ w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym. W 2019r. planowane jest podpisanie pre-umowy. Zadanie polegające na termomodernizacji budynku połączone jest z projektem realizowanym w ramach działania 6.5, Modernizacja obiektów kultury – przebudowa budynku Kina Etiuda oraz adaptacja pomieszczeń na Centrum



							Tradycji Hutnictwa. Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji i uzyskaniem niezbędnych do rozpoczęcia prac budowlanych dokumentów.
41	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Krzemionki" w Ostrowcu Św.	Termomodernizacja oraz remont Społecznego Domu Kultury „Malwa” w Ostrowcu Św.	B 2016- 2023	Zakres realizowanych zadań: ocieplenie budynku wymiana okien, drzwi zewnętrznych i oświetlenia w budynku, instalacja OZE- instalacja oświetlenia awaryjnego, wykonanie instalacji ciepłej wody i cyrkulacji wraz z podłączeniem do sieci miejskiej, remont łazienek, wymiana pokrycia dachowego, remont schodów zewnętrznych.	Liczba budynków poddanych termomodernizacji – 1 szt.	0	Nie podjęto żadnych działań w celu realizacji zadań. Nie planuje się realizacji projektu w 2019r.
42	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski / Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o.	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim	ABCDEF 2016- 2021	Zakres realizowanych zadań: - zakup ekologicznych autobusów na potrzeby miejskiej komunikacji publicznej - modernizacja przystanków i zatok autobusowych na terenie miasta, - wdrożenie systemu zarządzania transportem miejskim - utworzenie Park & Ride	Liczba zakupionego taboru – 6 szt. Liczba systemów komunikacji publicznej – 1 kpl.	0	W dniu 29 grudnia 2017 roku został złożony w ramach działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wniosek o dofinansowanie „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim w kwocie całkowitej inwestycji 25 296 060,70- zł, kwota dofinansowania 17 248 598,32 zł . Pre-umowa została zawarta 03.08.2018r. Trwają prace nad przygotowaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego na podstawie którego pozyskuje się niezbędne dokumenty pozwalające rozpocząć prace budowlane.

Spis tabel:

Tabela 1. Ilość realizowanych projektów wpisanych na listy przedsięwzięć Programu Rewitalizacji z podziałem na obszary oraz na projekty zakończone, realizowane, planowane i od których odstąpiono od realizacji	5
Tabela 2. Stan realizacji projektu pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego” realizowanego przez Partnerów: Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, Ostrowiecką Spółdzielnię Mieszkaniową i Spółdzielnię Mieszkaniową Krzemionki	11
Tabela 3. Wartości wskaźnika dla badanych kryteriów.....	17
Tabela 4. Lista podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz z osiągniętymi wskaźnikami produktu i stopniem realizacji projektu.....	18
Tabela 5. Lista podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz z osiągniętymi wskaźnikami produktu i stopniem realizacji projektu.....	34

Spis wykresów:

Wykres 1. Ilość realizowanych projektów rewitalizacyjnych z podziałem na projekty zakończone, realizowane, planowane i odstąpione od realizacji.....	6
Wykres 2. Liczba mieszkańców na obszarze rewitalizacji.....	13
Wykres 3. Liczba osób długotrwale bezrobotnych zamieszkujących obszar rewitalizacji	14
Wykres 4. Liczba osób z obszarów rewitalizacji korzystających z pomocy społecznej	15
Wykres 5. Wyk.5. Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą na obszarach rewitalizacji (zarejestrowana w CEDG)	15
Wykres 6. Wartości monitorowanych wskaźników w latach 2015-2018	16

Spis rysunków:

Rysunek 1. Mapa obszarów zrewitalizowanych i zdegradowanych.....	3
--	---

Sprawozdanie sporządziła: Małgorzata Rdzanek - inspektor Wydziału Planowania i Rozwoju Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Sprawdził: Domini Smoliński - Wiceprezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Opinia Komitetu Monitorującego Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023

1) Pozytywnie bez zastrzeżeń;

2) Pozytywnie z jednoczesnym uwzględnieniem uwag;

3) Negatywnie.
