



**Sprawozdanie za 2021 rok z postępu realizacji
Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
na lata 2016-2023**

Ostrowiec Świętokrzyski, marzec 2022 r.

Spis treści:

I.	Wstęp	3
II.	Sposób i zakres monitorowania Programu	5
1.	Stopień realizacji projektów i założonych celów Programu Rewitalizacji	6
2.	Zakres i przedmiot zmian w projektach Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016 -2023	7
III.	Źródła finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych	8
IV.	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	9
V.	Wskaźniki postępu wdrażania Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023	12
VI.	Wskaźniki społeczno-gospodarcze rewitalizowanego obszaru	13
1.	Badane kryteria (wskaźniki rezultatu)	15
VII.	Podsumowanie	18

I. Wstęp

W 2016 r. Uchwałą Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego nr XL/140/2016 z dnia 28.12.2016 r. został przyjęty Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023. Dokument został opracowany w oparciu o nowe podejście do procesu odnowy obszarów miejskich, zaprezentowane w rządowych „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020”. Przygotowana została diagnoza całego miasta w oparciu o podziały urbanistyczne, bazujące na utrwalonych związkach przestrzennych, funkcjonalnych i społeczno-ekonomicznych jakimi są osiedla. Diagnoza zawiera szczegółową analizę problemów społecznych oraz gospodarczych, technicznych, przestrzenno-funkcjonalnych i środowiskowych. Na jej podstawie zostały wyznaczone obszary zdegradowane, a spośród nich obszar rewitalizacji (składający się z 6 podobszarów) obejmujący (zgodnie z wytycznymi) nie więcej niż 20% powierzchni miasta (664,730 ha) i zamieszkały przez nie więcej niż 30% mieszkańców (16 622 mieszkańców) - Rys.1.

W 2019 r. Uchwałą Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego nr IX/18/2019 z dnia 21 lutego 2019 r. została wprowadzona zmiana do Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023 polegająca wpisaniu na listę przedsięwzięć rewitalizacyjnych nowego projektu, jak również wpisaniu nowego zadania planowanego do realizacji przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski.

W grudniu 2019 r. Uchwałą Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego nr XXV/153/2019 z dnia 9 grudnia 2019 r. została przyjęta aktualizacja Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023, mająca na celu dostosowanie treści projektów i przedsięwzięć do obecnie istniejących uwarunkowań realizacyjnych. Ponadto pojawiły się także pomysły na nowe projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne (aktywizacja nowych partnerów, nowe możliwości realizacyjne, związane z funduszami zewnętrznymi).

Główny zakres zmian w trakcie aktualizacji obejmował:


- aktualizację treści powiązań Programu Rewitalizacji ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego, Gminnym Programem Opieki nad Zabytkami,
- zmianę nazwy Osiedla XXV-lecia PRL na Osiedle Spółdzielców oraz ul. S. Brody na E. Kwiatkowskiego,
- aktualizację liczby ludności obszaru zdegradowanego (wg. stanu na maj 2019 wynosiła ona 35 231 osób, co stanowiło 53,24% mieszkańców miasta),
- aktualizację liczby ludności obszaru rewitalizacji oraz poszczególnych jego podobszarów (wg. stanu na maj 2019 wynosiła ona 15 373 osób, co stanowiło 23,23% mieszkańców miasta),
- aktualizację listy projektów i przedsięwzięć podstawowych oraz pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych a także związane z nimi informacje dotyczące planowanych nakładów finansowych na ich realizację.



Rys.1. Mapa obszarów zrewitalizowanych i zdegradowanych.

LEGENDA

- granica administracyjna miasta
- granice osiedli
- obszary wskazane do rewitalizacji
- obszary zdegradowane

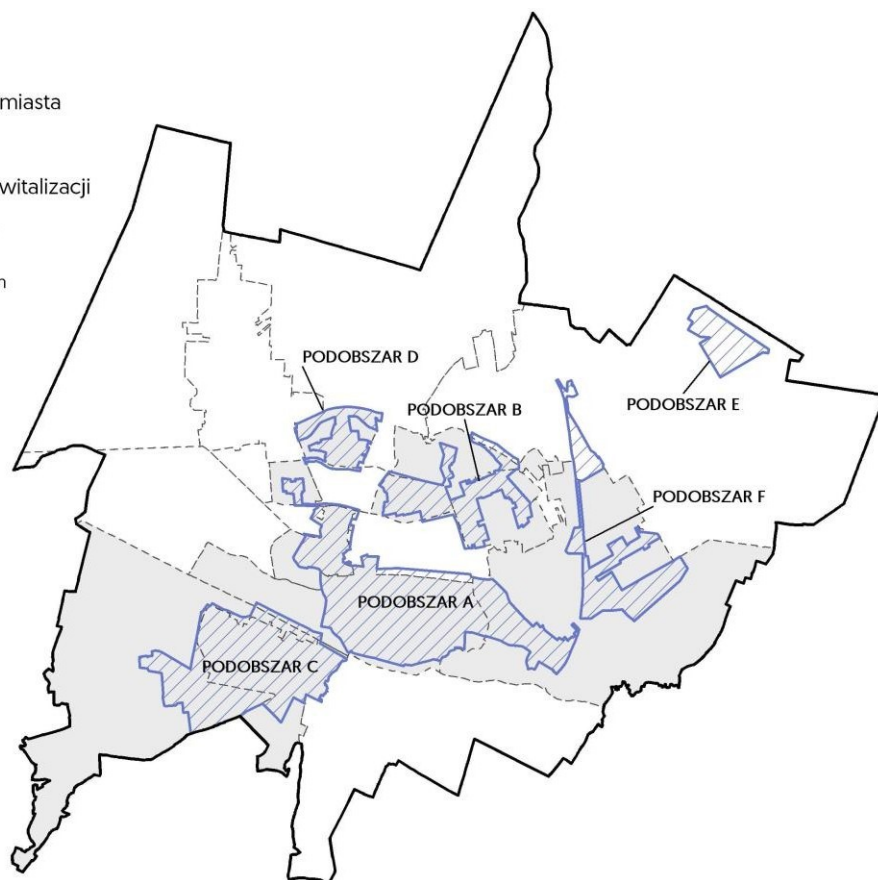

Źródło: opracowanie własne

II. Sposób i zakres monitorowania Programu.

Podstawowym narzędziem służącym monitorowaniu Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023 są coroczne sprawozdania monitorujące przebieg realizacji Programu. Projekt rocznego sprawozdania przygotowujemy w oparciu o dane i informacje, które przekazywane są przez podmioty realizujące projekty rewitalizacyjne wpisane do Programu, a także podmioty takie jak: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy, Urząd Miasta, które są źródłem danych umożliwiających zbadanie wskaźników społeczno-gospodarczych. Wyrażone w postaci liczbowej wskaźniki obrazują w sposób syntetyczny sytuację społeczno – gospodarczą rewitalizowanego terenu, a także skuteczność realizacji Programu. Pozyskane z kolei od podmiotów informacje o postępie wdrażania projektów pozwalają:

1) dla projektów planowanych do realizacji i realizowanych:

- przedstawić stopień zaawansowania realizowanych zadań,

2) dla projektów zakończonych:

- wykazać osiągnięte wartości wskaźników produktu rezultatu,
- wykazać istotne zmiany wpływające na charakter projektu, jego cele, lub inne ważne warunki wdrażania, które mogłyby wpłynąć na zmianę jego celów.

Program Rewitalizacji obejmuje dwie listy projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych, których postęp monitoruje się poprzez coroczne sprawozdania:

- listę podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych obejmujących projekty, które zlokalizowane są na obszarze rewitalizacji oraz wykazują silną zbieżność z celami i kierunkami działań rewitalizacji. Ponadto lista podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych zawiera projekty, które wykazują zbieżność z zakresem wsparcia przewidzianym dla Działania 6.5. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (Priorytet Inwestycyjny 9b) i w zakresie projektów infrastrukturalnych w większości nie mogłyby być realizowane w ramach innych Priorytetów Inwestycyjnych. Celem szczegółowym tego działania jest wzmocnienie rozwoju społeczno-gospodarczego, fizycznego i przestrzennego obszarów miejskich, w tym przemysłowych,
- listę pozostałych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych obejmujących projekty i zadania, które wpisują się w cele i kierunki rewitalizacji zdefiniowane w Programie i uzupełniają podstawowe działania rewitalizacyjne.

Wszystkie działania są istotne z punktu widzenia osiągnięcia założonych celów rewitalizacji. Po przeprowadzonej w 2019 roku aktualizacji na liście projektów podstawowych znajduje się 35 projektów, zaś na liście projektów pozostałych 43 projekty złożone przez 29 podmiotów.

1. Stopień realizacji projektów i założonych celów Programu Rewitalizacji.

W 28,21 % projekty znajdują się w trakcie realizacji, dla 2,56 % projektów realizacja przewidziana jest w roku 2022, 23,08 % projektów planowane jest do realizacji w terminie późniejszym, czyli w końcowej fazie trwania Programu Rewitalizacji, natomiast odstąpiono od realizacji 7,69 % projektów. Na koniec 2021 roku 38,46 % projektów zostało zakończonych.


Na podstawie przesłanych przez 18 beneficjentów 37 kart monitorujących postęp realizacji przedsięwzięcia oraz w oparciu o informacje Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego dotyczące projektów Gminy i jej jednostek, opracowano sprawozdanie z realizacji projektów wpisanych do Programu Rewitalizacji. Poniższa Tab.1 i Wyk.1 pokazują ilości projektów w różnych fazach ich realizacji.

Tab.1. Ilość realizowanych projektów wpisanych na listy przedsięwzięć Programu Rewitalizacji z podziałem na obszary oraz na projekty zakończone, realizowane, planowane i projekty od realizacji których odstąpiono.

Obszar	liczba projektów	Liczba projektów z listy pozostałych	Liczba projektów z listy podstawowych	Projekty zakończone	Projekty w trakcie realizacji	Projekty planowane do realizacji w 2022r.	Projekty planowane do realizacji po 2022r.	Projekty od których odstąpiono
Podobszar A	24	15	9	11	7	0	6	0
Podobszar B	15	11	4	4	0	0	7	4
Podobszar C	15	6	9	6	5	0	3	1
Podobszar D	1	0	1	0	0	1	0	0
Podobszar E	1	0	1	1	0	0	0	0
Podobszar F	2	1	1	2	0	0	0	0
Podobszar AB	2	2	0	0	1	0	1	0
Podobszar ABCD	9	3	6	4	4	0	0	1
Podobszar ABCDEF	2	2	0	0	2	0	0	0
Podobszar ABD	1	1	0	1	0	0	0	0
Podobszar AC	1	0	1	0	1	0	0	0
Podobszar BD	1	1	0	0	1	0	0	0
Podobszar CD	1	0	1	0	0	0	1	0
Podobszar EF	1	1	0	0	1	0	0	0
Poza obszarem	2	0	2	1	0	1	0	0
Suma	78	43	35	30	22	2	18	6

Źródło: opracowanie własne.

Wyk.1. Ilość realizowanych projektów rewitalizacyjnych z podziałem na projekty zakończone, realizowane, planowane i odstąpione od realizacji.

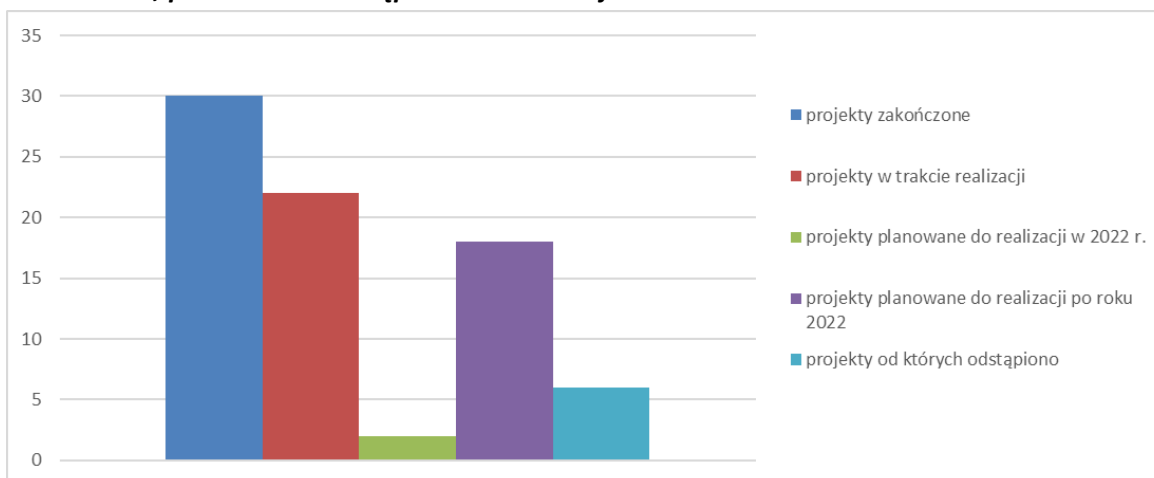

Źródło: opracowanie własne.

W 2021 roku odstąpiono od realizacji 3 zgłoszonych do Programu Rewitalizacji projektów („Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar rewitalizowany” – projekt zgłoszony przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o., „Stworzenie warunków do lepszego rozwoju dzieci uczęszczających do Niepublicznego Żłobka i Przedszkola „Pajacyk”” oraz „Rozbudowa i adaptacja budynku oraz przebudowa placu zabaw i ogrodu Niepublicznego Żłobka i Przedszkola „Pajacyk”” – projekty zgłoszone przez Niepubliczny Żłobek i Przedszkole „Pajacyk” s.c.).

Jak widać na powyższym wykresie, poza projektami których realizacja już się rozpoczęła we wcześniejszym okresie, większość pozostałych projektów zakładana jest do realizacji przez beneficjentów w końcowym okresie obowiązywania Programu Rewitalizacji, czyli po roku 2022. Fakt ten wynika bezpośrednio z założonego przez beneficjentów potencjalnego źródła dofinansowania, którym w przeważającej części są środki pochodzące z programów współfinansowanych przez Unię Europejską, dostępne w perspektywie finansowej na lata 2021-2027.

2. Zakres i przedmiot zmian w projektach Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023.

W grudniu 2019 r przeprowadzono aktualizację Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023, w trakcie której zostało zaktualizowane 51 projektów oraz wprowadzono 11 nowych projektów. W 2021 roku w stosunku do roku 2020 zmianie (uaktualnieniu) uległy terminy realizacji poszczególnych projektów oraz planowane przez beneficjentów źródła ich finansowania. Dodatkowo jeden z beneficjentów - Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. z końcem 2021 roku zaprzestała działalności. Zadania byłej spółki gminnej będzie realizować nowoutworzona jednostka organizacyjna Gminy - Centrum Rozwoju Lokalnego.

III. Źródła finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Zabezpieczenie finansowe działań związanych z realizacją Programu Rewitalizacji stanowią przede wszystkim środki budżetowe gminy i beneficjentów oraz środki zewnętrzne pochodzące m.in. z Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Spójności). Ponadto zadania realizowane są lub będą ze środków budżetu państwa, budżetu samorządu powiatowego, innych środków publicznych, środków prywatnych oraz środków organizacji pozarządowych. Jako dodatkowe źródło środków zewnętrznych w 2020 r. zostały wskazane środki pochodzące z Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego - rezerwy Centrum Edukacji Artystycznej, natomiast w 2021 roku dołączyły środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.


Ponadto beneficjenci jako potencjalne źródło finansowania projektów wskazali możliwość zaciągnięcia kredytów lub pożyczek. Strukturę planowanych źródeł finansowania przedstawia Tab. 2 oraz Wyk.2

Tab. 2 Planowane przez beneficjentów źródła finansowania dla projektów

	Środki UE	Środki JST	Środki Budżetu Państwa	Kredyty	Pożyczki	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Środki Prywatne	Inne środki publiczne
Ilość projektów	73	48	46	22	20	2	35	23

Źródło: opracowanie własne.

Wyk.2 Planowane przez beneficjentów źródła finansowania dla projektów

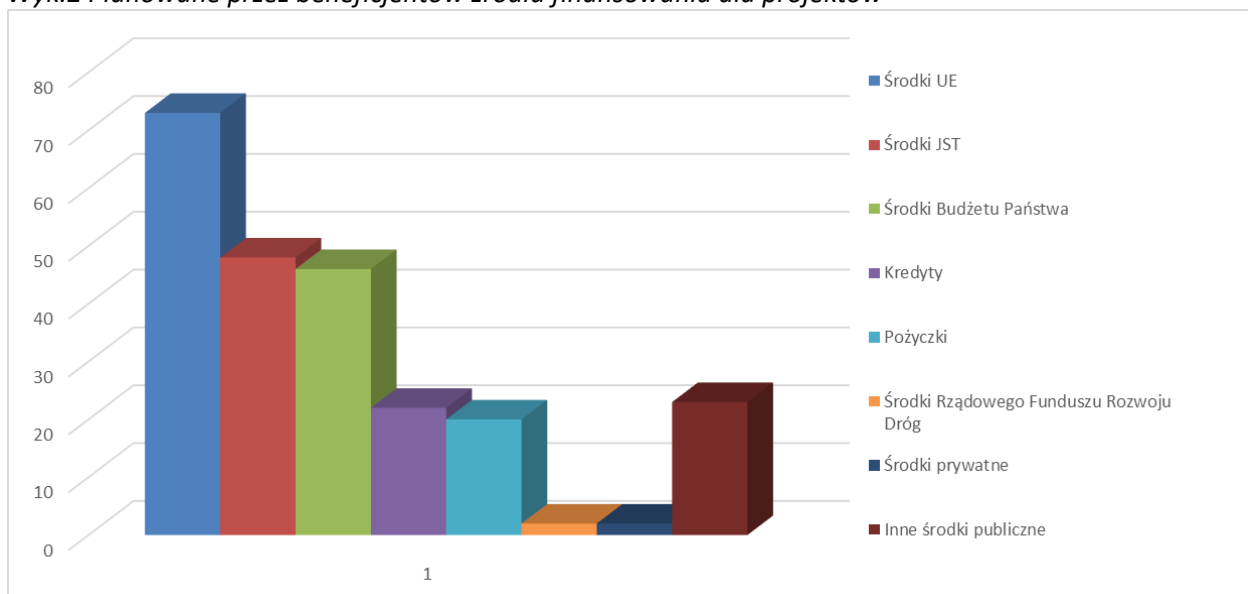

Źródło: opracowanie własne.

Jak widać z powyższych danych beneficjenci jako źródło finansowania wskazują jednocześnie więcej niż jedną możliwość pozyskania środków finansowych, głównie opierając się na środkach pomocowych pochodzących z różnego rodzaju programów operacyjnych współfinansowanych przez Unię Europejską, środków JST oraz pochodzących z budżetu państwa.

IV. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie rozwoju społeczno-gospodarczego, fizycznego i przestrzennego obszarów miejskich, w tym przemysłowych i wsparcie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Aby osiągnąć założone cele, przewidziano realizację projektu złożonego z działań stanowiących interwencję w sferach: społecznej, gospodarczej, przestrzenno-środowiskowej i technicznej zmierzającego do kompleksowej poprawy jakości życia mieszkańców oraz osiągnięcia długotrwałych i wymiernych korzyści społeczno-gospodarczych. Projekt jest realizowany wspólnie z partnerami – Spółdzielnią Mieszkaniową „Krzemionki” oraz Ostrowiecką Spółdzielnią Mieszkaniową od 2016 roku. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” zakończyła realizację swojego zadania w 2019 roku, natomiast Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w 2020 roku.

Tab.3. Stan realizacji projektu pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno- kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego” realizowanego przez Partnerów: Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, Ostrowiecką Spółdzielnię Mieszkaniową i Spółdzielnię Mieszkaniową „Krzemionki” .

Lp.	Nazwa zadania	Stan realizacji zadania do końca 2021r.
1.	Budowa drogi łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi	W ramach zadania wykonany został alternatywny dojazd do Targowiska Miejskiego od ulicy Chrzanowskiego. Jest on częścią projektu budowy układu komunikacyjnego łączącego ul. Furmańską i ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi od ul. Kilińskiego i ul. Denkowskiej (odcinek zrealizowany ze środków FDS w 2021 r.). Zadanie obejmuje budowę jezdni, chodników, ścieżki rowerowej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, miejsc postojowych, przebudowę skrzyżowań oraz urządzenie zieleni. Budowa drogi udrożniła zakorkowane uliczki okalające plac targowy, które nie są przystosowane do zwiększonego natężenia ruchu w dni targowe oraz pozwoliła na łatwiejszy i szybszy dostęp do terenów, na których odbywa się handel. Roboty budowlane rozpoczęto w 2020 roku. Zakończenie inwestycji - luty 2022 roku.
2.	Przebudowa ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego	Zadanie obejmuje odcinek o długości 1,014 km z chodnikami, wykonanie nawierzchni jezdni, przebudowę skrzyżowania, roboty wodno-kanalizacyjne, urządzenie zieleni, energooszczędne oświetlenie. Dzięki realizacji tej inwestycji poprawi się dojazd do terenów przemysłowych. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano na 2022 rok. Zakończenie planowane jest na początek 2023 roku.
3.	Zagospodarowanie części dziedzińca browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych	Zadanie polega na kompleksowym zagospodarowaniu części dziedzińca przebudowanego browaru poprzez: wykonanie parkingów, dróg dojazdowych, odwodnienia i oświetlenia terenu, modernizację budynku i wykorzystanie go na potrzeby mieszkańców i rad osiedlowych z terenu Śródmieścia oraz okolicznych osiedli. Wykonano niezbędne rozbiórki, parking oraz modernizację budynku. W roku 2021 trwały prace projektowe z uwagi na zmianę koncepcji zagospodarowania części dziedzińca browaru. Roboty budowlane na pozostały zakres zadania zostały przewidziane na rok 2022.

4.	Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej Zagospodarowanie terenu	W ramach zadania modernizowany jest budynek wielorodzinny zlokalizowany przy ul. Osadowej 6. Inwestycja obejmuje termomodernizację i modernizację elewacji, remont instalacji wewnętrznych i dachu. Lokale w zmodernizowanym budynku powiększą gminne zasoby mieszkań socjalnych. Roboty budowlane rozpoczęły się w 2020 r. Zakończyła się część obejmująca rozbiórki oraz zagospodarowanie terenu. Zakończenie pozostałej części zadania zaplanowano na 2022 r.
5.	Rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu	Zadanie zostało zakończone w roku 2020.
6.	Budowa zadaszenia części placu targowego wraz z zagospodarowaniem	Zadanie zostało zakończone w roku 2021.
7.	Budowa strefy rekreacji i wypoczynku	Zadanie zostało zakończone w roku 2019.
8.	Modernizacja obiektów kultury – przebudowa budynku Kina Etiuda oraz CTH	Zadanie obejmuje przebudowę budynku Kina Etiuda oraz utworzenie Centrum Tradycji Hutnictwa. W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa obiektu z podzieleniem go na połączone ze sobą części: część kinową i część związaną z ekspozycjami i wystawami Centrum Tradycji Hutnictwa. W obiekcie znajdzie się także „Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności – SOWA”, utworzona we współpracy z Centrum Nauki Kopernik. Realizację robót budowlanych rozpoczęto w 2020 r. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2022 rok
9.	Ogród Zdrowia na Osiedlu Ogrody	Zadanie zostało zakończone w roku 2021.
10.	OSM - Rewitalizacja Parku na Osiedlu Spółdzielców	Zadanie zostało zakończone w roku 2020.
11.	SM Krzemionki - place zabaw, siłownie	Zadanie zostało zakończone w roku 2019.

V. Wskaźniki postępu wdrażania Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023.

W 2021 r. do projektów zakończonych w poprzednich latach, dołączyło jedenaście kolejnych zrealizowanych przedsięwzięć:

- a. „Remont dróg gminnych: ul. Siennieńskiej, ul. Okólnej, ul. Jana Głogowskiego, ul. dr Adama Wardyńskiego oraz ul. Piwnej w Ostrowcu Świętokrzyskim” zrealizowane przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski,
- b. „Budowa zadaszenia części placu targowego wraz z zagospodarowaniem” zrealizowane przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski,
- c. „Renowacja i modernizacja Pałacu Wielopolskich w ramach projektu pn.: *Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich*” zrealizowane przez Powiat Ostrowiecki/ Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim,
- d. „Ogród Zdrowia na Osiedlu Ogrody” zrealizowane przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski,
- e. „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych – *Razem Raźniej*” zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim,
- f. „Rozwój i wsparcie przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie Targowisk Miejskich” zrealizowane przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim,
- g. „Gminne Centrum Informacji w Ostrowcu Świętokrzyskim” zrealizowane przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim,
- h. „Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie - *Akcja Aktywizacja*” zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim,
- i. „Ostrowiecka Młodzież – Kreatywna Młodzież” zrealizowane przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim,
- j. „Aktywni seniorzy – aktywna społeczność” zrealizowane przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim,
- k. „Czwórka - szkoła nowych możliwości. Modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim” zrealizowane przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim,

Zakończone w 2021r. zadania stanowią 14,1 % wszystkich zaplanowanych w Programie Rewitalizacji. W sumie przez pięć lat realizacji Programu zakończono 38,46 % wszystkich zadań z listy przedsięwzięć. Sukcesywna realizacja i postęp w zakresie osiągania wskaźników dotyczących bezpośrednio produktów poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, pozwala na stopniowe osiąganie założonych w Programie rezultatów. Cele i założone rezultaty Programu w pełni osiągnięte zostaną po rzeczowej realizacji większości zaplanowanych w Programie działań. Wartości wskaźników produktu osiągnięte do końca 2021 r. w poszczególnych projektach zawiera Tab.5 i Tab.6

VI. Wskaźniki społeczno-gospodarcze rewitalizowanego obszaru

Proces monitorowania programu prowadzony jest jednocześnie na kilku płaszczyznach. Systematycznej obserwacji podlegają również zmiany zachodzące w ramach poszczególnych wskaźników społeczno-gospodarczych. Umożliwia to dostarczenie informacji na temat postępów w osiągnięciu przyjętych celów oraz kwantyfikację efektów zrealizowanych projektów (zarówno ekonomicznych, jak i społecznych). Analiza wskaźnikowa, służy również do odpowiedzi na pytanie o zbieżność podejmowanych działań z osiąganymi wynikami społeczno-gospodarczymi gminy. W Tab.4 ujęto wartości wskaźników z podziałem na badane kryteria, a na Wyk. 7 przedstawiono wartości wskaźników dla badanych roczników.



Tab.4 Wartości wskaźnika dla badanych kryteriów.

Badane kryterium	Nazwa wskaźnika	Źródło pozyskania danych	Jednostka	Wartość wskaźnika w 2015r.	Wartość wskaźnika w 2016r.	Wartość wskaźnika w 2017r.	Wartość wskaźnika w 2018r.	Wartość wskaźnika w 2019r.	Wartość wskaźnika w 2020r.	Wartość wskaźnika w 2021r.
Zmiana lub zahamowanie negatywnego trendu spadku liczby mieszkańców	Liczba mieszkańców	UM	Liczba osób	16 622	16 472	16 088	15 537	15 360	14 760	14407
Zmniejszenie liczby osób długotrwale bezrobotnych	Liczba osób długotrwale bezrobotnych	PUP	Osoby	607	456	364	321	271	305	205
Spadek liczby osób korzystających z pomocy społecznej	Liczba osób korzystających z pomocy społecznej	MOPS	Liczba osób	1772	1825	1622	1573	1673	1312	1524
Wzrost liczby osób prowadzących działalność gospodarczą	Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą	UM	Liczba osób	907	983	1043	1022	1021	1091	1048


Źródło: dane udostępnione przez jednostki organizacyjne Gminy i PUP.

1. Badane kryteria (wskaźniki rezultatu).

Zmiana lub zahamowanie negatywnego trendu spadku liczby mieszkańców.

Liczba ludności na obszarze rewitalizowanym w 2021 r. wyniosła 14 407 mieszkańców. Jest to niższa wartość niż w roku 2020, kiedy to wynosiła 14 760 osób (wyk.3). Nadal zatem mamy do czynienia z negatywnym trendem spadku liczby mieszkańców. Spadek ten obejmuje nie tylko obszar rewitalizowany ale całe miasto. Mimo dalszego spadku liczby mieszkańców na obszarze rewitalizowanym, jako pozytywny aspekt można uznać zmniejszenie tempa tego spadku w stosunku do roku ubiegłego. Miasto zмага się ze zjawiskiem depopulacji z uwagi na niewyhamowane ujemne saldo migracji, niski wskaźnik przyrostu naturalnego oraz starzenie się społeczeństwa. Dodatkowym czynnikiem depopulacyjnym jest trwająca pandemia COVID-19, zbierająca śmiertelne żniwo wśród społeczeństwa jak również powodująca kryzys gospodarczy, sprzyjający emigracji ludności do większych ośrodków w poszukiwaniu pracy.

Wyk. 3. Liczba mieszkańców na obszarze rewitalizacji.

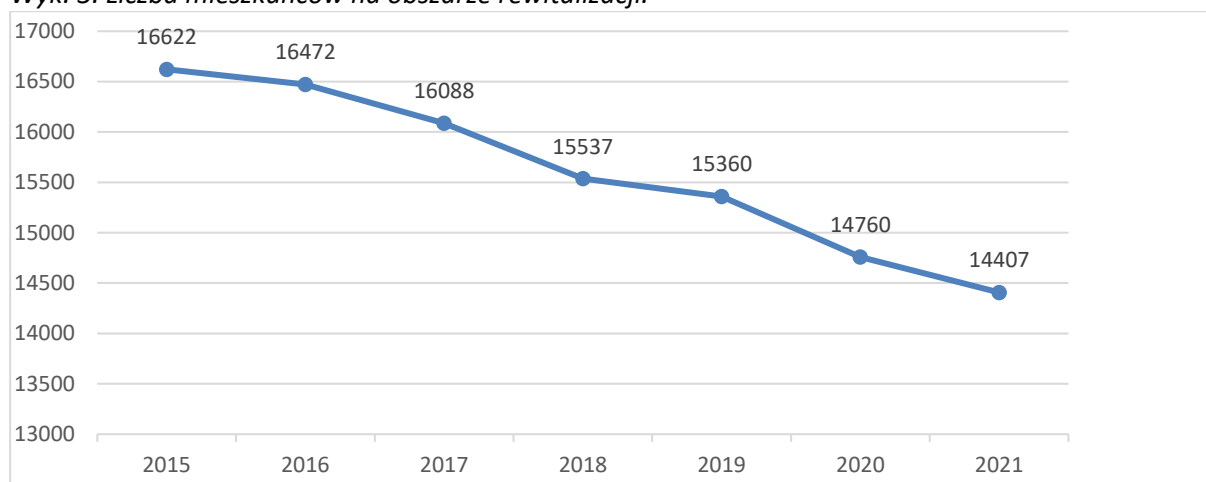


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Zmniejszenie liczby osób długotrwale bezrobotnych

Analiza wskaźnikowa tego kryterium, wskazuje po ubiegłorocznym zachwianiu utrzymującą się poprawę na lokalnym rynku pracy na obszarach rewitalizowanych. Liczba długotrwale bezrobotnych na obszarze rewitalizowanym wynosiła na koniec 2021 r. 205 osób i zmniejszyła się wobec 2020 r. o 100 osób. (wyk.4). Spadek liczby osób długotrwale bezrobotnych wskazuje, iż realizowane w programie projekty z zakresu aktywizacji zawodowej są skuteczne i podtrzymują utrzymujący się trend spadkowy oraz korzystnie wpływają na sukcesywne zmniejszanie się bezrobocia.



Wyk.4. Liczba osób długotrwale bezrobotnych zamieszkujących obszar rewitalizacji.

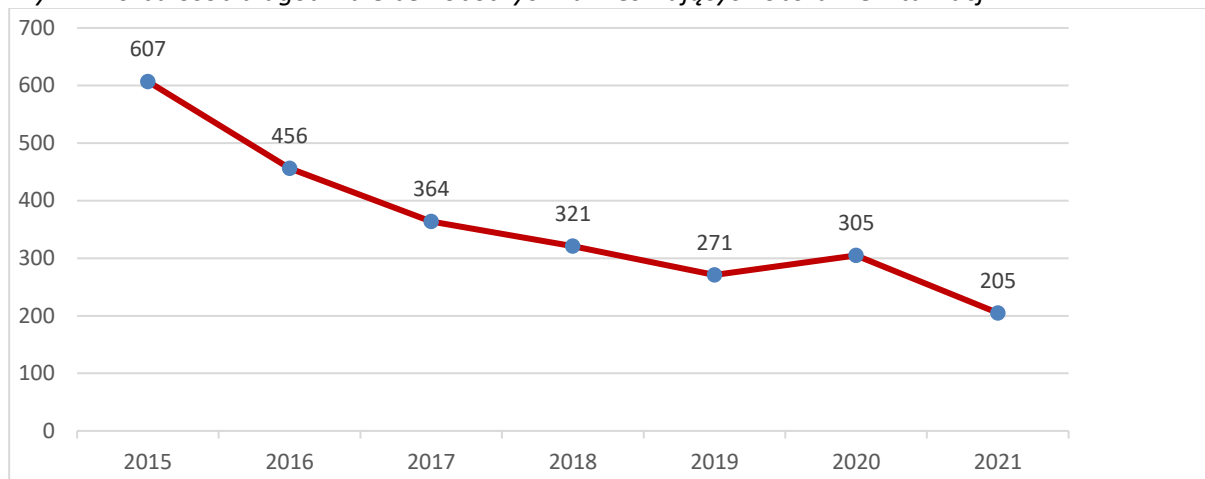


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z PUP w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Spadek liczby osób korzystających z pomocy społecznej

Przeprowadzona w programie rewitalizacji diagnoza ujawniła zjawiska społeczne, wymagające szczególnej uwagi przy planowaniu działań z zakresu pomocy społecznej. Zaliczono do nich ubóstwo. Do programu wpisano zatem szereg zadań zmierzających do ograniczenia tego problemu. Od 2016 r. obserwowany był spadek osób korzystających z usług oferowanych przez MOPS, jednakże w 2019 roku tendencja ta uległa zmianie i nastąpił wzrost liczby osób korzystających z różnych rodzajów świadczeń socjalnych. Powodem takiej sytuacji może być fakt, iż w 2019 roku nastąpił wzrost liczby świadczeniobiorców z zakresu świadczeń rodzinnych i wychowawczych. Po spadku liczby świadczeniobiorców w 2020 r., w 2021 roku obserwujemy ponownie trend wzrostowy liczby osób korzystających z pomocy społecznej.

(wyk.5).

Wyk.5. Liczba osób z obszarów rewitalizacji korzystających z pomocy społecznej.

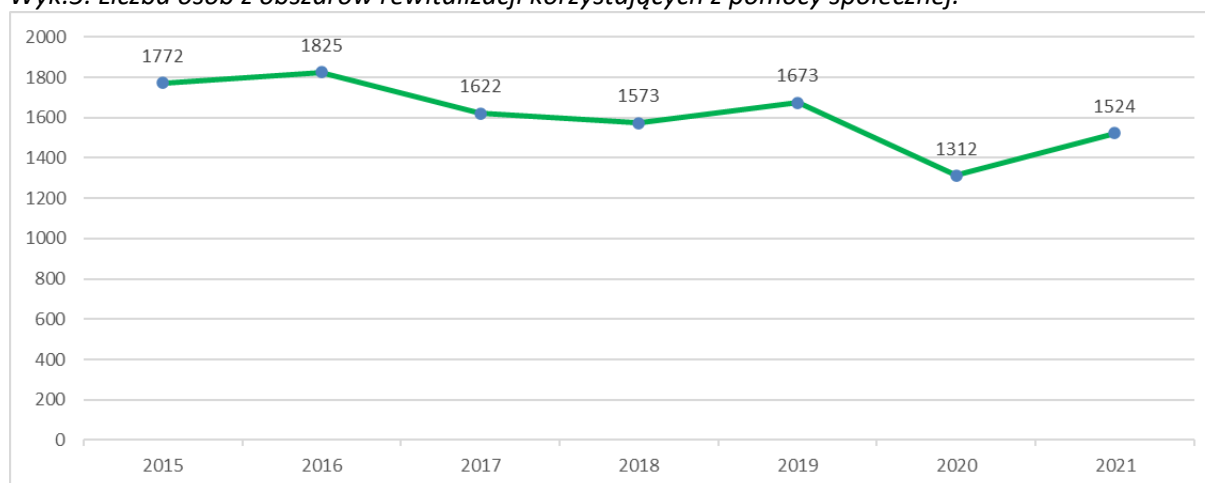

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z MOPS w Ostrowcu Świętokrzyskim.


Wzrost liczby osób prowadzących działalność gospodarczą.

Poziom przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji mierzony jest liczbą podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Do 2017 r. trwała tendencja wzrostowa, która uległa zahamowaniu w roku 2018 i 2019 r. W 2020 r. zaobserwowano wzrost wskaźnika, jednakże w 2021 r. uległ on ponownie regresji, co wskazuje na trudności z jakimi muszą borykać się

przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w czasie pandemii COVID-19.


Na koniec 2021 r. roku w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na obszarze rewitalizowanym zarejestrowanych było 1048 podmiotów. W ciągu roku liczba ta spadła o 43 podmioty gospodarcze (wyk.6) w stosunku do roku 2020, jednakże w stosunku do roku 2016 (przed rozpoczęciem realizacji Programu) liczba osób prowadzących działalność wzrosła o 65 osób.

Wyk.6. Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą na obszarach rewitalizacji (zarejestrowana w CEDG)

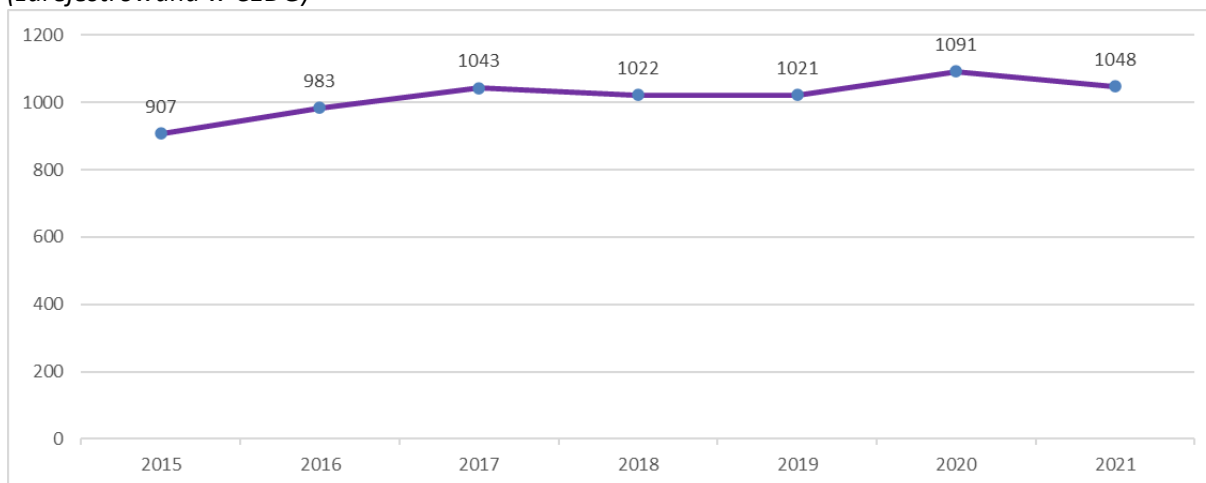

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z CEDG

Wyk. 7 Wartości monitorowanych wskaźników w latach 2015-2021

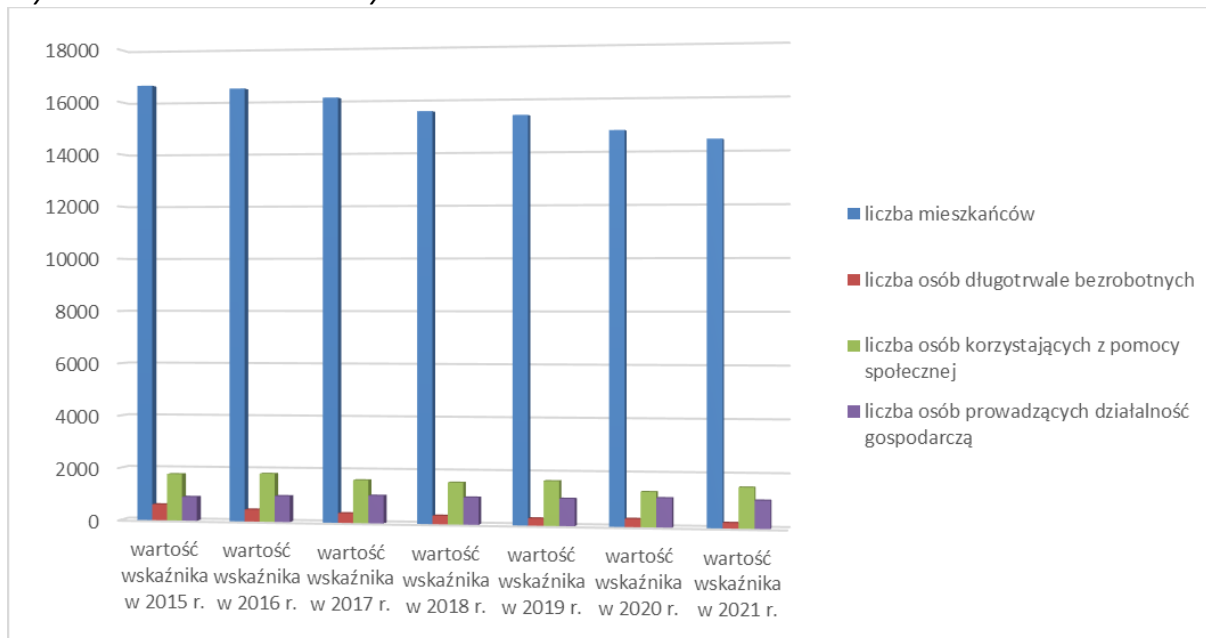

Źródło: dane gminy

VII. Podsumowanie

Podsumowując realizację zadań rewitalizacyjnych, na 78 projektów wpisanych do dwóch list projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych umieszczonych w Programie Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023, większość projektów realizowana jest przy udziale środków zewnętrznych (głównie środków unijnych).

Dwa projekty realizowane są przez Gminę w partnerstwie:

1. Ze spółdzielniami mieszkaniowymi skupiający aż 11 przedsięwzięć z Programu, w ramach działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi priorytetowej 6 „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
2. Z Powiatem Ostrowieckim w ramach działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej” Osi priorytetowej 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Na koniec roku sprawozdawczego 11 projektów zostało zakończone (łącznie ilość projektów zakończonych w Programie Rewitalizacji wynosi 30), 22 jest w trakcie realizacji, 2 zaplanowane są do zrealizowania w roku 2022, 18 projektów zostało zaplanowane na ostatni rok obowiązywania Programu, zaś od realizacji 6 projektów odstąpiono.

Na koniec 2021 roku wartość wskaźnika „liczba osób długotrwale bezrobotnych” wykazuje w dalszym ciągu trend spadkowy (spadek względem 2020 r. o 100 osób). W stosunku do 2020 roku wzrosła liczba osób korzystających z pomocy społecznej oraz spadła liczba osób prowadzących działalność gospodarczą, na co niewątpliwie miała wpływ pandemia Covid 19. Zachwianie pozytywnego wpływu procesu rewitalizacji obrazowane za pomocą wybranych kryteriów oceny spowodowane jest destabilizacją globalnej gospodarki, co jak widać niestety odbija się na lokalnych społecznościach. Mimo prowadzonych działań rewitalizacyjnych i działań z zakresu aktywizacji społeczeństwa ogólnokrajowe i światowe ograniczenia dotychczasowego sposobu życia mieszkańców wpłynęły negatywnie na wartości wskaźników.

Zgodnie z systemem monitorowania i oceny określonym w Programie Rewitalizacji ocena aktualności i stopnia realizacji Programu Rewitalizacji wykonywana jest co najmniej raz na trzy lata. W roku 2019 r. w wyniku przeprowadzenia oceny, dotychczasowe działania podejmowane w Programie Rewitalizacji uzyskały pozytywną opinię zarówno Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego jak i Komitetu Monitorującego z równoczesnym wskazaniem konieczności przeprowadzenia aktualizacji programu, co miało miejsce w grudniu 2019 roku.

Tab.5 Lista podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz z osiągniętymi wskaźnikami produktu i stopniem realizacji projektu.

Lp.	Beneficjent	Nazwa projektu	Obszar Termin realizacji	Planowany zakres realizacji projektu	Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika w okresie sprawozdawczym stan na 31.12.2021r.	Stopień realizacji projektu
1	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	Budowa drogi łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi	Obszar: A 2016-2023	Zakres realizowanych zadań: Budowa alternatywnego dojazdu do Targowiska Miejskiego od ulic Chrzanowskiego oraz Kilińskiego, w skład którego wchodzić będzie budowa jezdni, chodników, ścieżki rowerowej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, miejsc parkingowych, przepustów.	Liczba zmodernizowanych / wybudowanych ciągów komunikacyjnych – 1 szt.	0	W ramach zadania wykonany został alternatywny dojazd do Targowiska Miejskiego od ulicy Chrzanowskiego. Jest on częścią projektu budowy układu komunikacyjnego łączącego ul. Furmańską i ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi od ul. Kilińskiego (na realizację odcinka w 2021 r. złożono wniosek o dofinansowanie ze środków RFRD, jednakże wniosek nie uzyskał dofinansowania) i ul. Denkowskiej (odcinek zrealizowany ze środków FDS w 2021 r.). Zadanie obejmuje budowę jezdni, chodników, ścieżki rowerowej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, miejsc postojowych, przebudowę skrzyżowań oraz urządzenie zieleni. Budowa drogi udrożniła zakorkowane uliczki okalające plac targowy, które nie są przystosowane do zwiększonego natężenia ruchu w dni targowe oraz pozwoliła na łatwiejszy i szybszy dostęp do terenów, na których odbywa się handel. Roboty budowlane rozpoczęto w 2020 roku. Zakończenie inwestycji - luty 2022 roku.
2	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	Budowa ul. Bocznej od ul. Kilińskiego – Andrzeja Biesiady	Obszar: A 2016-2018	Zakres realizowanych zadań: Budowa dojazdu do Targowiska Miejskiego oraz drogi między ul. Furmańską a ul. Chrzanowskiego od ulic Chrzanowskiego, o łącznej długości 0,5km, w skład której wchodzi budowa jezdni, chodników, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, miejsc parkingowych, przepustów.	Liczba zmodernizowanych / wybudowanych ciągów komunikacyjnych – 1 szt.	1	Projekt zrealizowany.
3	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	Remont dróg gminnych: ul. Siennieńskiej, ul. Okólnej, ul. Jana Głogowskiego, ul. dr Adama Wardyńskiego oraz ul. Piwnej w Ostrowcu	Obszar: A 2017-2021	Zakres realizowanych zadań: Remont dróg o długości ok. 1,287 km.	Liczba zmodernizowanych / wybudowanych ciągów komunikacyjnych – 2 szt.	2	Projekt zrealizowany.

		parkingu, chodników i schodów zewnętrznych przy budynku nr 5 na os. Ogrody w Ostrowcu Św.					
6	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	Przebudowa ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego	Obszar: C 2017-2023	Zakres realizowanych zadań: przebudowa ulicy o długości ok. 1,1 km wraz z orurowaniem cieku, parkingami, chodnikami i dojazdem do rewitalizowanych budynków przy ul. Świętokrzyskiej	Liczba zmodernizowanych / wybudowanych ciągów komunikacyjnych – 1 szt.	0	Zadanie obejmuje odcinek o długości 1,014 km z chodnikami, wykonanie nawierzchni jezdni, przebudowę skrzyżowania, roboty wodno-kanalizacyjne, urządzenie zieleni, energooszczędne oświetlenie. Dzięki realizacji tej inwestycji poprawi się dojazd do terenów przemysłowych. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano na 2022 rok. Zakończenie planowane jest na początek 2023 roku.
7	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	Budowa otwarcia komunikacyjnego terenów inwestycyjnych – drogi gminnej bocznej od ulicy Bałtowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z przebudową dróg wewnętrznych	Obszar: E 2019-2020	Zakres realizowanych zadań: Budowa otwarcia komunikacyjnego od strony ul. Bałtowskiej o długości 680m m do terenów inwestycyjnych wraz z przebudową dróg wewnętrznych o długości 857 m.	Liczba zmodernizowanych / wybudowanych ciągów komunikacyjnych – 1 szt.	1	Projekt zrealizowany.
8	Powiat Ostrowiecki	Rozbudowa i przebudowa ulicy Samsonowicza w Ostrowcu Św. – II etap	Obszar: F 2018	Zakres realizowanych zadań: Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu poprzez: - zastosowanie nowej nawierzchni asfaltowej, wymianę krawężników; budowę 2 zatok autobusowych i 7 azyli dla pieszych, wykonanie chodników i przejść dla pieszych	Produkty: Liczba zmodernizowanych / wybudowanych ciągów komunikacyjnych – 1 szt.	1	Projekt zrealizowany.
9	Powiat Ostrowiecki	Rozbudowa skrzyżowania ulic Żeromskiego – Szewieńska – Świętokrzyska z rozbudową mostu na rzece Modła	Obszar: C 2023 Nowy termin	Zakres realizowanych zadań: - przebudowa istniejącego skrzyżowania na bezkolizyjne; - wykonanie nawierzchni z mieszanki odpornej na koleinowanie; - budowa ścieżki rowerowej; - przebudowa chodników; - przebudowa oświetlenia	Liczba zmodernizowanych / wybudowanych ciągów komunikacyjnych – 1 szt.	0	W 2021 roku zostało zlecone opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja projektu planowana jest po roku 2022.

				<ul style="list-style-type: none"> ulicznego; - budowa kanalizacji deszczowej; - przebudowa infrastruktury technicznej; - rozbudowa mostu poprzez poszerzenie obiektu (w chwili obecnej szerokość jezdni na moście wynosi 5,45m, co stanowi 2 pasy ruchu, szerokość chodników prawego i lewego wynosi po 1,05m). 			
10	Powiat Ostrowiecki	Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Świętokrzyskiej i Alei Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim	Obszar: C, D 2023 Nowy termin	<p>Zakres realizowanych zadań: Budowa ścieżek rowerowych w ciągu dróg powiatowych ul. Świętokrzyskiej i Alei Jana Pawła II, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozbiórka starych ścieżek i chodników, - przebudowa kolizji infrastruktury technicznej, - wykonanie podbudowy, - budowa nowych asfaltowych ścieżek rowerowych. 	Liczba zmodernizowanych / wybudowanych ciągów komunikacyjnych – 1 szt.	0	W 2021 roku nie aplikowano o środki zewnętrzne z uwagi na brak środków finansowych w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na realizację pełnego zakresu planowanego przedsięwzięcia. Realizacja projektu planowana jest po roku 2022.
11	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	Zagospodarowanie części dziedzica browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych	Obszar: A 2018-2022	<p>Zakres realizowanych zadań: Utworzenie terenów zielonych z małą architekturą, chodnikami, oświetleniem, terenem do wystaw plenerowych oraz modernizacją budynku i przystosowaniem go na potrzeby aktywizacji mieszkańców osiedli oraz spotkania rad osiedlowych.</p>	Wskaźniki produktu: Liczba zrewitalizowanych przestrzeni publicznych – 1szt.	0	Zadanie polega na kompleksowym zagospodarowaniu części dziedzica przebudowanego browaru poprzez: wykonanie parkingów, dróg dojazdowych, odwodnienia i oświetlenia terenu, modernizację budynku i wykorzystanie go na potrzeby mieszkańców i rad osiedlowych z terenu Śródmieścia oraz okolicznych osiedli. Wykonano niezbędne rozbiórki, parking oraz modernizację budynku. W roku 2021 trwały prace projektowe z uwagi na zmianę koncepcji zagospodarowania części dziedzica browaru. Roboty budowlane na pozostały zakres zadania zostały przewidziane na rok 2022.
12	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	Zagospodarowanie terenu oraz modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Osadowej i Świętokrzyskiej	Obszar: C 2016-2023	<p>Problem: Zły stan techniczny obiektów mieszkalnych wielorodzinnych oraz terenów okalających, braki w infrastrukturze technicznej.</p> <p>Zakres realizowanych zadań: Modernizacja i odnowienie budynków wielorodzinnych (socjalnych i komunalnych),</p>	<p>Liczba zrewitalizowanych obiektów mieszkalnych – 6 szt.</p> <p>Liczba zrewitalizowanych przestrzeni publicznych – 2 szt.</p>	0 1	W ramach zadania modernizowany jest budynek wielorodzinny zlokalizowany przy ul. Osadowej 6. Inwestycja obejmuje termomodernizację i modernizację elewacji, remont instalacji wewnętrznych i dachu. Lokale w zmodernizowanym budynku powiększą gminne zasoby mieszkań socjalnych. Roboty budowlane rozpoczęły się w 2020 r. Zakończyła się część obejmująca rozbiórki oraz zagospodarowanie terenu. Zakończenie pozostałej części zadania zaplanowano na 2022 r.

				zaliczonych do ewidencji zabytków gminnych zlokalizowanych przy ul. Osadowej i Świętokrzyskiej – termomodernizacja i modernizacja elewacji, remont instalacji wewnętrznych, remont dachu, urządzenia zorientowane na efektywne wykorzystanie energii wraz z zagospodarowaniem terenu (parkingi, oświetlenie, place zabaw, odwodnienie) oraz przystosowaniem infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych.			
13	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	Rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu	Obszar: A,B,C,D 2019-2020	Zakres realizowanych zadań: Uzupelnienie istniejącego systemu monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych i jego rozbudowanie o 5 punktów kamerowych wraz z zakupem niezbędnych licencji, sprzętu i oprogramowania oraz przeniesieniem centrum monitoringu do siedziby Straży Miejskiej, zlokalizowanej w dzielnicy Częstocice.	Liczba obszarów, na których zwiększono bezpieczeństwo – 4 szt.	4	Projekt zrealizowany.
14	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	Budowa zadaszania części placu targowego wraz z zagospodarowaniem	Obszar: A 2016-2022	Zakres realizowanych zadań: Przebudowa przestrzeni publicznej i budowa, w miejscu starych zniszczonych magazynów oraz na otwartej przestrzeni, zadaszona wiaty handlowo-usługowej wraz z utwardzeniem, odwodnieniem i oświetleniem części placu targowego oraz utworzeniem miejsc parkingowych.	Liczba zrewitalizowanych przestrzeni publicznych – 1 szt. Liczba przygotowanych przestrzeni dla podmiotów gospodarczych – 1 szt.	1 1	Zadanie obejmowało dwie części. Pierwsza - budowa wiaty handlowej została wykonana w 2019 roku. Druga, obejmująca utwardzenie północnej części targowiska kostką brukową, odwodnienie terenu oraz jego oświetlenie zakończona została w 2021 r. Projekt zrealizowany.
15	Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń	Rewitalizacja, adaptacja i modernizacja terenów byłej Cukrowni „Częstocice” w celu nadania im	Obszar: C 2017-2022 Nowy termin	Zakres realizowanych zadań: - kompleksowy remont i modernizacja najstarszej zabytkowej części budynku pofabrycznego byłej Ocukrowni;	Liczba zrewitalizowanych przestrzeni publicznych – 1 szt. Liczba zrewitalizowanych	0 1	W ramach realizowanego projektu wykonano: przyłącze energii elektrycznej, instalacji wewnętrznych, przyłącze wody, przyłącze C.O., remont węzłów sanitarnych, nową wewnątrz budynku instalację C.O. W Sali Izby na I piętrze zakupiono i wykonano montaż urządzeń do klimatyzacji pomieszczenia, ponadto zakupiono wyposażenie do Sali wystawowej w postaci

		nowej funkcji użytkowej i kulturalnej – Utworzenie Parku Przemysłowego z Izbą Pamięci Cukrownictwa		- remont i modernizacja pozostałych budynków wchodzących w skład strefy objętej nadzorem konserwatorskim (w zakresie ograniczonym do posiadanych środków w ramach projektu); - przebudowa i remont istniejącego uzbrojenia terenu; - budowa sieci oświetlenia terenu wokół i wewnątrz obiektu; - budowa systemu dróg, parkingów, chodników itp.	obiektów przemysłowych – 1 szt.		witryn gablot stołów, krzeseł itd. 3 stycznia 2018 r. otwarto Izbę Pamięci Cukrownictwa w sali konferencyjne wraz z wystawą poświęconą historii cukrownictwa w Polsce. W roku 2021 zakończono rozbudowę budynku wykonano kompleksowy remont pomieszczeń na poziomie parteru budynku, zakończono rozbudowę budynku (nowa klatka schodowa wraz z windą), udostępniono kolejną ekspozycje historyczną w Sali dawnej paczkarni. Opisany zakres wykonanych prac Krajowa Spółka Cukrowa realizuje z własnych środków finansowych. W 2022 roku planuje się wykonanie robót elewacyjnych budynku pofabrycznego oraz prace adaptacyjne przyziemia budynku.
16	Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim	Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem otoczenia Centrum Aktywności Obywatelskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Projekt poza obszarem 2018-2023	Zakres realizowanych zadań: Projekt zakłada kompleksowy remont i adaptację budynku byłej Szkoły Podstawowej nr 4. na potrzeby Centrum Aktywności Obywatelskiej: remont/przebudowę sal szkoleniowych, biur, toalet, ciągów komunikacyjnych oraz dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo (zakup i montaż platformy schodowej), dostosowanie do potrzeb osób niedosłyszących (zakup i instalacja pętli indukcyjnych w salach szkoleniowych), zakup nowoczesnego sprzętu multimedialnego na potrzeby wyposażenia sal. Planuje się również modernizację terenu przyległego, budowę parkingu i posadzenie zieleni na obszarach rewitalizowanych.	Liczba obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej, poddanych rewitalizacji – 1 szt. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 1 szt.	0 0	Ze względu na ograniczenie zakresu projektu pn.: „Ostrowiec Świętokrzyski – miasta OdNowa” zadanie to nie będzie finansowane ze środków MFEOG. W 2022 roku planowane jest rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej w ramach projektu pn.: „Ostrowiec Świętokrzyski – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
17	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych na osiedlu Stawki	Obszar: B 2019-2023	Zakres realizowanych zadań: Budowa terenów rekreacyjno-sportowych i wypoczynkowych w pobliżu zbiornika retencyjnego Stawki II (plac zabaw, siłownia plenerowa, tereny zielone, mała	Liczba zrewitalizowanych przestrzeni publicznych – 1 szt.	0	Projekt zaplanowany do realizacji po 2022 roku.

				architektura, ścieżki piesze i rowerowe, miejsca wypoczynku, parkingi, tereny pod imprezy okolicznościowe).			
18	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	Budowa strefy rekreacji i wypoczynku	Obszar: C 2016-2019	Zakres realizowanych zadań: Budowa strefy rekreacji składającej się z placu zabaw, siłowni zewnętrznej, boiska wielofunkcyjnego.	Liczba zrewitalizowanych przestrzeni publicznych – 1 szt.	1	Projekt zrealizowany.
19	Powiat Ostrowiecki	Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim	Obszar: C 2020-2023	Zakres realizowanych zadań: Projekt będzie polegał na: - budowie boiska wielofunkcyjnego do gry w piłkę ręczną, siatkówkę i tenisa, - budowie hali sportowej (sala sportowa z zapleczem dwukondygnacyjnym) wraz z niezbędnymi przyłączami, - zagospodarowaniu terenu, tj. budowie dróg wewnętrznych i parkingów oraz urządzeniu terenów zielonych.	Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury sportowej – 2 szt. Liczba zmodernizowanych / wybudowanych ciągów komunikacyjnych – 1 szt.	0 0	Projekt zaplanowany do realizacji po 2022 roku.
20	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski / Miejskie Centrum Kultury	Modernizacja obiektów kultury – przebudowa budynku Kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa	Obszar: A 2015-2022	Zakres realizowanych zadań: Modernizacja budynku Kina Etiuda znajdującego się w Gminnej Ewidencji Zabytków, roboty ogólnobudowlane całego budynku wraz z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, wymiana instalacji sanitarnych, elektrycznych, wykonanie klimatyzacji i wentylacji mechanicznej sali kina, remont, dachu, zakup wyposażenia, itp. W budynku utworzone zostanie multimedialne Centrum Tradycji Hutnictwa, które stworzy możliwości do poszerzenia oferty kulturalnej, edukacyjnej i turystycznej regionu. CTH będzie	Liczba zrewitalizowanych obiektów kultury – 1 szt.	0	Zadanie obejmuje przebudowę budynku Kina Etiuda oraz utworzenie Centrum Tradycji Hutnictwa. W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa obiektu z podzieleniem go na połączone ze sobą części: część kinową i część związaną z ekspozycjami i wystawami Centrum Tradycji Hutnictwa. W obiekcie znajdzie się także „Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności – SOWA”, utworzona we współpracy z Centrum Nauki Kopernik. Realizację robót budowlanych rozpoczęto w 2020 r. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2022 rok.

				gromadziło pamiątki, materiały i archiwalia świadczące o dziedzictwie kulturowym, jakim jest kilkusetletnia tradycja przemysłowa regionu. Wpłyne to na rozwój kultury i turystyki w oparciu o zasoby dziedzictwa kulturowego regionu. Zaletą utworzenia centrum będzie także poszerzenie i poprawa edukacji przede wszystkim wśród młodzieży. Nastąpi podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców regionu na temat ich przeszłości oraz wzrost integracji lokalnych środowisk kulturotwórczych.			
21	Powiat Ostrowiecki/ Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim	Renowacja i modernizacja Pałacu Wielopolskich w ramach projektu pn.: „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich	Obszar: C 2017-2021	Zakres realizowanych zadań: - ocieplenie ścian zewnętrznych Pałacu Wielopolskich poniżej terenu, - wymiana pokrycia dachowego wraz z renowacją istniejącej więźby dachowej, - renowacja istniejącego parkietu w poszczególnych salach ekspozycyjnych, - wykonanie instalacji odgromowej, - prace budowlane, konserwatorskie, sztukatorskie i instalacyjne w korpusie głównym pałacu, - montaż instalacji włamania, napadu i kontroli dostępu w korpusie głównym i bocznych skrzydłach pałacu, galerii obrazów oraz na obu kondygnacjach, - instalacja telewizji przemysłowej CCTV w korpusie głównym i bocznych skrzydłach pałacu oraz na zewnątrz budynku (zabezpieczenie terenu parkowego),	Liczba zrewitalizowanych obiektów kultury – 1 szt.	1	Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. W 2021 roku zostały zakończone roboty budowlane na terenie Rezerwatu, jak również w Pałacu Wielopolskich. Projekt zrealizowany.

				<ul style="list-style-type: none"> - modernizacja opaski z kostki kamiennej wokół budynku oraz jej uzupełnienie, - przebudowa istniejących ciągów pieszych oraz drogi dojazdowej do pałacu wraz z uporządkowaniem zagospodarowania zieleni na terenie zespołu parkowego. 			
22	Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa	Rewitalizacja parku na Osiedlu Spółdzielców	Obszar: A 2018-2020	<p>Zakres realizowanych zadań: Rewitalizacja parku osiedlowego polegająca na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - remoncie boiska z przekształceniem go na kreatywną strefę zabaw, - remoncie fontanny i zagospodarowaniu terenu wokół niej, - remoncie alejek spacerowych i terenów zielonych, - montażu urządzeń zabawowych oraz sztucznej nawierzchni na placach zabaw w celu zwiększenia bezpieczeństwa osób korzystających, - powiększeniu siłowni zewnętrznej o nowe urządzenia do ćwiczeń, - zwiększeniu ilości miejsc do wypoczynku (ławki, kosze itp.). 	Liczba zrewitalizowanych przestrzeni publicznych – 1 szt.	1	Projekt zrealizowany.
23	Towarzystwo Przyjaciół Denkowa; Parafia Rzymsko Katolicka pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim; Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ostrowieckiej	Budowa ścieżki rekreacyjno- edukacyjnej	Obszar: A 2020-2023	<p>Zakres realizowanych zadań:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wytyczenie, oznaczenie i urządzenie ścieżki edukacyjnej, - urządzenie miejsc parkingowych - odnowienie zabytkowych figurek, krzyży i kapliczek, - remont zabytkowej dzwonnicy wraz z opracowaniem stałej ekspozycji pn. „Z dziejów Denkowa i Parafii Denkowskiej”, - zagospodarowanie terenu 	<p>Liczba zrewitalizowanych przestrzeni publicznych – 1 szt.</p> <p>Liczba ścieżek edukacyjnych – 1 szt.</p>	0 0	Nie aplikowano o środki zewnętrzne z powodu braku środków na wkład własny. Projekt planowany do realizacji po 2022 roku.

				<p>przy ul. Mostowej przy kładce pieszej,</p> <ul style="list-style-type: none"> - modernizację chodników oraz zieleńców, - przebudowa/budowa nawierzchni ulic, - ustawienie tablic informacyjno-edukacyjnych, - wkomponowanie przy projektowanej ścieżce edukacyjnej trwałych elementów zieleni. 			
24	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	Zagospodarowanie terenów zielonych, sportowo-rekreacyjnych i centrów osiedli	Obszar: A,B,C,D 2017-2023	Zakres realizowanych zadań: Rewitalizacja centrów osiedli poprzez renowację boiska przy ul. Dziewulskiego, przebudowę kortów tenisowych, zagospodarowanie obszarów małą architekturą, budowę placów zabaw, wyposażenia w urządzenia terenów rekreacyjno-sportowych, budowę parkingów, doposażenie placów zabaw, budowę oświetlenia boisk i placów zabaw, budowę punktów monitorowania bezpieczeństwa publicznego.	Liczba zrewitalizowanych przestrzeni i obiektów publicznych – 6 szt.	4	W 2021 roku nie były prowadzone prace w zakresie projektu.
25	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” w Ostrowcu Św.	Budowa placu zabaw w rejonie budynków nr 31 - 34 na os. Rosochy oraz budowa siłowni zewnętrznej pomiędzy budynkami nr 25 - 27 na os. Rosochy, a ul. Słoneczną w Ostrowcu Św.	Obszar: B 2019	Zakres realizowanych zadań: Budowa placu zabaw: - dostawa i montaż urządzeń zabawowych, - wykonanie ogrodzenia placu zabaw, - zagospodarowanie terenu, - budowa siłowni zewnętrznej, - zagospodarowanie terenu.	Liczba zrewitalizowanych przestrzeni – 2 szt.	2	Projekt zrealizowany.
26	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	Zagospodarowanie Parku Fabrycznego oraz parku w Częstocicach	Obszar: C 2017-2023	Zakres realizowanych zadań: Zagospodarowanie parków poprzez małą architekturę, zieleni, urządzenia sportowo-rekreacyjne.	Liczba zrewitalizowanych przestrzeni publicznych – 2 szt.	1	W 2021 roku nie prowadzono prac w ramach projektu.
27	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	Ogród Zdrowia na Osiedlu Ogrody	Obszar: B 2017-2021	Zakres realizowanych zadań: Ogród podzielony zostanie na 5 stref zmysłów służących	Liczba zrewitalizowanych przestrzeni –	1	Zadanie polegało na wykonaniu ogrodu sensorycznego, który został podzielony na 5 stref zmysłów (terapia wzrokiem, węchem, dźwiękiem, dotykiem i smakiem) wraz z ciągiem

				<p>terapii i edukacji. Zakres zadań obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie ciągów komunikacyjnych, placów, nawierzchni sensorycznych, - zagospodarowanie placu zabaw, - zagospodarowanie siłowni zewnętrznej, - zagospodarowanie zielonej klasy, - montaż elementów małej architektury i elementów wyposażenia, tj. pergola, ławki, kosze stojaki na rowery, - nasadzenia roślin, - założenie trawników, - roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i budowlane. 	1 szt.		<p>komunikacyjnym, wyposażeniem ogrodu w małą architekturę oraz wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej. „Ogród Zdrowia” jest przestrzenią ogólnie dostępną o przewodniej funkcji terapeutycznej. Większość robót budowlanych została przeprowadzona w roku 2020, zadanie zostało zakończone w roku 2021. Projekt zrealizowany.</p>
28	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Rozwój wysokiej jakości usług społecznych – „Razem Raźniej”	Obszar realizacji całego projektu – powiat ostrowiecki; działań MOPS – gmina Ostrowiec Św. 2019-2021	<p>Zakres realizowanych zadań:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wsparcie dla usług opiekuńczych - asystenckich, m.in. w formie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej oraz pomoc sąsiedzka dla osób niesamodzielnych (zadanie MOPS). 2. Szkoła Rodziny - Wsparcie rodziny poprzez poradnictwo, warsztaty (zadanie MOPS) dla rodzin z wyzwaniami. 3. Punkt Interwencji Kryzysowej (zadanie PCPR) - dla osób borykających się z problemem przemocy domowej. 4. Wsparcie na rzecz osób funkcjonujących w pieczy zastępczej, wsparcie procesu usamodzielniania, w tym zakup mieszkań chronionych, szkolenia dla rodzi zastępczych (zadanie PCPR). 5. Aktywizacja społeczna dla rodzin zastępczych oraz osób opuszczających pieczę 	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem – 374	796	<p>Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie (od początku realizacji projektu 396 osób) Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.] (od początku realizacji projektu 3) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami w postaci mieszkań chronionych i wspomaganych w programie (od początku realizacji projektu 9 osób) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie (od początku realizacji projektu 343) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie (od początku realizacji projektu 45) Obszar realizacji całego projektu – powiat ostrowiecki; działań MOPS – gmina Ostrowiec Świętokrzyski. Projekt został zrealizowany.</p>

				zastępczą (zadanie ZDZ).			
29	Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim	Rozwój i wsparcie przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie Targowisk Miejskich	Obszar: A 2017-2023	<p>Zakres realizowanych zadań: Działania w ramach projektu prowadzić będą do zapewnienia organizacji parasolowej, wspierającej przedsiębiorców. Działania będą związane także z podnoszeniem kwalifikacji kadr Agencji Rozwoju Lokalnego jako instytucji otoczenia biznesu, tak, by zapewnić ostrowieckim przedsiębiorcom dostęp do fachowych usług i konsultantów posiadających aktualną wiedzę z zakresu nowoczesnego wsparcia przedsiębiorczości.</p> <p>Ponadto odbiorcą projektu będą przedsiębiorcy prowadzący działalność handlową na terenie Targowisk Miejskich. Projekt obejmuje działania takie jak: preferencyjne ceny usług dla biznesu, tj. prowadzenia księgowości, obsługi prawnej, pozyskiwania środków na rozwój działalności gospodarczej, a także bezpłatne usługi w zakresie marketingu i doradztwa dla przedsiębiorców, coaching, mentoring, organizacja izby gospodarczej, rzecznictwo interesów przedsiębiorców, promocja oferty handlowej przedsiębiorców, podnoszenie standardów obsługi klienta, szkolenia w zakresie sprzedaży, merchandising, budowa marki i inne działania świadomościowe, których celem jest zwiększenie liczby</p>	Liczba osób/podmiotów objętych wsparciem – 30 /10	234/75	<p>W ramach przedsięwzięcia rewitalizacyjnego w roku 2021 r. zrealizowano min.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szkolenia: „Środki na START”, „Firma jednoosobowa krok po kroku”, „Firma jednoosobowa krok po kroku” - konkurs plastyczny „Lokalne NIEBANALNE” - film informacyjny: „Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej – jak wypełnić wniosek CEIDG-1” - konsultacje osobiste, telefoniczne, mailowe o tematyce: <ul style="list-style-type: none"> • środki na podjęcie działalności gospodarczej • środki na rozwój działalności gospodarczej • zakładanie działalności gospodarczej • konsultowanie wniosków o dofinansowanie działalności gospodarczej – środki unijne oraz z PUP - zamieszczono i promowano informacje związane z przedsiębiorczością, samozatrudnieniem na stronie internetowej ARL Sp. z o.o. (www.arl.ostrowiec.pl) oraz fanpejdżu (www.facebook.com/ARLOstrowiecSwietokrzyski/). <p>Realizacja projektu została zakończona.</p>

				osób robiących zakupy na terenie Targowisk Miejskich, a tym samym wsparcie rozwoju przedsiębiorstw działających w ramach Targowisk.			
30	Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim	Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych w Ostrowcu Świętokrzyskim	Obszar: A,B,C,D 2017-2023	Zakres realizowanych zadań: - wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na obszarach rewitalizowanych - wsparcie firm w początkowym okresie działalności na obszarach rewitalizowanych poprzez zastosowanie następujących instrumentów: coaching, diagnoza kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo, szkolenia, informacja na temat dostępnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, informacja na temat wsparcia pomostowego, ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, kursy i szkolenia w zakresie tworzenia nowoczesnych modeli biznesowych budowy i rozwoju firm, poradnictwo w zakresie prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej itp. poprzez porady prawne, podatkowe, marketingowe, promocja przedsiębiorstw i przedsiębiorczości itp.	Liczba przedsiębiorstw, które skorzystają ze wsparcia – 40 Liczba osób, które otrzymały informację o środkach na podjęcie działalności gospodarczej – 25	Liczba przedsiębiorstw, które skorzystają ze wsparcia – 154 Liczba osób, które otrzymały informację o środkach na podjęcie działalności gospodarczej – 339	W ramach przedsięwzięcia rewitalizacyjnego w roku 2021 r. zrealizowano: 1. Szkolenie bezpłatne : „Środki na START”, „Firma jednoosobowa krok po kroku”, 2. Konkurs plastyczny „Lokalne NIEBANALNE”, 3. Konsultacje osobiste, telefoniczne, mailowe. Łączna liczba: 31. Tematyka konsultacji: - środki na podjęcie działalności gospodarczej, - środki na rozwój działalności gospodarczej, - zakładanie działalności gospodarczej, - konsultowanie wniosków o dofinansowanie działalności gospodarczej – środki unijne oraz z PUP. Ponadto wzięto udział w organizacji konferencji i warsztatów: - „Rynek pracy 2021 – dofinansowania w przepisach” przedstawiono ofertę ARL Sp. z o.o. skierowanej do przedsiębiorców, - „LOKALNIE dla biznesu. Oferta Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.” z Powiatowym Urzędem Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim, - „Miasto dla biznesu, biznes dla miasta” organizowanym przez Związek Miast Polskich, - „Skorzystaj z oferty pożyczek unijnych”, jako uczestnik, organizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim, - „Edukacja na rzecz rynku pracy” zorganizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy oraz Starostwo Ostrowieckie, Nagrano oraz opublikowano film informacyjny : „Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej – jak wypełnić wniosek CEIDG-1”. Zamieszczano i promowano informacje związane z przedsiębiorczością, samozatrudnieniem na stronie internetowej ARL Sp. z o.o. (www.arl.ostrowiec.pl) oraz fanpejdzu (www.facebook.com/ARLOstrowiecSwietokrzyski/). W latach kolejnych zakres projektu będzie realizowany przez nowy podmiot – Centrum Rozwoju Lokalnego.
31	Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim	Gminne Centrum Informacji w Ostrowcu Świętokrzyskim	Obszar: A,B,C,D 2017-2023	Zakres realizowanych zadań: Projekt przewiduje pomoc i koordynację działań mających na celu rozwiązywanie problemów w sferze społecznej, edukacyjnej wśród	Liczba osób uczestniczących w projekcie – 100	132	W ramach Gminnego Centrum Informacji prowadzone było doradztwo i poradnictwo, dotyczące przybliżenia informacji na temat ofert pracy oraz wymagań pracodawców. Oferowano pomoc w przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych, a także w ramach konsultacji udostępniano informacje o firmach poszukujących pracowników. Udostępniano także

				<p>mieszkańców miasta zamieszkujących obszary rewitalizacji. Wśród działań przewidywane są:</p> <p>1. Szkolenia aktywizacji zawodowej, przedsiębiorczości i rynku pracy: szkolenia z obszaru umiejętności osobistych pracownika, z zakresu umiejętności informatycznych, warsztaty z przedsiębiorczości, warsztaty tematyczne.</p> <p>2. Wsparcie osób poszukujących pracy poprzez indywidualne doradztwo zawodowe, pomoc w procesie aplikowania do pracy – w szczególności dla osób nie posiadających dostępu do komputera i internetu, a także dla osób potrzebujących pomocy w trakcie aplikowania do pracy za granicą.</p> <p>Działania te skierowane będą do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób bezrobotnych poszukujących zatrudnienia, zwłaszcza osób młodych – absolwentów szkół średnich, zawodowych oraz uczelni wyższych.</p>			<p>oferty pracy - krajowe i zagraniczne oraz świadczone pomoc w aplikowaniu do pracy za granicą poprzez pomoc w wysyłaniu dokumentów i korespondowaniu z pracodawcą. Przygotowano dokumenty, przeprowadzono rozmowy konsultacyjne (osobiste lub w formie telefonicznej) dot. ofert pracy, pomocy w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych. Z powodu pandemii koronawirusa zwiększono ilość konsultacji telefonicznych oraz kontaktów poprzez pocztę elektroniczną, ograniczając kontakty osobiste.</p> <p>Udzielano także informacji dotyczących szkoleń i przekwalifikowania zawodowego oferowanych przez firmy szkoleniowe zarówno lokalne jak i instytucje z terenu województwa świętokrzyskiego. W ramach usługi GCI prowadzono też akcję informacyjną na temat projektów związanych z dofinansowaniem zakładania własnej działalności gospodarczej, a także projektów związanych z dofinansowaniem kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowej kadr firm i przedsiębiorstw. realizowanych m. in. przez Staropolską Izbę Przemysłowo – Handlową, Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Dodatkowo z uwagi na działania związane z przeciwdziałaniem skutkom pandemii Covid- 19 prowadzono informowanie o działaniach takich jak dofinansowania, bezzwrotne pożyczki lub inne działania mające na celu utrzymanie miejsc pracy w firmach dotkniętych skutkami lockdownu.</p> <p>W ramach działań GCI kontynuowano współpracę z organizacjami pozarządowymi i klubami seniora poprzez spotkania informacyjne oraz pomoc w sprawach organizacyjnych.</p> <p>Projekt został zakończony.</p>
32	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie - „Akcja Aktywizacja”	Obszar: C 2019-2021	<p>Zakres realizowanych zadań: Projekt skierowany jest do osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, osób z niepełnosprawnością, osób bezdomnych, osób zamieszkujących teren rewitalizowany Częstocice, rodzin z wyzwaniami.</p> <p>Działania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aktywizacja społeczna, - środowiskowa praca socjalna 	<p>Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 180</p> <p>Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 60</p>	<p>319</p> <p>102</p>	<p>1) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - narastająco – 15 osób.</p> <p>2) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu - narastająco – 96 osób</p> <p>3) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) - narastająco – 25</p> <p>Po stronie partnera ZDZ: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - narastająco 183 osoby</p>

				<p>metodą programów aktywności lokalnej,</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizowanie społeczności lokalnej, - aktywizacja zawodowa, - szkolenia, warsztaty, staże, zatrudnienie wspierane. 			<p>Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - narastająco 102 osoby z niepełnosprawnością Projekt został zrealizowany.</p>
33	<p>Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim</p>	<p>Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych</p>	<p>Obszar: A,B,C,D 2017-2023</p>	<p>Zakres realizowanych zadań: Odbiorcami projektu są organizacje pozarządowe działające na obszarze objętym rewitalizacją w Ostrowcu Św., a także takie, które chcą rozpocząć swoją działalność na tym obszarze lub na terenie miasta; przedstawiciele grup nieformalnych, aktywni obywatele społeczności, którzy chcą realizować projekty i inicjatywy społeczne. Wsparcie będzie udzielane bez względu na wiek – będą z niego korzystać zarówno przedstawiciele młodzieży, jak i seniorzy realizujący inicjatywy na tych obszarach. Wsparcie w ramach projektu udzielane będzie bezpłatnie i obejmować będzie następujący zakres usług: poradnictwo, szkolenia, seminaria, spotkania informacyjne, udostępnianie zaplecza techniczno-lokalowego, wydanie broszury informacyjnej „ABC uzależnień. Vademecum organizacji pomocowych i pozarządowych”.</p>	<p>Liczba osób uczestniczących w projekcie – 100</p>	<p>570</p>	<p>W 2021 roku zorganizowano usługi doradcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Profilaktyczne ABC z elementami przedsiębiorczości i doradztwa kariery” - „Bądź aktywny, kreatywny, względem nałogów negatywny” - „Profilaktyka zachowań ryzykownych z uwzględnieniem zainteresowań jako czynnika chroniącego i czynnika sukcesu edukacyjno-zawodowego” <p>Wspólnie z organizacjami, instytucjami realizowano projekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „BĄDŹ ZAWODOWCEM. Rozwijamy kształcenie zawodowe w Ostrowcu Świętokrzyskim” - „Dzieciaki na 5+” w partnerstwie z Polskim Czerwonym Krzyżem/Swiętokrzyskim Oddziałem Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża <p>Filmy szkoleniowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Ekonomia społeczna” – film na temat ekonomii społecznej, funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, ich powstawania i korzyści jakie ekonomia społeczna stwarza w kierunku aktywizacji zawodowej. - „Fundacja – Działam! Pomagam!” – film z udziałem założycielek Fundacji Wyspa Pomocy. Tematem filmu było zakładanie, funkcjonowanie i pomysły związane z funkcjonowaniem fundacji <p>Współpracowano z organizacjami pozarządowymi w wydarzeniach:</p> <p>Cykliczne spotkania członków działających w CAO stowarzyszeń: Stowarzyszenie Głuchych „Nad Kamienną”, Stowarzyszenie Niepełnosprawność Bez Barrier „OPIEKUNEK”, Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Rejonowego Koła Pszczelarzy, Koła Polskiego Związku Wędkarskiego „Ostrowiec Kamienna”, Szkoła Muzyczna „CASIO”, Ostrowiecki Klub „Amazonka” w salach szkoleniowych i konferencyjnej udostępnianej w budynku Centrum Aktywności Obywatelskiej. Prowadzono spotkania edukacyjno – informacyjne w formie saloniku dyskusyjnego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Na skrzydłach pasji -NIE dla nałogów – TAK dla pasji”, - „Akademia Świadomych Rodziców” „ Profilaktyczne ABC...” „Przedsiębiorcze i obywatelskie ABC...” <p>A także cykl zajęć grupowych i warsztatów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „AKCJA ATRAKCJA – FANTASTYCZNE WAKACJE Z ARL”,

						<ul style="list-style-type: none"> - „Filmowe profilaktyczne poniedziałki” - „Kulturalne wtorki”, - „Sportowe Środy”, - „Przedsiębiorcze czwartki”, - „Integracyjne piątki” <p>Promowano inicjatywy skierowane do organizacji pozarządowych: Program „Włócznik Innowacji Społecznych” realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Działania w programie były skierowane także do podmiotów z województwa świętokrzyskiego. Wspólnie z organizatorami - Fundacją „Wyspa Pomocy” oraz Pracownią Psychologiczną Magdalena Majewska zorganizowano akcję „Przystanek A”. Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. włączyła się w promocje akcji „Alzheimer – rozumiem – wpieram” Zorganizowano szkolenia dla organizacji pozarządowych z zakresu treningu umiejętności interpersonalnych. „Komunikacja interpersonalna dla NGO”, „Asertywność dla NGO”, „Motywacja dla NGO” Wspólnie z LGD „Krzemienny Krąg”, Stowarzyszeniem „Integracja i Rozwój” Fundacja „Pestka” oraz Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej przeprowadzono szkolenie dla organizacji pozarządowych „Ekonomizacja organizacji pozarządowych” Promowano akcje i konkursy skierowane do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych tj: „Seniorzy w sieci”, „IDEATHON 2021” Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny finansowane z EOG itp. Ponadto promowano webinaria i spotkania informacyjne skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych i sektora ekonomii społecznej pod hasłem: „Więcej dobra, mniej stresu: jak odpowiedzialnie rozwijać organizację pozarządową i nie stracić głowy”. Odbyły się spotkania informacyjne w ramach projektu: „Szkoła Aktywnego Sektora”. W latach kolejnych zakres projektu będzie realizowany przez nowy podmiot – Centrum Rozwoju Lokalnego.</p>
34	Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim	Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar rewitalizowany	Obszar: A,B,C,D 2017 - 2023	Zakres realizowanych zadań: W projekcie realizowane będą zindywidualizowane i kompleksowe działania prowadzące do poprawy poziomu aktywności zawodowej osób zagrożonych	Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje – 100 Liczba osób zagrożonych wykluczeniem	Odstąpiono od realizacji projektu.

				<p>ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Wsparcie osób w ramach projektu będzie odbywało się w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej z osób. Zastosowane zostaną instrumenty i narzędzia aktywnej integracji na rzecz osób doświadczających wykluczenia społecznego w wymiarze zawodowym i społecznym, zmierzające do eliminacji barier w procesie aktywizacji społeczno-zawodowej i prowadzących do zmniejszenia ryzyka zjawiska wykluczenia. Działania w ramach projektu ukierunkowane będą na potrzeby osób w trudnej sytuacji na rynku pracy, doświadczające wykluczenia wielokrotnego.</p>	<p>społecznym pracujących po opuszczeniu projektu – 20 Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym objętych wsparciem – 150</p>		
35	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Henryka Sienkiewicza	„Sportowa Siódemka”	Obszar: D 2020-2023	<p>Zakres realizowanych zadań: Modernizacja boiska trawiastego do gry w piłkę nożną wraz z okalającą boisko bieżnią, skoczni do skoku w dal, montaż trybun na ok. 100 osób, mini siłownia zewnętrzna, remont dróg wewnętrznych, chodników, parkingu i terenów zielonych.</p>	<p>Liczba zrewitalizowanych przestrzeni publicznych – 1 szt. Liczba zrewitalizowanych obiektów sportowych i rekreacyjnych – 1 szt.</p>	0 0	Rozpoczęcie realizacji projektu planowane jest w roku 2022.

Tab.6 Lista pozostałych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz z osiągniętymi wskaźnikami produktu i stopniem realizacji projektu.

Lp.	Beneficjent	Nazwa projektu	Obszar Termin realizacji	Planowany zakres realizacji projektu	Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika w okresie sprawozdawczym stan na 31.12.2021r.	Stopień realizacji projektu
1	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim	Obszar: E,F 2015-2023	Zakres realizowanych zadań: - opracowanie dokumentacji projektowej, - badania geotechniczne, - roboty budowlane, rekultywacja/remediacja gruntów, - prace rozbiórkowe, - wycinka drzew, - uzbrojenie w infrastrukturę techniczną, - przygotowanie terenów do sprzedaży (scalenie, podziały, operaty, ogłoszenia).	Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych –51,80 ha	18,82 ha	W 2021 roku udostępniono inwestorom teren o pow. 1,22 ha przy ul. Przemysłowej.
2	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	Remont odcinka ulicy Ostrowieckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Obszar: A 2020	Zakres realizowanych zadań: - remont nawierzchni jezdni na dł. ok. 0,500km, - remont chodnika na dł. ok. 0,500km, - remont nawierzchni zjazdów do posesji, - remont nawierzchni zatoki autobusowej, - regulacja infrastruktury technicznej w chodniku i jezdni, - remont oznakowania pionowego i poziomego (w tym 2 przejść dla pieszych), - humusowanie i obsianie skarp, - wymiana 7 szt. słupów oświetleniowych oraz opraw na oświetlenie LED.	Liczba zmodernizowanych / wybudowanych ciągów komunikacyjnych – 1 szt.	1	Projekt zakończony w 2020 roku.
3	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” w Ostrowcu Św.	Remont drogi wraz z wykonaniem odwodnienia oraz budowa parkingu na 10 miejsc postojowych pomiędzy budynkami nr 23 i 24 na os. Ogrody w Ostrowcu Św.	Obszar: B 2020-2023	Zakres realizowanych zadań: Odwodnienie i remont drogi, wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne, budowa miejsc parkingowych.	Liczba zrewitalizowanych przestrzeni – 1 szt. Liczba zmodernizowanych / wybudowanych ciągów komunikacyjnych – 1 szt. Liczba utworzonych miejsc parkingowych – 10	0 0 0	Projekt planowany do realizacji po 2022 roku.
4	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” w Ostrowcu Św.	Budowa drogi, parkingu na ok. 16 miejsc postojowych oraz strefy aktywności – park dla psów wraz z	Obszar: B 2020-2023	Zakres realizowanych zadań: - wybudowanie nowego odcinka drogi, - odwodnienie terenu, - budowa miejsc parkingowych, - oświetlenie terenu lampami energooszczędnymi,	Liczba zrewitalizowanych przestrzeni – 1 szt. Liczba zmodernizowanych / wybudowanych ciągów komunikacyjnych – 1 szt.	0 0 0	Projekt planowany do realizacji po 2022 roku.

		oświetleniem i odwodnieniem na os. Rosochy.		- budowa urządzeń parku dla psów wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz ogrodzeniem, - dostawa i montaż urządzeń treningowych,	Liczba utworzonych miejsc parkingowych – 16		
5	Kinga Kamińska-Skuza oraz współwłaściciele kamienicy	Remont i modernizacja kamienicy przy Alei 3-go Maja 3. Remont elewacji oraz pomieszczeń w budynku wraz z dostosowaniem powierzchni na cele biurowe i usługowe	Obszar: A 2020-2023	Zakres realizowanych zadań: Prace remontowe, budowlane i porządkowe związane z modernizacją (przebudową) wnętrza i instalacji technicznych lokali. Dostosowanie pomieszczeń do wymogów powierzchni biurowej, wyposażenie stanowisk do pracy w przestrzeni typu coworking z niezbędnymi instalacjami technicznymi i telekomunikacyjnymi. Remont pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, węzłów kuchennych i komunikacji ogólnej. Remont stolarki okiennej i drzwiowej lub ich wymiana na nowe. Termomodernizacja lokali i przywrócenie jakości oraz poprawa funkcjonalności lokali. Remont i restauracja elewacji obiektu.	Liczba zrewitalizowanych obiektów mieszkalnych/ usługowych – 1 szt.	0	Aktualnie prace nad realizacją projektu są zawieszono z uwagi na gromadzenie własnych środków finansowych. Planuje się realizację projektu po roku 2022.
6	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Parkowej	Obszar: C 2015-2020	Problem: Niedostateczna ilość lokali socjalnych na terenie miasta. Zakres realizowanych zadań: Budowa budynku z 18 lokalami socjalnymi z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz instalacjami wraz z zagospodarowaniem terenu (parkingi, drogi dojazdowe, place zabaw, oświetlenie, mała architektura, zieleń).	Wskaźniki produktu: Liczba wybudowanych mieszkań socjalnych – 18 szt.	18	Projekt został zrealizowany.
7	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	Budowa hali targowej przy ul. J. Słowackiego, przeznaczonej na cele promocji lokalnych produktów wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu	Obszar: A 2016-2018	Zakres realizowanych zadań: - prace rozbiórkowe, tj. rozbiórka istniejących pawilonów handlowych, - budowa hali targowej z instalacją wod.-kan, co, energii elektrycznej, instalacją kanalizacji deszczowej, instalacją fotowoltaiczną, - zagospodarowanie terenu (m.in. utwardzenie terenu, budowa miejsc parkingowych, wykonanie zjazdów publicznych, ogrodzenie terenu, nasadzenia).	Liczba zrewitalizowanych przestrzeni publicznych – 1 szt. Liczba przygotowanych przestrzeni dla podmiotów gospodarczych – 1 szt.	1 1	Projekt zrealizowany.
8	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” w Ostrowcu Świętokrzyskim	Budowa ciągu pieszo – jezdni, parkingów na ok. 71 miejsc postojowych wraz z dojazdami manewrowymi, odwodnieniem i	Obszar: B 2020-2023	Zakres realizowanych zadań: Odwodnienie terenu, wykonanie oświetlenia terenu, wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne, budowa ciągu pieszo – jezdni, budowa miejsc parkingowych, budowa placów manewrowych.	Liczba zrewitalizowanych przestrzeni publicznych – 1 szt. Liczba utworzonych miejsc parkingowych – 71	0 0	Realizacja projektu planowana jest po roku 2022.

		oświetleniem oraz placów gospodarczych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w rejonie budynków nr 81, 82, 84 i 86 os. Rosochy w Ostrowcu Św.					
9	Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim	Ostrowiecka Młodzież – Kreatywna Młodzież	Obszar: A,B,C,D 2017-2023	Zakres realizowanych zadań: - indywidualne doradztwo zawodowe, - warsztatowe zajęcia grupowe, - młodzieżowych saloniki dyskusyjne.	Liczba uczniów korzystających z doradztw i warsztatów – 200	874	<p>W 2021 r. zrealizowano następujące działania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - projekt „Dzieciaki na 5+” - celem projektu jest przeciwdziałanie oraz minimalizowanie skutków wykluczenia społecznego. <p>Główne zadania w projekcie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • warsztaty: ROZWIJAMY SWOJE TALENTY - celem warsztatów jest rozwój kompetencji osobistych w tym kreatywności, zdolności manualnych, wyobraźni, zdolności plastycznych, • warsztaty: MŁODY ODKRYWCA – celem warsztatów jest rozwój kompetencji matematycznych oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii, • warsztaty: FABRYKA WIEDZY WSPÓŁCZESNEGO JUNIORA – celem warsztatów jest rozwój kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie umiejętności uczenia się, przystosowania dzieci do życia w społeczeństwie, • warsztaty: PRZEDSIĘBIORCZE I OBYWATELSKIE ABC...- celem warsztatów jest rozwój kompetencji przedsiębiorczych i obywatelskich dzieci i młodzieży., • warsztaty: PROFILAKTYCZNE ABC... - celem warsztatów jest kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu substancji psychoaktywnych oraz podejmowaniu zachowań ryzykownych. <p>- projekt „BĄDŹ ZAWODOWCEM. Rozwijamy kształcenie zawodowe w Ostrowcu Świętokrzyskim” -celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i jakości kształcenia szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w Ostrowcu Św.</p> <p>Główne zadania w projekcie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • doradztwo edukacyjno-zawodowego • zajęcia grupowe z socjoterapii dla uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, • warsztaty kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych obejmujące moduły: przedsiębiorczość i rozwoju kompetencji społecznych.

							Projekt został zakończony.
10	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim	Świetlica środowiskowa przy Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim	Obszar: A 2020 - 2023	Zakres realizowanych zadań: - adaptacja i odnowienie budynku w zakresie niezbędnym do funkcjonowania świetlicy środowiskowej, - zakup niezbędnego wyposażenia.	Liczba nowo uruchomionych świetlic środowiskowych – 1 szt. Liczba osób korzystających ze świetlicy środowiskowej – 20	0 0	Projekt planowany do realizacji po 2022 roku.
11	Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi na rzecz prowadzonej Niepublicznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasz Dom” w Ostrowcu Świętokrzyskim do integracji ze środowiskiem i usamodzielnienia się	Wyrównajmy „pas startowy”- przygotowanie wychowanków Niepublicznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasz Dom” w Ostrowcu Świętokrzyskim do integracji ze środowiskiem i usamodzielnienia się	Obszar: A 2020-2023	Zakres realizowanych zadań: 1. Kształtowanie kompetencji społecznych umożliwiających prawidłową integrację ze środowiskiem poprzez realizację warsztatów psycho-edukacyjnych, indywidualnych spotkań z psychologiem. 2. Organizacja działań integracyjnych z biologicznymi rodzinami wychowanków placówki poprzez: - wsparcie psychologiczne indywidualne i grupowe wychowanków oraz ich rodzin, - organizację Dnia Rodziny. 3. Rozwijanie zdolności i zainteresowań wychowanków placówki poprzez: - udział w zajęciach plastycznych i teatralnych umożliwiających integrację ze środowiskiem, - udział w zimowym i wakacyjnym obozie socjoterapeutycznym, - organizację wycieczki edukacyjnej, - kurs prawa jazdy dla najstarszych wychowanków, - korepetycje przedmiotowe. 4. Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników placówki poprzez: - realizację warsztatów umiejętności wychowawczych, - indywidualnych i grupowych spotkań z psychologiem.	Liczba osób uczestniczących w projekcie – 20	20	W 2022 r. planowane jest zorganizowanie kolejnych warsztatów i korepetycji dla wychowanków oraz wycieczki.
12	Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi	Przebudowa budynków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasz Dom” Zgromadzenia Sióstr franciszkanek Rodziny Maryi	Obszar: A 2020-2023	Zakres realizowanych zadań: Przebudowa placówki jest zaplanowana w etapach, aby nie przerywać jej funkcjonowania. Pierwszy etap to remont dotychczasowej części biurowej i kilku pomieszczeń istniejącego wcześniej specjalnego ośrodka wychowawczego – budynki 17 i 19 b. Ten etap udało się zrealizować. Drugi etap to remont budynku nr 19	Liczba zrewitalizowanych obiektów infrastruktury społecznej – 2 szt.	1	W 2021 roku zakończył się remont wnętrza Placówki „Nasz Dom nr 1” przy ul. Szkolnej 19 – wyremontowano część pokoi i wydzielono klatkę schodową. W kolejnym roku planowane jest odnowienie elewacji.

				i przystosowanie go do potrzeb małej, bardziej rodzinnej placówki oraz przygotowanie pomieszczeń dla specjalistów. Trzeci etap to remont budynku po specjalnym ośrodku wychowawczym – ul. Szkolna 19a i przystosowanie go na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej z miejscami dla niepełnosprawnych dzieci. Kolejnym etapem będzie termomodernizacja budynku, doposażenie placu zabaw i wykonanie nowego ogrodzenia.			
13	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim	Prowadzenie zajęć integracyjno-profilaktycznych w świetlicy środowiskowej przy Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim	Obszar: A 2018 - 2023	Zakres realizowanych zadań: - prowadzenie zajęć integracyjno-profilaktycznych, -umożliwianie dzieciom i młodzieży wszechstronnego rozwoju z udziałem wykwalifikowanych instruktorów w takich dziedzinach aktywności jak: sport, kultura i sztuka, edukacja i rekreacja co przyczyni się do kształtowania pożądanych zachowań społecznych i cech osobowości, - planuje się ćwiczenia grup sportowych pod kierunkiem instruktorów (np. zajęcia kulturystyczne, szachy, tenis stołowy), - przygotowanie do rywalizacji młodzieży w zawodach o zasięgu gminnym, powiatowym oraz regionalnym i ponadregionalnym, - w zakresie kultury i sztuki planuje się rozwój talentów w dziedzinach: malarstwa, rzeźby, ceramiki, grafiki komputerowej i fotografii, - projekcja wartościowych filmów posiadających walor wychowawczo-edukacyjny, - planuje się organizację wycieczek krajoznawczych i rajdów pieszych oraz rowerowych, - przewiduje się prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży wymagającej wsparcia w tym zakresie.	Liczba osób uczestniczących w projekcie – 30	0	Projekt planowany do realizacji po 2022 roku.
14	Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim	Prowadzenie Punktów Konsultacyjnych ds. Uzależnień w Ostrowcu Świętokrzyskim	Obszar: A,B,C,D 2017-2023	Zakres realizowanych zadań: Punkt konsultacyjny ds. uzależnień to miejsce, w którym specjalista dokonuje wstępnej diagnozy problemu, zbiera wywiad dotyczący stopnia zaawansowania uzależnienia, edukuje, udziela informacji, motywuje do podjęcia leczenia. Działanie prowadzone będzie dwutorowo: 1. Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych, eksperymentujących z narkotykami i ich rodzin,	Liczba osób uczestniczących w projekcie – 100	1099	W 2021 r. ARL realizowała zadanie „Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin”. Działania prowadzone w Punkcie dotyczyły profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi. Ponadto prowadzone były: - zajęcia informacyjno-edukacyjne dotyczące budowania postaw prozdrowotnych,

				<p>prowadzony w budynku Centrum Edukacji Obywatelskiej</p> <p>2. Punkty konsultacyjne prowadzone w gminnych placówkach oświatowych .</p> <p>Zadania punktów konsultacyjnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, - udzielanie osobom i rodzinom konsultacji oraz porad terapeutycznych, psychologicznych i profilaktycznych w sprawach uzależnień, - wspomaganie osób używających ryzykownie i szkodliwie w podjęciu decyzji w sprawie zmiany, - motywowanie osób współuzależnionych do ewentualnego podjęcia psychoterapii w zakładach leczenia odwykowego, - gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb i instytucji z terenu gminy, zajmujących się systemową pomocą dla rodziny, - współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień, w szczególności lekarzami psychiatrrii. 			<ul style="list-style-type: none"> - zajęcia informacyjno-edukacyjne dotyczące zjawiska przemocy w kontekście uzależnień, - grupowe profilaktyczne spotkania informacyjno-edukacyjne w formie mini-saloników dyskusyjnych, - konkurs „Młodzi – wolni od uzależnień” - piknik rodzinny we współpracy ze Stowarzyszeniem Animals. <p>W 2022 roku planowana jest kontynuacja realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, w tym profilaktyki uzależnień przez nowoutworzony podmiot – Centrum Rozwoju Lokalnego.</p>
15	Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim	Aktywni seniorzy – aktywna społeczność	Obszar: A,B,C,D 2018-2023	<p>Zakres realizowanych zadań:</p> <p>Projekt będzie obejmował wsparcie organizacji, inicjatyw i instytucji zajmujących się tematyką senioralną w pozyskaniu środków zewnętrznych na organizację zajęć angażujących czas wolny seniorów np. zajęć komputerowych, plastycznych, gimnastycznych w zakresie zdrowego stylu życia i żywienia, nauki radzenia sobie ze stresem i animacją czasu wolnego, a także warsztaty dla liderów z zakresu samoorganizacji i prowadzenia grup seniorskich. Ostatecznym odbiorcą projektu będą osoby starsze zamieszkujące w Ostrowcu Św.</p>	Liczba osób uczestniczących w projekcie – 100	160	<p>ARL w ramach współpracy z Osiedlowym Klubem Aktywnych Seniorów przeprowadziła spotkanie „KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA”, ponadto na swojej stronie internetowej zamieszczała informacje dotyczące akcji i konkursów skierowanych do seniorów np.: Apel świętokrzyskiej policji - Uwaga na oszustów!, „Alzheimer – rozumiem – wspieram” „Seniorzy w sieci” – bezpłatny kurs on – line dla osób 60+ „UTW dla społeczności” – rekrutacja do projektu Projekt został zakończony.</p>
16	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” w Ostrowcu Św.	Poprawa społeczno - gospodarczego wykorzystania Osiedlowego Domu Społecznego „Malwa” w Ostrowcu Św.	Obszar: B 2021-2023	<p>Zakres realizowanych zadań:</p> <ul style="list-style-type: none"> - promowanie przedsiębiorczości i aktywności społecznej poprzez organizację różnego rodzaju szkoleń, - zajęcia teatralno - wokalne, taneczne, rękodzielnicze, - promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego, 	Liczba osób uczestniczących w spotkaniach – 200 osób, Ilość stworzonych miejsc pracy - 2	0 0	Realizacja projektu planowana jest po 2022 roku.

				- gimnastyka relaksacyjna, - doposażenie sal.			
17	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych	Obszar: A 2015-2019	Zakres realizowanych zadań: - rozbiorczy części suszarni, magazynu, słodowni, warzelni, magazynu zbożowego, - rewitalizacja zespołu obiektów polegająca na przebudowie i adaptacji do nowych funkcji budynku, - wykonanie fragmentów dobudowanych do budynku, - prace termomodernizacyjne, - nawierzchnie utwardzone i ciągi pieszo-jezdne, - parkingi, zieleń, - sieci zewnętrzne, - wyposażenie, mała architektura (ławki, kosze na śmieci, oświetlenie, stacja trafo, itp.).	Liczba zrewitalizowanych obiektów kultury – 1 szt.	1	Projekt zrealizowany.
18	Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim	„Rozbudowa Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia o salę koncertową wraz z instalacjami wod.-kan., gazu, c.o., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, energii elektrycznej, techniczną i niskoprądową – na działkach nr ew. 48/9, 49/2, 50 (obręb 36, arkusz 1) położonych przy ul. Łżeckiej w Ostrowcu Św.”	Obszar: A 2021-2023	Zakres realizowanych zadań: Projekt dotyczy rozbudowy, przebudowy i remontu niezabytkowej infrastruktury na cele działalności kulturalnej. Beneficjentem projektu będzie Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia prowadzona i nadzorowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zakres inwestycji będzie obejmował rozbudowę budynku o budowę sali koncertowej wraz z zapleczem i wyposażeniem.	Liczba zrewitalizowanych obiektów kultury – 1 szt.	0	W 2021 roku wykonano płytę fundamentową z elementami białej wanny, ściany żelbetowe poziom 0, ściany żelbetowe poziom 1, zrealizowano prace dotyczące ścian poziom 2, stropodach oraz wykonano konstrukcję żelbetowej konstrukcji widowni, wykonano izolację ścian. Projekt w trakcie realizacji.
19	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	Budowa ścieżek rowerowych	Obszar: A,B,C,D,E,F 2017-2023	Zakres realizowanych zadań: Budowa ścieżek rowerowych na terenach rewitalizowanych o długości ok. 6 km wraz z małą architekturą oraz stacjami umożliwiającymi naprawę rowerów.	Długość wybudowanych/zmodernizowanych ścieżek rowerowych – 6 km	2,0	W 2021 roku wykonano ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Jakuba Gawrońskiego – 0,6 km.
20	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski / MOSiR Ostrowiec Św.	Remont i doposażenie Miejskiego Stadionu Sportowego KSZO	Obszar: C 2020-2023	Zakres realizowanych zadań: - malowanie konstrukcji stalowej trybun stadionu (zalecenia wykazane w okresowym przeglądzie budowlanym - 640 000 zł wycena na podstawie wykonanego kosztorysu inwestorskiego oraz ekspertyzy technicznej), - wymiana siedzisk dla kibiców (410 000 zł	Liczba zrewitalizowanych obiektów infrastruktury sportowej – 1 szt.	0	Projekt przewidziany jest do realizacji po 2022 roku.

				wycena na podstawie cen producenta), - budowa nowego ogrodzenia od strony ul. Zgoda (350 000 zł wycena własna na podstawie kosztorysu inwestorskiego budowy hali), - wykonanie instalacji nawadniającej płytę boiska (100 000 zł wycena na podstawie oferty producenta), - montaż nowego systemu nagłośnienia stadionu (440 000 zł wycena na podstawie ofert firm wykonawczych), - montaż piłko chwytów za bramkami (40 000 zł wycena własna na podstawie cen rynkowych).			
21	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	Budowa zbiornika retencyjno-rekreacyjnego Stawki II	Obszar: B 2020-2023	Zakres realizowanych zadań: - budowa zbiornika retencyjno-rekreacyjnego o pojemności 49tys.m3, - odbudowa koryta Strugi Denkowskiej, - budowa przepustu z piętrzeniem, - formowania podwyższenia zbiornika, - budowa kanału deszczowego, przerzutowego, rowów izolacyjnych, - budowa przystani kajakowej, - odmulenie przepustów, mnicz spustowych - budowa ciągów spacerowych, ścieżek rowerowych, oświetlenia.	Liczba zrewitalizowanych przestrzeni publicznych – 1 szt. Liczba utworzonych zbiorników retencyjno-rekreacyjnych – 1 szt.	0 0	Zadanie planowane do realizacji po 2022 roku.
22	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	Budowa placów zabaw przy gminnych placówkach oświatowych	Obszar: B,D 2017-2023	Zakres realizowanych zadań: Projekt obejmuje budowę 3 ogólnodostępnych placów zabaw przy gminnych przedszkolach, przystosowanych dla różnych grup wiekowych i składających się m.in.: z nawierzchni sztucznej amortyzującej upadek wraz z różnymi elementami zabawowymi (np. karuzele, zjeżdżalnie, słuchawki, zestawy sprawnościowe, urządzenia interaktywne, itp).	Liczba zrewitalizowanych przestrzeni przy obiektach publicznych – 3 szt.	2	W 2021 roku projekt nie był realizowany.
23	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski/ Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	Działamy-matematykę odkrywamy	Obszar: A 2016-2017	Zakres realizowanych zadań: W ramach projektu będą prowadzone zajęcia innowacyjnymi metodami, w szczególności metodą eksperymentu: - zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze z matematyki dla uczniów posiadających braki edukacyjne z zakresu matematyki, - dodatkowe zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania z zakresu matematyki, - zajęcia psychologiczne zwiększające kompetencje uczenia się i kompetencje społeczne. Ponadto uczniowie otrzymają	Ilość osób uczestniczących w projekcie – 182	182	Projekt zrealizowany.

				poczęstunek oraz materiały piśmiennicze. Dodatkowo zostanie utworzona jedna pracownia międzyszkolna oraz zostaną wyposażone pracownie przedmiotowe w pomoce dydaktyczne do nauczania matematyki metodą eksperymentu			
24	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski/Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	Lepsza edukacja - lepsza przyszłość	Obszar: A 2016-2018	Zakres realizowanych zadań: - zwiększenie kompetencji matematycznych, - poprawa porozumiewania się w języku obcym, również u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, - utworzenie kół zainteresowań, - zajęcia z zakresu umiejętności uczenia się i technik szybkiego zapamiętywania z wykorzystaniem zakupionej w ramach projektu bazy dydaktycznej, - wycieczki edukacyjne, - uczniowski projekt edukacyjny, - zwiększenie kompetencji zawodowych u nauczycieli.	Ilość osób uczestniczących w projekcie – 132	144	Projekt zrealizowany.
25	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	Nowoczesna Szkoła – modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej	Obszar: A,B,D 2016-2019	Zakres realizowanych zadań: - modernizacja dwóch boisk wielofunkcyjnych przy PSP nr 4 i PSP nr 14 wraz z zagospodarowaniem terenu - wyposażenie placówek w nowoczesne pomoce dydaktyczne - modernizacja PSP nr 3 i PSP nr 14 (szatnie, korytarze, łazienki, sale gminastyczne)	Liczba placówek oświatowych biorących udział w projekcie – 8 szt.	8	Projekt zrealizowany.
26	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski / Zespół Szkół i Placówek Publicznych Nr 3	„One Two Three – eksperymentujemy z matematyką i językiem angielskim - program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim	Obszar: B 2016 -2018	Zakres realizowanych zadań: Główne działania w projekcie: - dodatkowe zajęcia matematyczne, językowe, doradztwo edukacyjno-zawodowe, - spartakiada umiejętności matematycznych i językowych - wycieczka do CN Kopernik i British Council, - program wspomagania nauczycieli, - wyposażenie międzyszkolnej pracowni matematycznej w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK, co zapewni warunki do nauczania opartego na metodzie eksperymentu.	Ilość osób uczestniczących w projekcie – 186	186	Projekt zrealizowany.
27	Niepubliczny Żłobek i	Stworzenie warunków do	Obszar: B 2016 – 2023	Zakres realizowanych zadań: Projekt przewiduje zwiększenie intensywności i	Liczba wyposażonych obiektów infrastruktury		Odstąpiono od realizacji projektu.

	Przedszkole „Pajacyk” s.c.	lepszego rozwoju dzieci uczęszczających do Niepublicznego Żłobka i Przedszkola „Pajacyk”		różnorodności oferty zajęć dodatkowych, np. zajęć gimnastycznych, relaksacyjnych, muzycznych, tanecznych, logopedycznych, terapeutycznych, pracy z psychologiem, teatralnych, wycieczek w ciekawe miejsca, plastycznych, naukowych, językowych itp. Zaprojektowanie, przystosowanie i wyposażenie pomieszczeń na których przebywają dzieci w pomoce dydaktyczne, naukowe, meble, meblościanki, zabawki rozwijające funkcje poznawcze, społeczne i rozwijające talenty, tablice lub ekrany multimedialne, kąciki relaksacyjne, sprzęt gimnastyczny itp. Zaprojektowanie i wykonanie ogrodu połączonego z edukacyjno – relaksacyjnym placem zabaw. Organizacja wspólnych imprez, festynów i pikników rodzinnych dla dzieci i ich opiekunów oraz dziadków i babci, które sprzyjać będą integracji środowiska i budowaniu pozytywnych relacji z otoczeniem.	edukacyjnej – 1 szt. Liczba osób uczestniczących w projekcie – 25		
28	Niepubliczny Żłobek i Przedszkole „Pajacyk” s.c.	Rozbudowa i adaptacja budynku oraz przebudowa placu zabaw i ogrodu Niepublicznego Żłobka i Przedszkola „Pajacyk”	Obszar: B 2016- 2023	Zakres realizowanych zadań: Projekt polega na adaptacji i remoncie istniejących pomieszczeń budynku Niepublicznego Żłobka i Przedszkola „Pajacyk” oraz rozbudowie budynku o dodatkowy moduł, w którym to znajdują się sala gimnastyczna, przynajmniej jedna dodatkowa grupa dziecięca oraz inne potrzebne do realizacji zamierzonych celów pomieszczenia. Remont i adaptacja budynku polegać będzie na renowacji dachu, kuchni i innych pomieszczeń w których przechowywana lub przetwarzana jest żywność, biur, łazienek, korytarzy, grup dziecięcych, pomieszczeń gospodarczych. Planowane działania dotyczą również, instalacji poprawiającej bezpieczeństwo, termomodernizacji budynku, wyposażenia go w urządzenia do alternatywnego wytwarzania energii. Projekt zakłada remont dróg wewnętrznych, parkingów, chodników i terenów zielonych oraz placu zabaw i ogrodu. Wraz z rozwojem żłobka i przedszkola zwiększyła się, a docelowo zwiększy się jeszcze bardziej, liczba dzieci stale uczęszczających do placówki, stąd też powiększenia wymagają pomieszczenia	Liczba miejsc żłobkowych i / lub przedszkolnych – 12 Liczba wybudowanych/ zmodernizowanych obiektów – 1 szt.		Odstąpiono od realizacji projektu.

				gospodarcze, kuchnie, zmywalnie, obieralnie, magazynki żywności, szatnie, biura itp.			
29	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach	Utworzenie ścieżki edukacyjno-sportowej poprzez modernizację boiska sportowego, zakup urządzeń zabawowych, doposażenie klasopracowni matematycznej i przyrodniczej oraz zlikwidowanie bariery architektonicznej dla osób niepełnosprawnych przy głównym wejściu budynku szkoły w Częstocicach	Obszar: C 2017-2018	Zakres realizowanych zadań: - modernizacja boiska szkolnego: wymiana nawierzchni z asfaltowej na nawierchnię bezurazową, montaż elementów do gry w piłkę nożną, siatkowa i ręczną, - wyposażenie placu przyszkolnego w urządzenia zabawowe dla dzieci, zjeżdżalnie, huśtawki, bujaczki, urządzenia równoważne, piaskownicę, - likwidacja barier architektonicznych, - wyposażenie sal lekcyjnych.	Liczba przebudowanych obiektów rekreacyjno-sportowych – 1 szt. Liczba osób korzystających z nowej infrastruktury – 600 osób	1 600	Projekt zrealizowany.
30	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach	Utworzenie ścieżki edukacyjno-sportowej poprzez modernizację boisk sportowych, doposażenie klasopracowni fizyczno-chemicznej i językowej oraz remont i wyposażenie szatni szkolnej – etap II	Obszar: C 2019-2022	Zakres realizowanych zadań: - modernizacja boisk sportowych; - doposażenie klasopracowni fizyczno-chemicznej; - doposażenie klasopracowni językowej; - remont i wyposażenie szkolnej szatni.	Liczba przebudowanych obiektów rekreacyjno-sportowych – 1 szt. Liczba osób korzystających z nowej infrastruktury – 145 osób		Odstąpiono od realizacji projektu.
31	Rada Osiedla Denków	Rozbudowa placu zabaw Pod Wiatrakami w Denkowie	Obszar: A 2020-2023	Zakres realizowanych zadań: Zagospodarowanie w całości terenu przeznaczonego pod plac zabaw, doposażenie go w nowoczesne urządzenia, oświetlenie, zabezpieczenie monitoringiem, poprawa wizualizacji otoczenia poprzez pomalowanie barierki wzdłuż ulicy Samsonowicza do skrzyżowania z Zieloną na barwy Ostrowca.	Liczba zrewitalizowanych przestrzeni publicznych – 1 szt.	0	Projekt planowany do realizacji po 2022 roku.
32	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach	Edukacja szansą na lepszą przyszłość	Obszar: C 2016- 2017	Zakres realizowanych zadań: - dodatkowe zajęcia z języka angielskiego i informatyki,	Liczb uczniów którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu		Projekt zrealizowany.

				<ul style="list-style-type: none"> - dodatkowe zajęcia z pedagogiem, - zakup tablicy multimedialnej, - zakup pomocy dydaktycznych, - wycieczka edukacyjna. 	programu – 30	30	
33	Fundacja Szkoła bez Barrier	Przebudowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową przy Zespole Edukacyjnym „Dwunastka”	Obszar: F 2019	<p>Zakres realizowanych zadań: Projekt przewiduje przebudowę boiska wielofunkcyjnego,</p> <ul style="list-style-type: none"> - powstanie szkolnego klubu sportowego oraz pozaszkolnych młodzieżowych zespołów sportowych, - prowadzenie dwóch dodatkowych pozalekcyjnych zajęć sportowych tygodniowo, - przeprowadzenie corocznej imprezy sportowo-rekreacyjnej, - integrację z innymi osiedlami poprzez organizowanie wspólnych rozgrywek sportowych. 	Liczba wybudowanych obiektów sportowo-rekreacyjnych – 1 szt.	1	Projekt zrealizowany.
34	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Czwórka - szkoła nowych możliwości. Modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim	Obszar: A 2019-2022	<p>Zakres realizowanych zadań: W ramach projektu szkoła zostanie wyposażona w narzędzia TiK, w tym w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne do pracowni przedmiotowych: geograficzno-przyrodniczej, matematyczno-fizycznej oraz biologiczno-chemicznej. Doposażony zostanie również gabinet logopedyczny w program wspomagający pracę nauczyciela z dziećmi z niedosłuchem, które uczęszczają do naszej szkoły. Projekt zakłada wyposażenie w sprzęt sportowy bloku sportowego oraz zostanie przeprowadzony remont bloku sportowego oraz szatni wraz z wyposażeniem w szafki.</p>	<p>Liczba doposażonych obiektów infrastruktury edukacyjnej – 1 szt. Liczba osób korzystających z nowej infrastruktury – 460 osób Liczba usprawnień dla osób niepełnosprawnych – 1 pracownia logopedyczna.</p>	1 460 1	Projekt zrealizowany w 2021 roku.
35	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 w Ostrowcu Świętokrzyskim	Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK (Poddziałanie 8.3.3 RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020)	Obszar: B 2020-2021	<p>Zakres realizowanych zadań: W ramach przedsięwzięcia szkoła zostanie doposażona w nowoczesny sprzęt TIK, a uczniowie w ramach zajęć dodatkowych podniosą swoje kompetencje cyfrowe. Nauczyciele zostaną przeszkoleni w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.</p>	<p>Liczba doposażonych obiektów infrastruktury edukacyjnej – 1 szt. Liczba osób (nauczycieli) uczestniczących w szkoleniach - 81 Liczba osób korzystających z nowej infrastruktury – 711 (stan na 2019 rok)</p>		Odstąpiono od realizacji projektu.
36	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski /Zespół Szkół i Placówek	Z wiedzą informatyczną wkraczamy we współczesny świat	Obszar: B 2020-2022	<p>Zakres realizowanych zadań: 1. Podniesienie kompetencji cyfrowych uczniów dodatkowe zajęcia informatyczne w klasach I - VIII oraz utworzenie międzyskolnych pracowni</p>	<p>Liczba doposażonych obiektów infrastruktury edukacyjnej – 1 szt. Liczba osób (nauczycieli)</p>		Odstąpiono od realizacji projektu.

	Publicznych Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim			informatycznych. 2. Liczę, badam i odkrywam dodatkowe zajęcia matematyczno przyrodnicze w klasach I - VIII oraz utworzenie międzyszkolnych pracowni matematycznych i przyrodniczych. 3. Humanista na czasie -dodatkowe zajęcia dla uczniów klas I - VIII prowadzone w oparciu o nowoczesne technologie oraz doposażenie międzyszkolnych pracowni humanistycznych. 4. Wsparcie psychologiczne i doradztwo edukacyjno- zawodowe dla uczniów klas IV - VII oraz doposażenie międzyszkolnej pracowni zawodoznawczej. 5. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu.	uczestniczących w szkoleniach – 50 osób		
37	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	Termomodernizacja budynków mieszkalnych	Obszar: A 2020-2023	Zakres realizowanych zadań: - docieplenie ścian, stropu, dachu, piwnic , - wymiana stolarki okiennej, drzwiowe, - wymiana oświetlenia w częściach wspólnych budynku na energooszczędne, - wymiana elementów metalowych, remont daszków, kominów,	Liczba budynków wielorodzinnych poddanych termomodernizacji – 2 szt.	0	Projekt planowany do realizacji po 2022 roku.
38	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” w Ostrowcu Św.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych wraz z wymianą pokrycia dachowego	Obszar: A,B 2016-2023	Zakres realizowanych zadań: - ocieplenie budynku - wymiana okien, drzwi zewnętrznych i oświetlenia w częściach wspólnych budynków, - instalacja OZE, , wymiana pokrycia dachowego.	Liczba budynków wielorodzinnych poddanych termomodernizacji – 11 szt.	9	W 2021 roku nie prowadzono prac związanych z realizacją projektu. W 2023 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynków Rynek 9 i Siemieńska 9
39	Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami "TWÓJ DOM" Sp. z o.o.	Termomodernizacja budynków Wspólnot Mieszkaniowych	Obszar: A,B 2017-2023	Zakres realizowanych zadań: Izolacja fundamentów, docieplenie ścian, docieplenie stropu, remont dachów, remont instalacji centralnego ogrzewania oraz wod.– kan.	Liczba budynków wielorodzinnych poddanych termomodernizacji – 11 szt.	10	W 2021 roku zakończono termomodernizację budynku oś. Ogrody 17B. W 2022 roku planowane jest wykonanie audytu dla budynku ul. Polna 7B oraz rozpoczęcie prac.
40	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE – Urząd Miasta, Kino Etiuda, Środowiskowy Dom Samopomocy „Przystań”	Obszar: A 2014-2022	Zakres realizowanych zadań: - opracowanie dokumentacji projektowej - docieplenie ścian, stropu, dachu, piwnic , - wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, - wymiana elementów metalowych, remont daszków, kominów, - wymiana rynien i rur spustowych, - modernizacja instalacji c.w.u, c.o., wentylacji, - montaż kolektorów słonecznych,	Liczba obiektów użyteczności publicznej poddanych termomodernizacji – 3 szt.	0	W 2021 roku prowadzone były prace w budynku Urzędu Miasta, kina Etiuda oraz ŚDS „Przystań”. Zakończenie projektu planowane jest w 2022 roku.

41	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Ogrody 7a	Termomodernizacja oraz remont budynków z przejściem na gospodarke niskoemisyjną	Obszar: C 2020-2023	<p>- wymiana oświetlenia na energooszczędne.</p> <p>Zakres realizowanych zadań: 1. Remont konstrukcji dachu połączony ze zmianą pokrycia dachowego oraz dociepleniem stropu ostatniej kondygnacji, a także dociepleniem ścian. 2. Opracowanie projektów instalacji centralnie ciepłej wody użytkowej. Demontaż podgrzewaczy wody i wykonanie w to miejsce instalacji wg opracowanych projektów.</p> <p>Działania realizowane w następujących lokalizacjach: 1. Ul. Klimkiewiczowska 8A, 2. Ul. Świętokrzyska 4, 3. Ul. Poniatowskiego 3, 4. Ul. Traugutta 12, 5. Ul. Traugutta 6, 6. Ul. Staszica 7, 7. Ul. Staszica 3, 8. Ul. Staszica 1, 9. Ul. Moniuszki 6, 10. Ul. Moniuszki 5, 11. Ul. Moniuszki 4, 12. Ul. Moniuszki 3, 13. Ul. Moniuszki 1, 14. Ul. Poniatowskiego 10, 15. Ul. Poniatowskiego 5, 16. Ul. Poniatowskiego 7, 17. Ul. Sandomierska 5, 18. Ul. Sandomierska 3.</p>	Liczba budynków wielorodzinnych, w których zmodernizowano infrastrukturę sieciową – 18 szt.	6	<p>W 2021 roku zakończono termomodernizację budynków: - ul. Sandomierska 3, - ul. Sandomierska 5.</p> <p>W kolejnym etapie planowane jest wykonanie projektu instalacji dla kotłów dwufunkcyjnych w budynkach przy ul. Moniuszki oraz projektu Co. i CCW. W budynku przy ul. Traugutta 12.</p>
42	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” w Ostrowcu Św.	Termomodernizacja oraz remont Społecznego Domu Kultury „Malwa” w Ostrowcu Św.	Obszar: B 2020-2023	<p>Zakres realizowanych zadań: - ocieplenie budynku, - wymiana okien, drzwi zewnętrznych i oświetlenia w budynku na energooszczędne, - instalacja OZE – paneli fotowoltaicznych, - instalacja oświetlenia awaryjnego, - wykonanie instalacji ciepłej wody i cyrkulacji wraz z podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej, - remont łazienek, - remont sali widowiskowo – teatralnej.</p>	Liczba budynków poddanych termomodernizacji – 1 szt.	0	Projekt planowany do realizacji po 2022 roku.
43	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski / Miejski Zakład Komunikacji Sp. z	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim	Obszar: A,B,C,D,E,F 2016-2022	<p>Zakres realizowanych zadań: - budowa bazy operatora transportu publicznego, - zakup ekologicznych autobusów na potrzeby</p>	Liczba zakupionego taboru – 15 szt. Liczba systemów komunikacji publicznej –	0 0	W roku 2021 trwały roboty budowlane przy nowej bazie operatora transportu publicznego oraz drogach wokół bazy, parkingach „Bike&Ride” i „Park&Ride” przy ul. Jana Samsonowicza. Zakończono prace przy modernizacji

	o.o./Powiat Ostrowiecki			<p>miejskiej komunikacji publicznej,</p> <ul style="list-style-type: none"> - modernizacja przystanków i zatok autobusowych na terenie miasta, - wdrożenie systemu zarządzania transportem miejskim - utworzenie Park & Ride, - budowa i przebudowa drogi i ścieżek rowerowych -modernizacja oświetlenia ulicznego 	1 kpl.		<p>oświetlenia ulicznego. Rozpoczęto działania promocyjne w ramach kampanii promującej transport ekologiczny. Rozstrzygnięto postępowania przetargowe na dostawę autobusów niskoemisyjnych z silnikiem Diesel spełniających normę emisji spalin Euro VI oraz autobusów hybrydowych. Ogłoszono także postępowanie przetargowe na „System dynamicznej informacji pasażerskiej oraz karty miejskiej”.</p>
--	-------------------------	--	--	---	--------	--	--

Spis tabel:

Tabela 1. Ilość realizowanych projektów wpisanych na listy przedsięwzięć Programu Rewitalizacji z podziałem na obszary oraz na projekty zakończone, realizowane, planowane i od których odstąpiono od realizacji	6
Tabela 2. Planowane przez beneficjentów źródła finansowania dla projektów	8
Tabela 3. Stan realizacji projektu pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego” realizowanego przez Partnerów: Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, Ostrowiecką Spółdzielnię Mieszkaniową i Spółdzielnię Mieszkaniową Krzemionki	10
Tabela 4. Wartości wskaźnika dla badanych kryteriów	14
Tabela 5. Lista podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz z osiągniętymi wskaźnikami produktu i stopniem realizacji projektu	19
Tabela 6. Lista pozostałych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz z osiągniętymi wskaźnikami produktu i stopniem realizacji projektu	36

Spis wykresów:

Wykres 1. Ilość realizowanych projektów rewitalizacyjnych z podziałem na projekty zakończone, realizowane, planowane i odstąpione od realizacji	7
Wykres 2. Planowane przez beneficjentów źródła finansowania dla projektów	8
Wykres 3. Liczba mieszkańców na obszarze rewitalizacji	15
Wykres 4. Liczba osób długotrwale bezrobotnych zamieszkujących obszar rewitalizacji	16
Wykres 5. Liczba osób z obszarów rewitalizacji korzystających z pomocy społecznej	16
Wykres 6. Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą na obszarach rewitalizacji (zarejestrowana w CEDG)	17
Wykres 7. Wartości monitorowanych wskaźników w latach 2015-2020	17

Spis rysunków:

Rysunek 1. Mapa obszarów zrewitalizowanych i zdegradowanych	4
---	---

Sprawozdanie sporządził: Tomasz Bogdański - Inspektor Wydziału Planowania i Rozwoju Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Sprawdziła: Jolanta Pora – Zastępca Naczelnika Wydziału Planowania i Rozwoju

Zatwierdził: Dominik Smoliński - Wiceprezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

WICEPREZYDENT MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

Dominik Smoliński

Opinia Komitetu Monitorującego Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023

- 1) Pozytywnie bez zastrzeżeń;
- 2) Pozytywnie z jednoczesnym uwzględnieniem uwag;
- 3) Negatywnie.
