



**Sprawozdanie za 2020 rok z postępu realizacji
Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
na lata 2016-2023**

Ostrowiec Świętokrzyski, marzec 2021 r.

Spis treści:

| | | |
|------|---|----|
| I. | Wstęp | 3 |
| II. | Sposób i zakres monitorowania Programu | 5 |
| 1. | Stopień realizacji projektów i założonych celów Programu Rewitalizacji | 6 |
| 2. | Zakres i przedmiot zmian w projektach Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016 -2023 | 7 |
| III. | Źródła finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych | 8 |
| IV. | Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego | 9 |
| V. | Wskaźniki postępu wdrażania Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023 | 12 |
| VI. | Wskaźniki społeczno-gospodarcze rewitalizowanego obszaru | 12 |
| 1. | Badane kryteria (wskaźniki rezultatu) | 14 |
| VII. | Podsumowanie | 17 |

I. Wstęp

W 2016 r. Uchwałą Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego nr XL/140/2016 z dnia 28.12.2016 r. został przyjęty Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023. Dokument został opracowany w oparciu o nowe podejście do procesu odnowy obszarów miejskich, zaprezentowane w rządowych „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020”. Przygotowana została diagnoza całego miasta w oparciu o podziały urbanistyczne, bazujące na utrwalonych związkach przestrzennych, funkcjonalnych i społeczno-ekonomicznych jakimi są osiedla. Diagnoza zawiera szczegółową analizę problemów społecznych oraz gospodarczych, technicznych, przestrzenno-funkcjonalnych i środowiskowych. Na jej podstawie zostały wyznaczone obszary zdegradowane, a spośród nich obszar rewitalizacji (składający się z 6 podobszarów) obejmujący (zgodnie z wytycznymi) nie więcej niż 20% powierzchni miasta (664,730 ha) i zamieszkały przez nie więcej niż 30% mieszkańców (16 622 mieszkańców) - Rys.1.


W 2019 r. Uchwałą Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego nr IX/18/2019 z dnia 21 lutego 2019 r. została wprowadzona zmiana do Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023 polegająca wpisaniu na listę przedsięwzięć rewitalizacyjnych nowego projektu, jak również wpisaniu nowego zadania planowanego do realizacji przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski.

W grudniu 2019 r. Uchwałą Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego nr XXV/153/2019 z dnia 9 grudnia 2019 r. została przyjęta aktualizacja Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023, mająca na celu dostosowanie treści projektów i przedsięwzięć do obecnie istniejących uwarunkowań realizacyjnych. Ponadto pojawiły się także pomysły na nowe projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne (aktywizacja nowych partnerów, nowe możliwości realizacyjne, związane z funduszami zewnętrznymi).

Główny zakres zmian w trakcie aktualizacji obejmował:

- aktualizację treści powiązań Programu Rewitalizacji ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego, Gminnym Programem Opieki nad Zabytkami,
- zmianę nazwy Osiedla XXV-lecia PRL na Osiedle Spółdzielców oraz ul. S. Brody na E. Kwiatkowskiego,
- aktualizację liczby ludności obszaru zdegradowanego (wg. stanu na maj 2019 wynosiła ona 35 231 osób, co stanowiło 53,24% mieszkańców miasta),
- aktualizację liczby ludności obszaru rewitalizacji oraz poszczególnych jego podobszarów (wg. stanu na maj 2019 wynosiła ona 15 373 osób, co stanowiło 23,23% mieszkańców miasta),
- aktualizację listy projektów i przedsięwzięć podstawowych oraz pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych a także związane z nimi informacje dotyczące planowanych nakładów finansowych na ich realizację.

Rys.1. Mapa obszarów zrewitalizowanych i zdegradowanych.

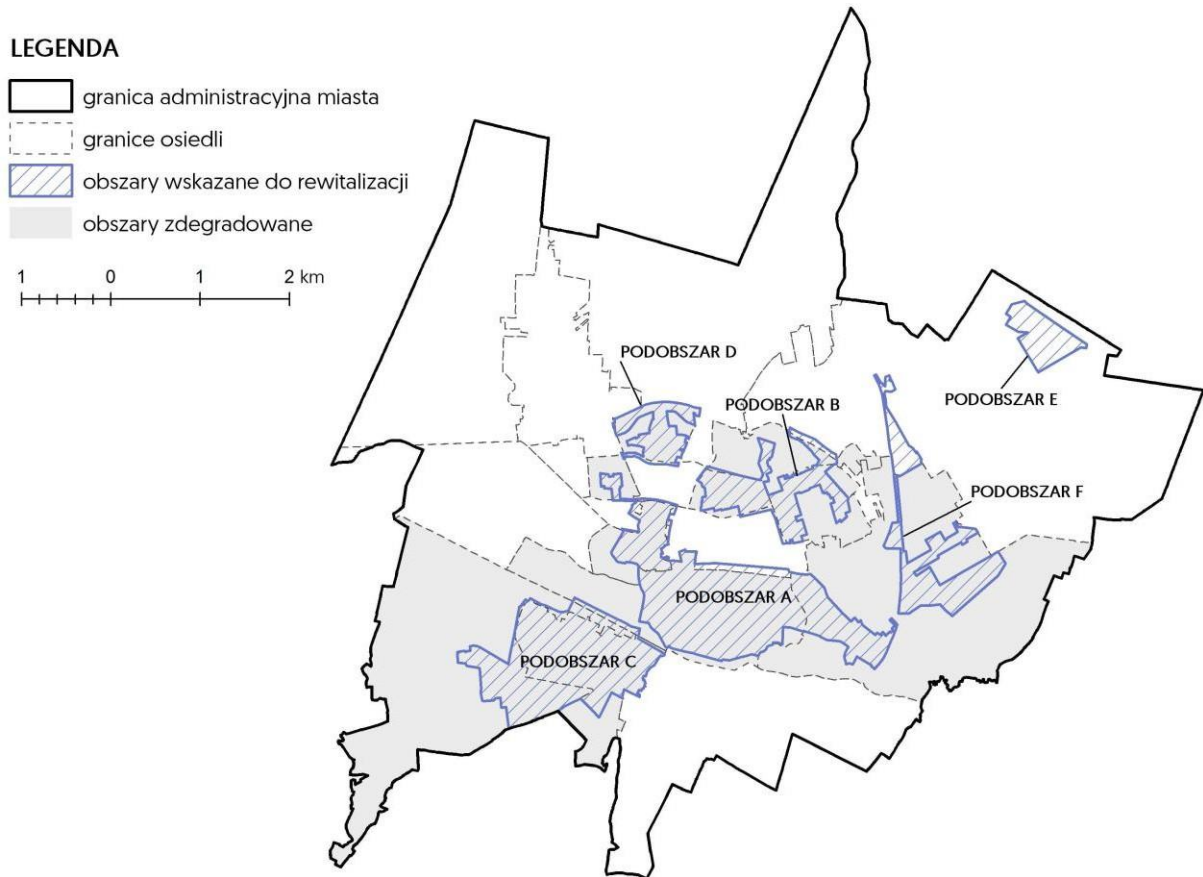

Źródło: opracowanie własne

II. Sposób i zakres monitorowania Programu.

Podstawowym narzędziem służącym monitorowaniu Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023 są coroczne sprawozdania monitorujące przebieg realizacji Programu. Projekt rocznego sprawozdania przygotowywany jest w oparciu o dane i informacje, które przekazywane są przez podmioty realizujące projekty rewitalizacyjne wpisane do Programu, a także podmioty takie jak: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy, Urząd Miasta, które są źródłem danych umożliwiających zbadanie wskaźników społeczno-gospodarczych. Wyrażone w postaci liczbowej wskaźniki obrazują w sposób syntetyczny sytuację społeczno – gospodarczą rewitalizowanego terenu, a także skuteczność realizacji Programu. Pozyskane z kolei od podmiotów informacje o postępie wdrażania projektów pozwalają:

1) dla projektów planowanych do realizacji i realizowanych:

- przedstawić stopień zaawansowania realizowanych zadań,

2) dla projektów zakończonych:

- wykazać osiągnięte wartości wskaźników produktu rezultatu,
- wykazać istotne zmiany wpływające na charakter projektu, jego cele, lub inne ważne warunki wdrażania, które mogłyby wpłynąć na zmianę jego celów.

Program Rewitalizacji obejmuje dwie listy projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych, których postęp monitoruje się poprzez coroczne sprawozdania:

- listę podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych obejmujących projekty, które zlokalizowane są na obszarze rewitalizacji oraz wykazują silną zbieżność z celami i kierunkami działań rewitalizacji. Ponadto lista podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych zawiera projekty, które wykazują zbieżność z zakresem wsparcia przewidzianym dla Działania 6.5. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (Priorytet Inwestycyjny 9b) i w zakresie projektów infrastrukturalnych w większości nie mogłyby być realizowane w ramach innych Priorytetów Inwestycyjnych. Celem szczegółowym tego działania jest wzmocnienie rozwoju społeczno-gospodarczego, fizycznego i przestrzennego obszarów miejskich, w tym przemysłowych,
- listę pozostałych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych obejmujących projekty i zadania, które wpisują się w cele i kierunki rewitalizacji zdefiniowane w Programie i uzupełniają podstawowe działania rewitalizacyjne.

Wszystkie działania są istotne z punktu widzenia osiągnięcia założonych celów rewitalizacji. Po przeprowadzonej w 2019 roku aktualizacji na liście projektów podstawowych znajduje się 35 projektów, zaś na liście projektów pozostałych 43 projekty złożone przez 29 podmiotów.

1. Stopień realizacji projektów i założonych celów Programu Rewitalizacji.

W 47,43 % projekty znajdują się w trakcie realizacji, dla 1,28 % projektów realizacja przewidziana jest w roku 2021, 23,08 % projektów planowane jest do realizacji w terminie późniejszym, czyli w końcowej fazie trwania Programu Rewitalizacji, natomiast odstąpiono od realizacji 3,85 % projektów. Na koniec 2020 roku 24,36 % projektów zostało zakończonych.


Na podstawie przesłanych przez 21 beneficjentów 40 kart monitorujących postęp realizacji przedsięwzięcia oraz w oparciu o informacje Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego dotyczące projektów Gminy i jej jednostek, opracowano sprawozdanie z realizacji projektów wpisanych do Programu Rewitalizacji. Poniższa Tab.1 i Wyk.1 pokazują ilości projektów w różnych fazach ich realizacji.

Tab.1. Ilość realizowanych projektów wpisanych na listy przedsięwzięć Programu Rewitalizacji z podziałem na obszary oraz na projekty zakończone, realizowane, planowane i projekty od realizacji których odstąpiono.

| Obszar | liczba projektów | Liczba projektów z listy pozostałych | Liczba projektów z listy podstawowych | Projekty zakończone | Projekty w trakcie realizacji | Projekty planowane do realizacji w 2021r. | Projekty planowane do realizacji po 2021r. | Projekty od których odstąpiono |
|------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---|--|--------------------------------|
| Podobszar A | 24 | 15 | 9 | 7 | 11 | 0 | 6 | 0 |
| Podobszar B | 15 | 11 | 4 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 |
| Podobszar C | 15 | 6 | 9 | 4 | 7 | 0 | 3 | 1 |
| Podobszar D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Podobszar E | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podobszar F | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podobszar AB | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Podobszar ABCD | 9 | 3 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Podobszar ABCDEF | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Podobszar ABD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podobszar AC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Podobszar BD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Podobszar CD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Podobszar EF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Poza obszarem | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Suma | 78 | 43 | 35 | 19 | 37 | 1 | 18 | 3 |

Źródło: opracowanie własne.

Wyk.1. Ilość realizowanych projektów rewitalizacyjnych z podziałem na projekty zakończone, realizowane, planowane i odstąpione od realizacji.

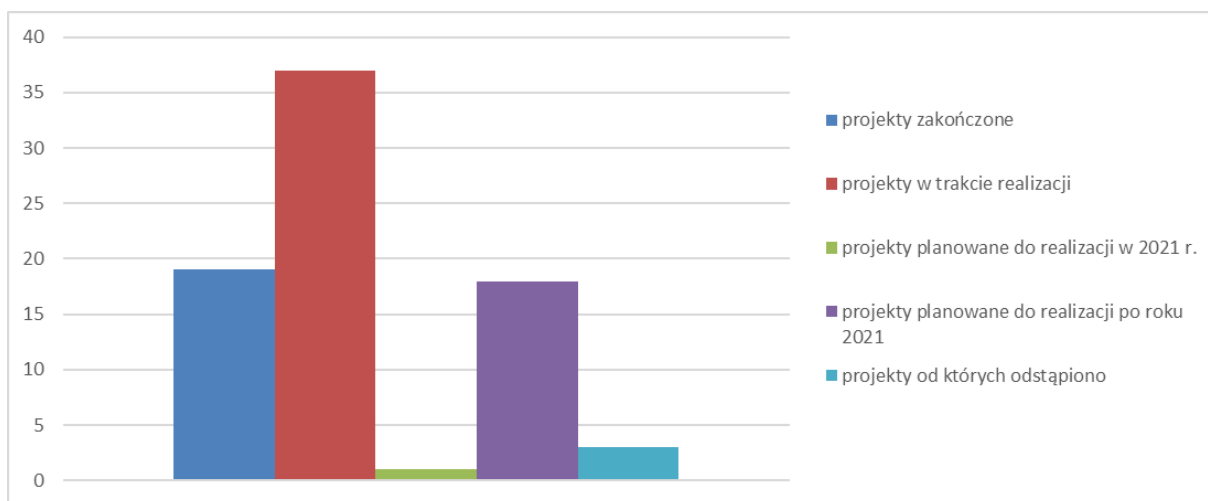

Źródło: opracowanie własne.

W 2020 roku odstąpiono od realizacji 3 zgłoszonych do Programu Rewitalizacji projektów („Utworzenie ścieżki edukacyjno-sportowej poprzez modernizację boisk sportowych, wyposażenie klasopracowni fizyczno-chemicznej i językowej oraz remont i wyposażenie szatni szkolnej – etap II” – projekt zgłoszony przez Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach, „Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK (Poddziałanie 8.3.3 RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020)” projekt zgłoszony przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 14 w Ostrowcu Świętokrzyskim, „Z wiedzą informatyczną wkraczamy we współczesny świat” projekt zgłoszony przez Zespół Szkół i Placówek Publicznych Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim).

Jak widać na powyższym wykresie, poza projektami których realizacja już się rozpoczęła we wcześniejszym okresie, prawie wszystkie projekty zakładane są do realizacji przez beneficjentów w końcowym okresie obowiązywania Programu Rewitalizacji, czyli po roku 2021. Fakt ten wynika bezpośrednio z założonego przez beneficjentów potencjalnego źródła dofinansowania, którym w przeważającej części są środki pomocowe pochodzące z programów współfinansowanych przez Unię Europejską, a które dostępne będą w dopiero tworzonej na lata 2021-2027 perspektywie finansowej.

2. Zakres i przedmiot zmian w projektach Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023.

W grudniu 2019 r przeprowadzono aktualizację Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023, w trakcie której zostało zaktualizowane 51 projektów oraz wprowadzono 11 nowych projektów. W 2020 roku w stosunku do roku 2019 zmianie (uaktualnieniu) uległy terminy realizacji poszczególnych projektów oraz planowane przez beneficjentów źródła ich finansowania.

III. Źródła finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Zabezpieczenie finansowe działań związanych z realizacją Programu Rewitalizacji stanowią przede wszystkim środki budżetowe gminy i beneficjentów oraz środki zewnętrzne pochodzące m.in. z Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Spójności). Ponadto zadania realizowane są lub będą ze środków budżetu państwa, budżetu samorządu powiatowego, innych środków publicznych, środków prywatnych oraz środków organizacji pozarządowych. Jako dodatkowe źródło środków zewnętrznych w 2020 r. zostały wskazane środki pochodzące z Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego - rezerwy Centrum Edukacji Artystycznej.


Ponadto beneficjenci jako potencjalne źródło finansowania projektów wskazali możliwość zaciągnięcia kredytów lub pożyczek. Strukturę planowanych źródeł finansowania przedstawia Tab. 2 oraz Wyk.2

Tab. 2 Planowane przez beneficjentów źródła finansowania dla projektów

| | Środki UE | Środki JST | Środki Budżetu Państwa | Kredyty | Pożyczki | Środki Mech.Finan. EOG i Norweskiego Mech. Finan. 2014 – 2021 | Środki Prywatne | Inne środki publiczne |
|-----------------|-----------|------------|------------------------|---------|----------|---|-----------------|-----------------------|
| Ilość projektów | 73 | 48 | 46 | 22 | 20 | 3 | 35 | 23 |

Źródło: opracowanie własne.

Wyk.2 Planowane przez beneficjentów źródła finansowania dla projektów

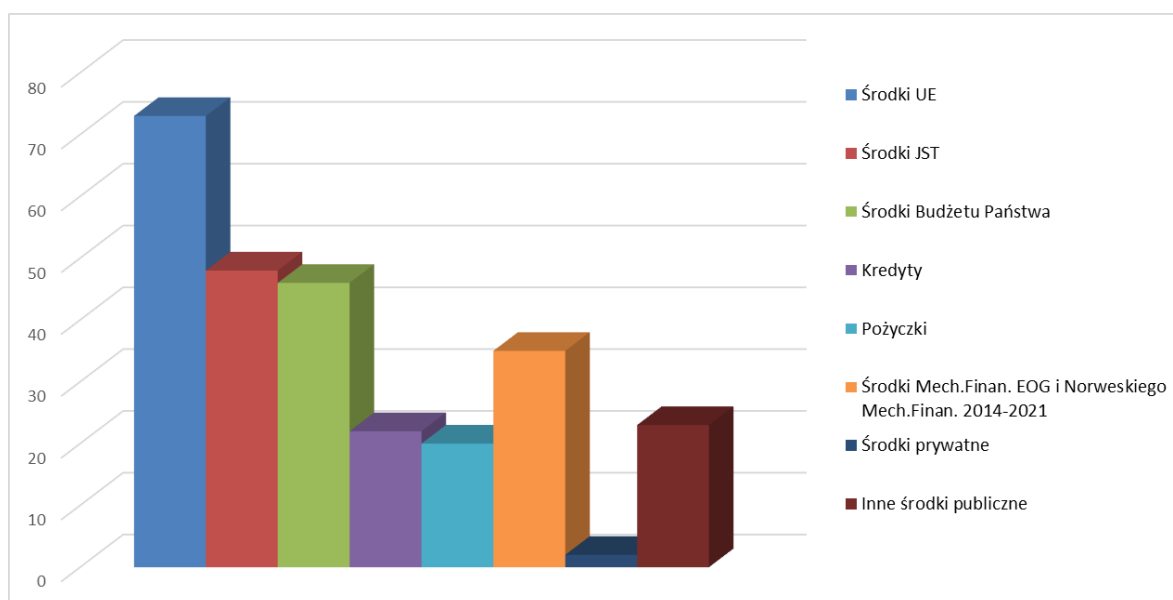

Źródło: opracowanie własne.

Jak widać z powyższych danych beneficjenci jako źródło finansowania wskazują jednocześnie więcej niż jedną możliwość pozyskania środków finansowych, głównie opierając się na

środkach pomocowych pochodzących z różnego rodzajów programów operacyjnych współfinansowanych przez Unię Europejską, środków JST oraz pochodzących z budżetu państwa.

IV. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”.

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski w partnerstwie ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Krzemionki” i Ostrowiecką Spółdzielnią Mieszkaniową realizuje w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi priorytetowej 6 „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 projekt pn.: „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”. 20 kwietnia 2018 roku umowa o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-00 została podpisana przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski jako partnera wiodącego oraz Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego. Umowa obejmuje realizację projektu składającego się z 11 zadań, które wpisane są na listę podstawowych i pozostałych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych, z czego dwa zadania zostały zrealizowane przez partnerów. Rodzaj oraz zakres realizacji poszczególnych zadań wyżej wymienionego projektu został opisany w Tab.3 oraz w zbiorczych Tab.5 i Tab.6 przedstawiających stan realizacji wszystkich projektów wpisanych do Programu Rewitalizacji.

Tab.3. Stan realizacji projektu pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno- kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego” realizowanego przez Partnerów: Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, Ostrowiecką Spółdzielnię Mieszkaniową i Spółdzielnię Mieszkaniową „Krzemionki” .

| Lp. | Nazwa zadania | Stan realizacji zadania do końca 2020r. |
|-----|---|--|
| 1. | Budowa drogi łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi | Dotychczas wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję ZRID. W roku 2020 zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę inwestycji i rozpoczęto roboty budowlane. Ich zakończenie zostało zaplanowane na czerwiec 2022 r. |
| 2. | Przebudowa ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego | Wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano niezbędne do rozpoczęcia prac budowlanych pozwolenia. Rozpoczęcie prac budowlanych zostało zaplanowane na 2021 r. |
| 3. | Zagospodarowanie części dziedzińca browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych | Zadanie polega na kompleksowym zagospodarowaniu części dziedzińca przebudowanego browaru poprzez: wykonanie parkingów, dróg dojazdowych, odwodnienia i oświetlenia terenu, modernizację budynku i wykorzystanie go na potrzeby mieszkańców i rad osiedlowych z terenu Śródmieścia oraz okalających osiedli. W 2018 r. został wykonany parking, wykonano także niezbędne rozbiórki. W 2019 r. została opracowana dokumentacja projektowa i rozpoczęto realizację robót budowlanych przy modernizacji budynku przeznaczonego na potrzeby mieszkańców i rad osiedlowych. Budynek został ukończony w 2020 r. Pozostały zakres prac zaplanowany jest na 2021 r. |
| 4. | Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej Zagospodarowanie terenu | W zadaniu ujętym w powyższym projekcie wykonana zostanie modernizacja budynku wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Osadowej. W ramach zagospodarowania terenu wykonane zostaną parkingi, oświetlenie, place zabaw, odwodnienie. Została opracowana dokumentacja projektowa, uzyskano stosowne pozwolenia. Roboty budowlane rozpoczęły się w 2020 r. Zakończyła się część obejmująca rozbiórki oraz zagospodarowanie terenu. Natomiast w odniesieniu do budynku wykonawca odstąpił od umowy. Konieczne było ponowne przeprowadzenie przetargu na wykonanie robót związanych z modernizacją budynku. Roboty będą kontynuowane w latach 2021-2022. |

| | | |
|-----|---|--|
| 5. | Rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu | Zadanie polegało na uzupełnieniu istniejącego systemu monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych i jego rozbudowaniu o 5 punktów kamerowych wraz z zakupem niezbędnych licencji, sprzętu i oprogramowania oraz przeniesieniem centrum monitoringu na ul. Świętokrzyską 22. Przedsięwzięcie zostało zakończone w 2020 roku. |
| 6. | Budowa zadaszenia części placu targowego wraz z zagospodarowaniem | Zadanie obejmuje dwie części. Pierwsza - budowa wiaty handlowej została wykonana w 2019 roku. Druga część zadania to utwardzenie północnej części targowiska, zlokalizowanej od strony schodów przy ul. Denkowskiej kostką brukową, odwodnienie terenu oraz jego oświetlenie. Realizację zagospodarowania terenu przewidziano na lata 2021-2022. |
| 7. | Budowa strefy rekreacji i wypoczynku | Zadanie zostało zakończone w roku 2019. |
| 8. | Modernizacja obiektów kultury – przebudowa budynku Kina Etiuda oraz CTH | W 2019 r. opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano stosowne pozwolenia. Realizację robót budowlanych rozpoczęto w 2020r. Zakończenie inwestycji planowane jest na 15 lipca 2022 roku. |
| 9. | Ogród Zdrowia na Osiedlu Ogrody | Zadanie polegało na wykonaniu ogrodu sensorycznego wraz z ciągiem komunikacyjnym, wyposażeniem ogrodu w małą architekturę oraz wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej. Większość robót budowlanych została przeprowadzona w roku 2020, zadanie zostało zakończone w roku 2021. |
| 10. | OSM - Rewitalizacja Parku na Osiedlu Spółdzielców | Zadanie zostało w całości zrealizowane. Została wykonana fontanna parkowa, remont chodników i alejek spacerowych, wykonano nowe nasadzenia drzew i roślin oraz rekultywację trawników, plac zabaw i siłownię zewnętrzną, wykonany został remont boiska. |
| 11. | SM Krzemionki - place zabaw, siłownie | Wykonano wszystkie roboty budowlane, został oddany parking na osiedlu Ogrody i na osiedlu Rosochy, plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna. Zadanie zostało zakończone. |

V. Wskaźniki postępu wdrażania Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023.

W 2020 r. do projektów zakończonych w poprzednich latach, dołączyło pięć kolejnych zrealizowanych przedsięwzięć:

- a. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Budowa otwarcia komunikacyjnego terenów inwestycyjnych – drogi gminnej bocznej od ulicy Bałtowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z przebudową dróg wewnętrznych
- b. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu
- c. Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa - Rewitalizacja parku na Osiedlu Spółdzielców
- d. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Remont odcinka ulicy Ostrowieckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim
- e. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Parkowej

Zakończone w 2020r. zadania stanowią 6,41 % wszystkich zaplanowanych w Programie Rewitalizacji. W sumie przez cztery lata realizacji Programu zakończono 24,36 % wszystkich zadań z listy przedsięwzięć. Sukcesywna realizacja i postęp w zakresie osiągania wskaźników dotyczących bezpośrednio produktów poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, pozwala na stopniowe osiąganie założonych w Programie rezultatów. Cele i założone rezultaty Programu w pełni osiągnięte zostaną po rzeczowej realizacji większości zaplanowanych w Programie działań. Wartości wskaźników produktu osiągnięte do końca 2020 r. w poszczególnych projektach zawiera Tab.5 i Tab.6

VI. Wskaźniki społeczno-gospodarcze rewitalizowanego obszaru

Proces monitorowania programu prowadzony jest jednocześnie na kilku płaszczyznach. Systematycznej obserwacji podlegają również zmiany zachodzące w ramach poszczególnych wskaźników społeczno-gospodarczych. Umożliwia to dostarczenie informacji na temat postępów w osiąganiu przyjętych celów oraz kwantyfikację efektów zrealizowanych projektów (zarówno ekonomicznych, jak i społecznych). Analiza wskaźnikowa, służy również do odpowiedzi na pytanie o zbieżność podejmowanych działań z osiąganymi wynikami społeczno-gospodarczymi gminy. W Tab.4 ujęto wartości wskaźników z podziałem na badane kryteria, a na Wyk. 7 przedstawiono wartości wskaźników dla badanych roczników.

Tab.4 Wartości wskaźnika dla badanych kryteriów.

| Badane kryterium | Nazwa wskaźnika | Źródło pozyskania danych | Jednostka | Wartość wskaźnika w 2015r. | Wartość wskaźnika w 2016r. | Wartość wskaźnika w 2017r. | Wartość wskaźnika w 2018r. | Wartość wskaźnika w 2019r. | Wartość wskaźnika w 2020r. |
|---|--|--------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Zmiana lub zahamowanie negatywnego trendu spadku liczby mieszkańców | Liczba mieszkańców | UM | Liczba osób | 16622 | 16472 | 16088 | 15537 | 15360 | 14760 |
| Zmniejszenie liczby osób długotrwale bezrobotnych | Liczba osób długotrwale bezrobotnych | PUP | Osoby | 607 | 456 | 364 | 321 | 271 | 305 |
| Spadek liczby osób korzystających z pomocy społecznej | Liczba osób korzystających z pomocy społecznej | MOPS | Liczba osób | 1772 | 1825 | 1622 | 1573 | 1673 | 1312 |
| Wzrost liczby osób prowadzących działalność gospodarczą | Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą | UM | Liczba osób | 907 | 983 | 1043 | 1022 | 1021 | 1091 |


Źródło: dane udostępnione przez jednostki organizacyjne Gminy i PUP.

1. Badane kryteria (wskaźniki rezultatu).

Zmiana lub zahamowanie negatywnego trendu spadku liczby mieszkańców.

Liczba ludności na obszarze rewitalizowanym w 2020 r. wyniosła 14 760 mieszkańców. Jest to niższa wartość niż w roku 2019, kiedy to wynosiła 15 360 osób (wyk.3). Nadal zatem mamy do czynienia z negatywnym trendem spadku liczby mieszkańców. Spadek ten obejmuje nie tylko obszar rewitalizowany ale całe miasto. Na koniec 2019 r. liczba ludności w całym mieście wynosiła 65 541 mieszkańców a w 2020 r. już o 1252 osób mniej tj. 64 289 mieszkańców (osoby zameldowane na pobyt stały). Miasto zмага się ze zjawiskiem depopulacji z uwagi na niewyhamowane ujemne saldo migracji, niski wskaźnik przyrostu naturalnego oraz starzenie się społeczeństwa. Dodatkowym czynnikiem depopulacyjnym jest trwająca pandemia COVID-19, zbierająca śmiertelne żniwo wśród społeczeństwa jak również powodująca kryzys gospodarczy, sprzyjający emigracji ludności do większych ośrodków w poszukiwaniu pracy.

Wyk. 3. Liczba mieszkańców na obszarze rewitalizacji.

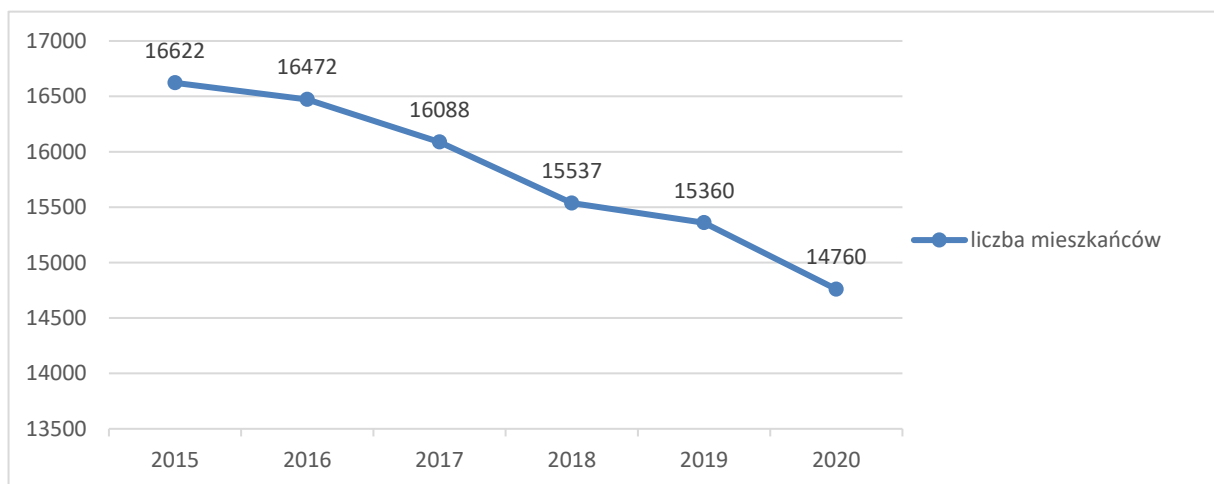


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Zmniejszenie liczby osób długotrwale bezrobotnych

Analiza wskaźnikowa tego kryterium, wskazuje na wyraźne zachwianie utrzymującej się poprawy na lokalnym rynku pracy na obszarach rewitalizowanych. Liczba długotrwale bezrobotnych na obszarze rewitalizowanym wyniosła na koniec 2020 r. 305 osób i zwiększyła się wobec 2019 r. o 34 osoby (wyk.4). Wzrost tego wskaźnika na obszarze rewitalizowanym pokrywa się ze wzrostem wartości bezrobocia w całym mieście. W 2019 r. liczba osób trwale bezrobotnych wyniosła 1094 osób, podczas gdy w 2020 r. już 1314 osoby. Mimo, iż realizowane w programie projekty z zakresu aktywizacji zawodowej są skuteczne i podtrzymywały trend spadkowy w poprzednich latach, w 2020 r. widzimy bardzo wyraźny wpływ ogólnoświatowej sytuacji gospodarczej i kryzysu związanego z pandemią COVID-19. Wiele branż bardzo boleśnie odczuło skutki przedłużających się kolejnych obostrzeń związanych z lockdownem, co niekorzystnie wpłynęło na wielkość bezrobocia.

Wyk.4. Liczba osób długotrwale bezrobotnych zamieszkujących obszar rewitalizacji.

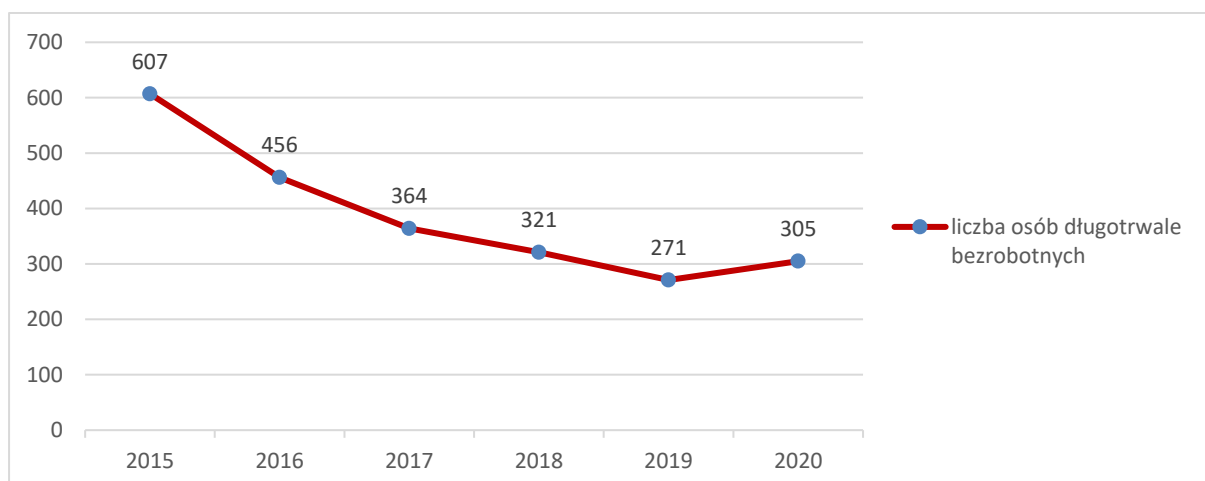


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z PUP w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Spadek liczby osób korzystających z pomocy społecznej

Przeprowadzona w programie rewitalizacji diagnoza ujawniła zjawiska społeczne, wymagające szczególnej uwagi przy planowaniu działań z zakresu pomocy społecznej. Zaliczono do nich ubóstwo. Do programu wpisano zatem szereg zadań zmierzających do ograniczenia tego problemu. Od 2016 r. obserwowany był spadek osób korzystających z usług oferowanych przez MOPS, jednakże w 2019 roku tendencja ta uległa zmianie i nastąpił wzrost liczby osób korzystających z różnych rodzajów świadczeń socjalnych. Powodem takiej sytuacji może być fakt, iż w 2019 roku nastąpił wzrost liczby świadczeniobiorców z zakresu świadczeń rodzinnych i wychowawczych. W 2020 r. pomimo panującej pandemii COVID-19 i związanych z nią problemów na lokalnym rynku pracy, a co za tym idzie zwiększoną liczbą osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej wzrost wartości tego wskaźnika został zahamowany i ponownie obniżył swoją wartość w stosunku do roku ubiegłego.

(wyk.5).

Wyk.5. Liczba osób z obszarów rewitalizacji korzystających z pomocy społecznej.




Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z MOPS w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Wzrost liczby osób prowadzących działalność gospodarczą.


Poziom przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji mierzony jest liczbą podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Do 2017 r. trwała tendencja wzrostowa, która uległa zahamowaniu w roku 2018 i 2019 r. W odniesieniu do zmniejszającej się liczby mieszkańców oznacza to, iż prowadzone działania aktywizujące są skuteczne, nawet w obliczu trudności z jakimi muszą borykać się przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w czasie pandemii COVID-19. Na koniec 2020 r. roku w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na obszarze rewitalizowanym zarejestrowanych było 1091 podmiotów. W ciągu roku liczba ta wzrosła o 70 podmiotów gospodarczych (wyk.6) w stosunku do roku 2019. Wskaźnik wzrostu ilości podmiotów gospodarczych na obszarze rewitalizowanym można zatem uznać za stabilny.

Wyk.6. Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą na obszarach rewitalizacji (zarejestrowana w CEDG)

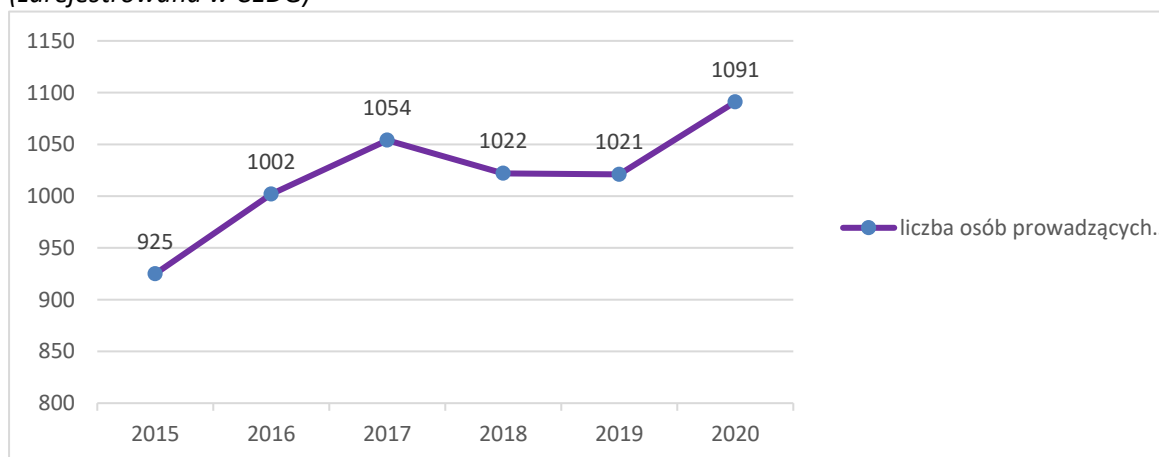

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z CEDG

Wyk. 7 Wartości monitorowanych wskaźników w latach 2015-2020

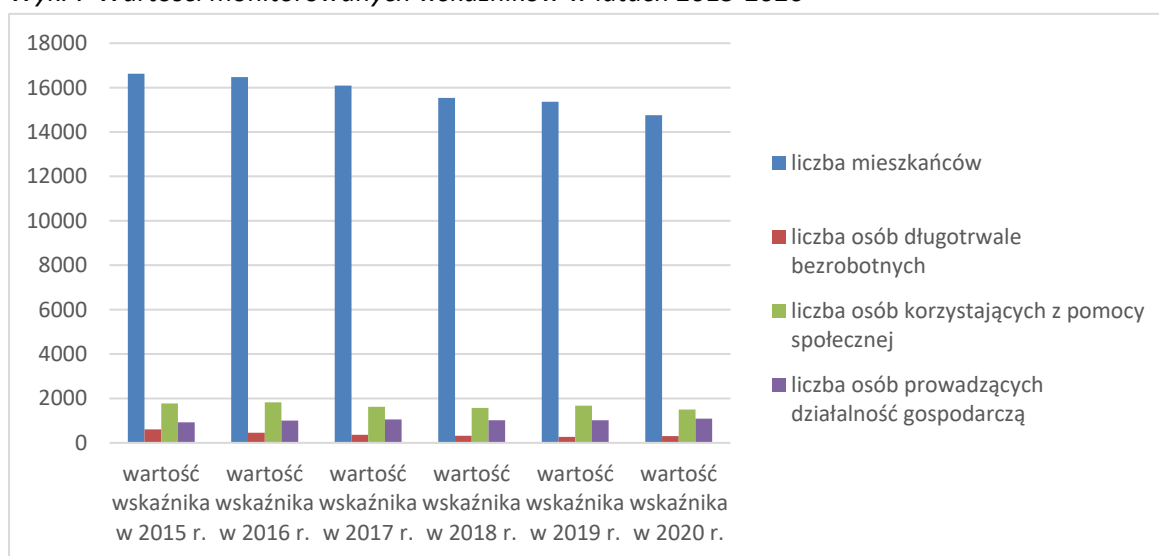

Źródło: dane gminy

VII. Podsumowanie

Podsumowując realizację zadań rewitalizacyjnych, na 78 projektów wpisanych do dwóch list projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych umieszczonych w Programie Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023, większość projektów realizowana jest przy udziale środków zewnętrznych (głównie środków unijnych).

Dwa projekty realizowane są przez Gminę w partnerstwie:

1. Ze spółdzielniami mieszkaniowymi skupiający aż 11 przedsięwzięć z Programu, w ramach działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi priorytetowej 6 „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
2. Z Powiatem Ostrowieckim w ramach działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej” Osi priorytetowej 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Na koniec roku sprawozdawczego 5 projektów zostało zakończone (łącznie ilość projektów zakończonych w Programie Rewitalizacji wynosi 19), 37 jest w trakcie realizacji, 1 zaplanowany jest do zrealizowania w roku 2021, 18 projektów zostało zaplanowane na ostatnie lata obowiązywania Programu, zaś od realizacji 3 projektów odstąpiono. Wartości wskaźników w przypadku czterech badanych kryteriów, na chwilę obecną w dwóch przypadkach wykazują pozytywny wpływ i oddziaływanie realizowanych zadań na osiągnięcie celów zamierzonych w Programie. Zachwianie pozytywnego wpływu procesu rewitalizacji obrazowane za pomocą wybranych kryteriów oceny spowodowane jest destabilizacją globalnej gospodarki, co jak widać niestety odbija się na lokalnych społecznościach. Mimo prowadzonych działań rewitalizacyjnych i działań z zakresu aktywizacji społeczeństwa ogólnokrajowe i światowe ograniczenia dotychczasowego sposobu życia mieszkańców wpłynęły negatywnie na wartości wskaźników.

Zgodnie z systemem monitorowania i oceny określonym w Programie Rewitalizacji ocena aktualności i stopnia realizacji Programu Rewitalizacji wykonywana jest co najmniej raz na trzy lata. W roku 2019 r. w wyniku przeprowadzenia oceny, dotychczasowe działania podejmowane w Programie Rewitalizacji uzyskały pozytywną opinię zarówno Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego jak i Komitetu Monitorującego z równoczesnym wskazaniem konieczności przeprowadzenia aktualizacji programu, co miało miejsce w grudniu 2019 roku.

Tab.5 Lista podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz z osiągniętymi wskaźnikami produktu i stopniem realizacji projektu.

| Lp. | Beneficjent | Nazwa projektu | Obszar Termin realizacji | Planowany zakres realizacji projektu | Wskaźnik produktu | Wartość wskaźnika w okresie sprawozdawczym stan na 31.12.2020r. | Stopień realizacji projektu |
|-----|-------------------------------|--|--------------------------|---|--|---|---|
| 1 | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski | Budowa drogi łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi | Obszar: A 2016-2023 | Zakres realizowanych zadań: Budowa alternatywnego dojazdu do Targowiska Miejskiego od ulic Chrzanowskiego oraz Kilińskiego, w skład którego wchodzić będzie budowa jezdni, chodników, ścieżki rowerowej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, miejsc parkingowych, przepustów. | Liczba zmodernizowanych / wybudowanych ciągów komunikacyjnych – 1 szt. | 0 | Zadanie realizowane w ramach projektu pn. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, na które podpisano umowę o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26- 0003/16-00 w dn. 20.04.2018r. oraz Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach zadania wykonany zostanie alternatywny dojazd do Targowiska Miejskiego od ulicy Chrzanowskiego. Jest on częścią projektu budowy układu komunikacyjnego łączącego ul. Furmańską i ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi od ul. Kilińskiego (wniosek o dofinansowanie złożony do Funduszu Dróg Samorządowych – w trakcie oceny) i ul. Denkowskiej (odcinek realizowany ze środków Funduszu Dróg Samorządowych). W roku 2019 została wykonana dokumentacja projektowa, uzyskano decyzję ZRID. W roku 2020 zostały przeprowadzone postępowania przetargowe, w wyniku których wyłoniono wykonawców inwestycji i rozpoczęto roboty budowlane. |
| 2 | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski | Budowa ul. Bocznej od ul. Kilińskiego – Andrzeja Biesiady | Obszar: A 2016-2018 | Zakres realizowanych zadań: Budowa dojazdu do Targowiska Miejskiego oraz drogi między ul. Furmańską a ul. Chrzanowskiego od ulic Chrzanowskiego, o łącznej długości 0,5km, w skład której wchodzi budowa jezdni, chodników, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, miejsc parkingowych, przepustów. | Liczba zmodernizowanych / wybudowanych ciągów komunikacyjnych – 1 szt. | 1 | Projekt zrealizowany. |
| 3 | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski | Remont dróg gminnych: ul. Siennieńskiej, ul. Okólnej, ul. Jana Głogowskiego, ul. dr Adama Wardyńskiego oraz ul. Piwnej w | Obszar: A 2017-2021 | Zakres realizowanych zadań: Remont dróg o długości ok. 1,287 km. | Liczba zmodernizowanych / wybudowanych ciągów komunikacyjnych – 2 szt. | 0 | Projekt realizowany w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W 2020 roku wykonano: - na ul. Jana Głogowskiego: remont nawierzchni drogi, chodników, zjazdów oraz skrzyżowania z ul. Siennieńską, remont i uszczelnienie kanalizacji deszczowej, remont oświetlenia polegający na wymianie opraw oświetleniowych, - na ul. Siennieńskiej: remont nawierzchni drogi, chodników, zjazdów oraz skrzyżowań, remont i uszczelnienie kanalizacji |

| | | | | | | | |
|---|--|--|---------------------------|--|--|---|--|
| | | Ostrowcu Świętokrzyskim | | | | | deszczowej, remont oświetlenia polegający na wymianie opraw oświetleniowych lub kompletnych słupów oświetleniowych, - na ul. Okólnej: remont chodników, - na ul. Adama Wardyńskiego: remont nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów do posesji, powierzchni miejsc postojowych, skrzyżowań, oświetlenia polegający na wymianie opraw oświetleniowych lub kompletnych słupów oświetleniowych, W roku 2021 zostanie wykonane oznakowanie poziome i pionowe na w/w ulicach oraz pozostałe prace związane z remontem ul. Okólnej. Prace związane z ul Piwną zostały zaplanowane do wykonania w całości w 2021 roku. |
| 4 | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski/ Polskie Koleje Państwowe | Remont kładki pieszej przy ul. F. Focha i kładki pieszej nad torami kolejowymi | Obszar: A, C 2017-2023 | Zakres realizowanych zadań: Projekt przewiduje remont kładki pieszej nad rzeką Kamienną w postaci wykonania dywanika z nawierzchni asfaltowej, odnowienia konstrukcji stalowych, remont schodów, wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, wykonanie izolacji fundamentów, montaż balustrady mostowej. Projekt przewiduje remont kładki pieszej nad torami kolejowymi pomiędzy ul. Kolejową a ul. O. Zagłoby, która łączy tereny przemysłowe i pokolejowe z drogą do centrum miasta i dworcem PKS w postaci wykonania dywanika z nawierzchni asfaltowej, odnowienia konstrukcji stalowych, remontu schodów na perony i parking zlokalizowany przy byłym dworcu PKP, wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, wykonanie | Liczba zrewitalizowanych obiektów komunikacyjnych - 2 szt. | 0 | Na 2021 rok zaplanowano remont kładki dla pieszych nad rzeką Kamienną w zakresie: - wymiany balustrad - rozbiórki i odtworzenia płyty pomostowej z elementów prefabrykowanych - oczyszczenia wraz z odtworzeniem nadmiernie skorodowanych stalowych elementów nośnych - wykonania nowej powłoki antykorozyjnej konstrukcji stalowej - wykonania wzmocnienia pasów dźwigarów w rejonie podpory pośredniej - wymiany istniejących łożysk na łożyska z elastomeru - nadbudowy istniejących ścian przyczółków do nowego poziomu pomostu - wymiany przykrycia szczelin dylatacyjnych - wykonania żywicznej nawierzchni pomostu. W zakresie kładki dla pieszych nad torami kolejowymi projekt zaplanowany jest do realizacji w partnerstwie w późniejszym okresie. |

| | | | | | | | |
|----|-------------------------------|---|---------------------------------|--|---|---|--|
| | | | | budowę 2 zatok autobusowych i 7 azyli dla pieszych, wykonanie chodników i przejść dla pieszych | | | |
| 9 | Powiat Ostrowiecki | Rozbudowa skrzyżowania ulic Żeromskiego – Szewieńska – Świętokrzyska z rozbudową mostu na rzece Modła | Obszar: C 2020-2022 | Zakres realizowanych zadań: - przebudowa istniejącego skrzyżowania na bezkolizyjne; - wykonanie nawierzchni z mieszanki odpornej na koleinowanie; - budowa ścieżki rowerowej; - przebudowa chodników; - przebudowa oświetlenia ulicznego; - budowa kanalizacji deszczowej; - przebudowa infrastruktury technicznej; - rozbudowa mostu poprzez poszerzenie obiektu (w chwili obecnej szerokość jezdni na moście wynosi 5,45m, co stanowi 2 pasy ruchu, szerokość chodników prawego i lewego wynosi po 1,05m). | Liczba zmodernizowanych / wybudowanych ciągów komunikacyjnych – 1 szt. | 0 | W zależności od ogłoszonych naborów oraz dostępności środków w ramach programów krajowych planowane jest przygotowanie projektu pod względem dokumentacyjnym. Realizacja projektu planowana jest po roku 2021. |
| 10 | Powiat Ostrowiecki | Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Świętokrzyskiej i Alei Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim | Obszar: C, D 2020-2022 | Zakres realizowanych zadań: Budowa ścieżek rowerowych w ciągu dróg powiatowych ul. Świętokrzyskiej i Alei Jana Pawła II, w tym: - rozbiórka starych ścieżek i chodników, - przebudowa kolizji infrastruktury technicznej, - wykonanie podbudowy, - budowa nowych asfaltowych ścieżek rowerowych. | Liczba zmodernizowanych / wybudowanych ciągów komunikacyjnych – 1 szt. | 0 | W 2020 roku nie aplikowano o środki zewnętrzne z uwagi na brak środków finansowych w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na realizację pełnego zakresu planowanego przedsięwzięcia. Realizacja projektu planowana jest po roku 2021. |
| 11 | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski | Zagospodarowanie części dziedzica browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych | Obszar: A 2018-2021 Nowy termin | Zakres realizowanych zadań: Utworzenie terenów zielonych z małą architekturą, chodnikami, oświetleniem, terenem do wystaw plenerowych oraz modernizacją budynku i przystosowaniem go na | Wskaźniki produktu: Liczba zrewitalizowanych przestrzeni publicznych – 1szt. | 0 | Zadanie w ramach projektu pn. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, na które podpisano umowę o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-00 w dn. 20.04.2018r. Zadanie polega na kompleksowym zagospodarowaniu części dziedzica przebudowanego browaru poprzez: wykonanie parkingów, dróg dojazdowych, |

| | | | | | | | |
|----|-------------------------------|---|------------------------------|--|--|------------|--|
| | | | | potrzeby aktywizacji mieszkańców osiedli oraz spotkania rad osiedlowych. | | | odwodnienia i oświetlenia terenu, modernizację budynku i wykorzystanie go na potrzeby mieszkańców i rad osiedlowych z terenu Śródmieścia oraz okalających osiedli. W 2018 r. został wykonany parking, wykonano także niezbędne rozbiórki. W 2019 r. została opracowana dokumentacja projektowa, uzyskano niezbędne pozwolenia i rozpoczęto realizację robót budowlanych przy modernizacji budynku. Budynek został ukończony w 2020 r. Pozostały zakres prac zaplanowany jest na 2021 r. |
| 12 | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski | Zagospodarowanie terenu oraz modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Osadowej i Świętokrzyskiej | Obszar: C 2016-2023 | <p>Problem: Zły stan techniczny obiektów mieszkalnych wielorodzinnych oraz terenów okalających, braki w infrastrukturze technicznej.</p> <p>Zakres realizowanych zadań: Modernizacja i odnowienie budynków wielorodzinnych (socjalnych i komunalnych), zaliczonych do ewidencji zabytków gminnych zlokalizowanych przy ul. Osadowej i Świętokrzyskiej – termomodernizacja i modernizacja elewacji, remont instalacji wewnętrznych, remont dachu, urządzenia zorientowane na efektywne wykorzystanie energii wraz z zagospodarowaniem terenu (parkingi, oświetlenie, place zabaw, odwodnienie) oraz przystosowaniem infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych.</p> | <p>Liczba zrewitalizowanych obiektów mieszkalnych – 6 szt. Liczba zrewitalizowanych przestrzeni publicznych – 2 szt.</p> | 0 1 | <p>Część zadania realizowana jest w ramach projektu pn.: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, na które podpisano umowę o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-00 w dn. 20.04.2018r.</p> <p>W zadaniu ujętym w powyższym projekcie wykonana zostanie modernizacja budynku wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Osadowej. W ramach zagospodarowania terenu przewidziano wykonanie parkingów, oświetlenia, placów zabaw, odwodnienia. Została opracowana dokumentacja projektowa, uzyskano stosowne pozwolenia. Roboty budowlane rozpoczęły się w 2020 r. Zakończyła się część obejmująca rozbiórki oraz zagospodarowanie terenu. Natomiast w odniesieniu do budynku wykonawca odstąpił od umowy. Konieczne było ponowne przeprowadzenie przetargu na wykonie robót związanych z modernizacją budynku. Roboty będą kontynuowane w latach 2021-2022.</p> |
| 13 | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski | Rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu | Obszar: A,B,C,D 2019-2020 | Zakres realizowanych zadań: Uzupełnienie istniejącego systemu monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych i jego rozbudowanie o 5 punktów kamerowych wraz z zakupem niezbędnych licencji, sprzętu i oprogramowania oraz przeniesieniem centrum | Liczba obszarów, na których zwiększono bezpieczeństwo – 4 szt. | 4 | Zadanie w ramach projektu pn.: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, na które podpisano umowę o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-00 w dn. 20.04.2018r. Projekt zrealizowany. |

| | | | | | | | |
|----|---|--|---------------------------------------|---|---|------------|---|
| | | | | monitoringu do siedziby Straży Miejskiej, zlokalizowanej w dzielnicy Częstocice. | | | |
| 14 | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski | Budowa zadaszenia części placu targowego wraz z zagospodarowaniem | Obszar: A 2016-2022 Nowy termin | Zakres realizowanych zadań: Przebudowa przestrzeni publicznej i budowa, w miejsce starych zniszczonych magazynów oraz na otwartej przestrzeni, zadaszonej wiaty handlowo-usługowej wraz z utwardzeniem, odwodnieniem i oświetleniem części placu targowego oraz utworzeniem miejsc parkingowych. | Liczba zrewitalizowanych przestrzeni publicznych – 1 szt. Liczba przygotowanych przestrzeni dla podmiotów gospodarczych – 1 szt. | 0 1 | Zadanie w ramach projektu pn.: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, na które podpisano umowę o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-00 w dn. 20.04.2018r. Budowa wiaty handlowej została wykonana w roku 2019, natomiast zakończenie realizacji zagospodarowania terenu przewidziano na 2022 rok. |
| 15 | Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń | Rewitalizacja, adaptacja i modernizacja terenów byłej Cukrowni „Częstocice” w celu nadania im nowej funkcji użytkowej i kulturalnej – Utworzenie Parku Przemysłowego z Izbą Pamięci Cukrownictwa | Obszar: C 2017-2021 | Zakres realizowanych zadań: - kompleksowy remont i modernizacja najstarszej zabytkowej części budynku pofabrycznego byłej Ocukrowni; - remont i modernizacja pozostałych budynków wchodzących w skład strefy objętej nadzorem konserwatorskim (w zakresie ograniczonym do posiadanych środków w ramach projektu); - przebudowa i remont istniejącego uzbrojenia terenu; - budowa sieci oświetlenia terenu wokół i wewnątrz obiektu; - budowa systemu dróg, parkingów, chodników itp. | Liczba zrewitalizowanych przestrzeni publicznych – 1 szt. Liczba zrewitalizowanych obiektów poprzemysłowych – 1 szt. | 0 1 | W ramach realizowanego projektu dotychczas wykonano: przyłącze energii elektrycznej, instalacji wewnętrznych, przyłącze wody, przyłącze C.O. wraz z nową instalacją, remont węzłów sanitarnych. W Sali Izby na I piętrze wykonano montaż klimatyzacji, ponadto zakupiono wyposażenie do Sali wystawowej. W 2018 roku udostępniono sale konferencyjną wraz z wystawą poświęconą historii cukrownictwa w Polsce. W 2019 roku wykonano remont pomieszczeń na parterze budynku z przeznaczeniem na kolejną ekspozycję historyczną. W 2020 roku zakończono rozbudowę budynku o zewnętrzną klatkę schodową wraz budową szybu windowego. Cały dotychczas wykonany zakres prac Krajowa Spółka Cukrowa realizuje z własnych środków finansowych. |
| 16 | Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim | Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem otoczenia Centrum Aktywności Obywatelskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim | Projekt poza obszarem 2018-2023 | Zakres realizowanych zadań: Projekt zakłada kompleksowy remont i adaptację budynku byłej Szkoły Podstawowej nr 4. na potrzeby Centrum Aktywności Obywatelskiej: remont/przebudowę sal szkoleniowych, biur, toalet, ciągów komunikacyjnych oraz dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo | Liczba obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej, poddanych rewitalizacji – 1 szt. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 1 szt. | 0 0 | Na realizację zadanie w 2020 roku aplikowano o środki zewnętrzne z Funduszy Norweskich i EOG. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w 2021 roku. |

| | | | | | | | |
|----|-------------------------------|--|---------------------|---|--|------------|--|
| | | | | (zakup i montaż platformy schodowej), dostosowanie do potrzeb osób niedosłyszących (zakup i instalacja pętli indukcyjnych w salach szkoleniowych), zakup nowoczesnego sprzętu multimedialnego na potrzeby wyposażenia sal. Planuje się również modernizację terenu przyległego, budowę parkingu i posadzenie zieleni na obszarach rewitalizowanych. | | | |
| 17 | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski | Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych na osiedlu Stawki | Obszar: B 2019-2023 | Zakres realizowanych zadań: Budowa terenów rekreacyjno-sportowych i wypoczynkowych w pobliżu zbiornika retencyjnego Stawki II (plac zabaw, siłownia plenerowa, tereny zielone, mała architektura, ścieżki piesze i rowerowe, miejsca wypoczynku, parkingi, tereny pod imprezy okolicznościowe). | Liczba zrewitalizowanych przestrzeni publicznych – 1 szt. | 0 | Projekt zaplanowany do realizacji po 2021 roku. |
| 18 | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski | Budowa strefy rekreacji i wypoczynku | Obszar: C 2016-2019 | Zakres realizowanych zadań: Budowa strefy rekreacji składającej się z placu zabaw, siłowni zewnętrznej, boiska wielofunkcyjnego. | Liczba zrewitalizowanych przestrzeni publicznych – 1 szt. | 1 | Zadanie w ramach projektu pn.: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, na które podpisano umowę o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26- 0003/16-00 w dn. 20.04.2018r. Zadanie zrealizowano. |
| 19 | Powiat Ostrowiecki | Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim | Obszar: C 2020-2023 | Zakres realizowanych zadań: Projekt będzie polegał na: - budowie boiska wielofunkcyjnego do gry w piłkę ręczną, siatkówkę i tenisa, - budowie hali sportowej (sala sportowa z zapleczem dwukondygnacyjnym) wraz z niezbędnymi przyłączami, - zagospodarowaniu terenu, tj. budowie dróg wewnętrznych i parkingów oraz urządzeniu terenów zielonych. | Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury sportowej – 2 szt. Liczba zmodernizowanych / wybudowanych ciągów komunikacyjnych – 1 szt. | 0 0 | Projekt zaplanowany do realizacji po 2021 roku. |

| | | | | | | | |
|----|---|--|---------------------------------|--|--|---|---|
| 20 | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski / Miejskie Centrum Kultury | Modernizacja obiektów kultury – przebudowa budynku Kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa | Obszar: A 2015-2022 | <p>Zakres realizowanych zadań: Modernizacja budynku Kina Etiuda znajdującego się w Gminnej Ewidencji Zabytków, roboty ogólnobudowlane całego budynku wraz z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, wymiana instalacji sanitarnych, elektrycznych, wykonanie klimatyzacji i wentylacji mechanicznej sali kina, remont, dachu, zakup wyposażenia, itp.</p> <p>W budynku utworzone zostanie multimedialne Centrum Tradycji Hutnictwa, które stworzy możliwości do poszerzenia oferty kulturalnej, edukacyjnej i turystycznej regionu. CTH będzie gromadziło pamiątki, materiały i archiwalia świadczące o dziedzictwie kulturowym, jakim jest kilkusetletnia tradycja przemysłowa regionu. Wpływie to na rozwój kultury i turystyki w oparciu o zasoby dziedzictwa kulturowego regionu. Zaletą utworzenia centrum będzie także poszerzenie i poprawa edukacji przede wszystkim wśród młodzieży. Nastąpi podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców regionu na temat ich przeszłości oraz wzrost integracji lokalnych środowisk kulturotwórczych.</p> | Liczba zrewitalizowanych obiektów kultury – 1 szt. | 0 | <p>Zadanie w ramach projektu pn.: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, na które podpisano umowę o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26- 0003/16-00 w dn. 20.04.2018r.</p> <p>Realizację robót budowlanych rozpoczęto we wrześniu 2020r. Zakończenie inwestycji planowane jest na III kw.2022 r.</p> |
| 21 | Powiat Ostrowiecki/ Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim | Renowacja i modernizacja Pałacu Wielopolskich w ramach projektu pn.: „Zwiększenie dostępności do | Obszar: C 2017-2021 Nowy termin | <p>Zakres realizowanych zadań: - ocieplenie ścian zewnętrznych Pałacu Wielopolskich poniżej terenu,</p> | Liczba zrewitalizowanych obiektów kultury – 1 szt. | 0 | <p>Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. W 2020 roku rozpoczęto prace budowlane, konserwatorskie i instalacyjne w Pałacu Wielopolskich oraz prace na terenie Rezerwatu Krzemionki. Zaktualizowano okres realizacji projektu na lata 2017-2021. Na 2021 rok planowane są prace wykończeniowe</p> |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------------------|---|---------------------|---|--|---|---|
| | | Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich | | <ul style="list-style-type: none"> - wymiana pokrycia dachowego wraz z renowacją istniejącej więźby dachowej, - renowacja istniejącego parkietu w poszczególnych salach ekspozycyjnych, - wykonanie instalacji odgromowej, - prace budowlane, konserwatorskie, sztukatorskie i instalacyjne w korpusie głównym pałacu, - montaż instalacji włamania, napadu i kontroli dostępu w korpusie głównym i bocznych skrzydłach pałacu, galerii obrazów oraz na obu kondygnacjach, - instalacja telewizji przemysłowej CCTV w korpusie głównym i bocznych skrzydłach pałacu oraz na zewnątrz budynku (zabezpieczenie terenu parkowego), - modernizacja opaski z kostki kamiennej wokół budynku oraz jej uzupełnienie, - przebudowa istniejących ciągów pieszych oraz drogi dojazdowej do pałacu wraz z uporządkowaniem zagospodarowania zieleni na terenie zespołu parkowego. | | | wewnątrz budynku, jak również na zewnątrz. Zostanie zagospodarowany i uporządkowany teren zieleni na terenie zespołu parkowego wokół Pałacu Wielopolskich. Przebudowane zostaną istniejące ciągi piesze oraz droga dojazdowa do pałacu. |
| 22 | Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa | Rewitalizacja parku na Osiedlu Spółdzielców | Obszar: A 2018-2020 | <p>Zakres realizowanych zadań: Rewitalizacja parku osiedlowego polegająca na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - remoncie boiska z przekształceniem go na kreatywną strefę zabaw, - remoncie fontanny i zagospodarowaniu terenu wokół niej, - remoncie alejek spacerowych i terenów zielonych, | Liczba zrewitalizowanych przestrzeni publicznych – 1 szt. | 1 | Zadanie w ramach projektu pn.: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, na które podpisano umowę o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26- 0003/16-00 w dn. 20.04.2018r. Projekt zrealizowany. |

| | | | | | | | |
|----|---|--|---------------------------|---|--|-------------------|--|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> - montażu urządzeń zabawowych oraz sztucznej nawierzchni na placach zabaw w celu zwiększenia bezpieczeństwa osób korzystających, - powiększeniu siłowni zewnętrznej o nowe urządzenia do ćwiczeń, - zwiększeniu ilości miejsc do wypoczynku (ławki, kosze itp.). | | | |
| 23 | Towarzystwo Przyjaciół Denkowa; Parafia Rzymsko Katolicka pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim; Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ostrowieckiej | Budowa ścieżki rekreacyjno-edukacyjnej | Obszar: A 2020-2023 | <p>Zakres realizowanych zadań:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wytyczenie, oznaczenie i urządzenie ścieżki edukacyjnej, - urządzenie miejsc parkingowych - odnowienie zabytkowych figurek, krzyży i kapliczek, - remont zabytkowej dzwonnicy wraz z opracowaniem stałej ekspozycji pn. „Z dziejów Denkowa i Parafii Denkowskiej”, - zagospodarowanie terenu przy ul. Mostowej przy kładce pieszej, - modernizację chodników oraz zieleńców, - przebudowa/budowa nawierzchni ulic, - ustawienie tablic informacyjno-edukacyjnych, - wkomponowanie przy projektowanej ścieżce edukacyjnej trwałych elementów zieleni. | <p>Liczba zrewitalizowanych przestrzeni publicznych – 1 szt.</p> <p>Liczba ścieżek edukacyjnych – 1 szt.</p> | <p>0</p> <p>0</p> | Nie aplikowano o środki zewnętrzne z powodu braku środków na wkład własny. Projekt planowany do realizacji po 2021 roku. |
| 24 | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski | Zagospodarowanie terenów zielonych, sportowo-rekreacyjnych i centrów osiedli | Obszar: A,B,C,D 2017-2023 | <p>Zakres realizowanych zadań:</p> <p>Rewitalizacja centrów osiedli poprzez renowację boiska przy ul. Dziewulskiego, przebudowę kortów tenisowych, zagospodarowanie obszarów małą architekturą, budowę placów zabaw, wyposażenia w urządzenia terenów</p> | <p>Liczba zrewitalizowanych przestrzeni i obiektów publicznych – 6 szt.</p> | 4 | W 2020 roku nie były prowadzone prace w zakresie projektu. |

| | | | | | | | |
|----|---|--|---------------------|--|---|-----|---|
| | | | | rekreacyjno-sportowych, budowę parkingów, doposażenie placów zabaw, budowę oświetlenia boisk i placów zabaw, budowę punktów monitorowania bezpieczeństwa publicznego. | | | |
| 25 | Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” w Ostrowcu Św. | Budowa placu zabaw w rejonie budynków nr 31 - 34 na os. Rosochy oraz budowa siłowni zewnętrznej pomiędzy budynkami nr 25 - 27 na os. Rosochy, a ul. Słoneczną w Ostrowcu Św. | Obszar: B 2019 | Zakres realizowanych zadań: Budowa placu zabaw: - dostawa i montaż urządzeń zabawowych, - wykonanie ogrodzenia placu zabaw, - zagospodarowanie terenu, - budowa siłowni zewnętrznej, - zagospodarowanie terenu. | Liczba zrewitalizowanych przestrzeni – 2 szt. | 2 | Projekt zrealizowany. |
| 26 | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski | Zagospodarowanie Parku Fabrycznego oraz parku w Częstocicach | Obszar: C 2017-2023 | Zakres realizowanych zadań: Zagospodarowanie parków poprzez małą architekturę, zieleń, urządzenia sportowo-rekreacyjne. | Liczba zrewitalizowanych przestrzeni publicznych – 2 szt. | 1 | W 2020 roku nie prowadzono prac w ramach projektu. |
| 27 | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski | Ogród Zdrowia na Osiedlu Ogrody | Obszar: B 2017-2021 | Zakres realizowanych zadań: Ogród podzielony zostanie na 5 stref zmystów służących terapii i edukacji. Zakres zadań obejmuje: - wykonanie ciągów komunikacyjnych, placów, nawierzchni sensorycznych, - zagospodarowanie placu zabaw, - zagospodarowanie siłowni zewnętrznej, - zagospodarowanie zielonej klasy, - montaż elementów małej architektury i elementów wyposażenia, tj. pergola, ławki, kosze stojaki na rowery, - nasadzenia roślin, - założenie trawników, - roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i budowlane. | Liczba zrewitalizowanych przestrzeni – 1 szt. | 0 | Zadanie w ramach projektu pn.: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, na które podpisano umowę o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26- 0003/16-00 w dn. 20.04.2018r. W 2020 roku została wykonana większość robót budowlanych. |
| 28 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | Rozwój wysokiej jakości usług | Obszar realizacji | Zakres realizowanych zadań: | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub | 645 | W wyniku realizacji programu w 2020 roku udzielono wsparcia w następującym zakresie: |

| | | | | | | | |
|----|--|---|--|---|---|--------|---|
| | w Ostrowcu Świętokrzyskim | społecznych – „Razem Raźniej” | całego projektu – powiat ostrowiecki; działań MOPS – gmina Ostrowiec Św. 2019-2021 | <p>1. Wsparcie dla usług opiekuńczych - asystenckich, m.in. w formie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej oraz pomoc sąsiedzka dla osób niesamodzielnych (zadanie MOPS).</p> <p>2. Szkoła Rodziny - Wsparcie rodziny poprzez poradnictwo, warsztaty (zadanie MOPS) dla rodzin z wyzwaniami.</p> <p>3. Punkt Interwencji Kryzysowej (zadanie PCPR) - dla osób borykających się z problemem przemocy domowej.</p> <p>4. Wsparcie na rzecz osób funkcjonujących w pieczy zastępczej, wsparcie procesu usamodzielniania, w tym zakup mieszkań chronionych, szkolenia dla rodzi zastępczych (zadanie PCPR).</p> <p>5. Aktywizacja społeczna dla rodzin zastępczych oraz osób opuszczających pieczę zastępczą (zadanie ZDZ).</p> | wykluczeniem społecznym objętych wsparciem – 374 | | <p>Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 174</p> <p>Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.] – 2</p> <p>Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami w postaci mieszkań chronionych i wspomaganych w programie – 6</p> <p>Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie – 191</p> <p>Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie – 16</p> <p>Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie – 31.</p> |
| 29 | Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim | Rozwój i wsparcie przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie Targowisk Miejskich | Obszar: A 2017-2023 | Zakres realizowanych zadań: Działania w ramach projektu prowadzić będą do zapewnienia organizacji parasolowej, wspierającej przedsiębiorców. Działania będą związane także z podnoszeniem kwalifikacji kadr Agencji Rozwoju Lokalnego jako instytucji otoczenia biznesu, tak, by zapewnić ostrowieckim przedsiębiorcom dostęp do fachowych usług i konsultantów posiadających aktualną wiedzę z zakresu nowoczesnego wsparcia przedsiębiorczości. | Liczba osób/podmiotów objętych wsparciem – 30 /10 | 195/73 | <p>W roku 2020 zrealizowano następujące szkolenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • „Zrób to sam, czyli jak prawidłowo wypełnić wniosek o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej” • „Środki na START” <p>Zorganizowano konkurs plastyczny „Lokalne NIEBANALNE”, pracowano nagranie i opublikowano filmy informacyjne, przeprowadzono konsultacje osobiste, telefoniczne oraz mailowe.</p> |

| | | | | | | | |
|----|--|--|---------------------------|---|---|---|--|
| | | | | <p>Ponadto odbiorcą projektu będą przedsiębiorcy prowadzący działalność handlową na terenie Targowisk Miejskich. Projekt obejmuje działania takie jak: preferencyjne ceny usług dla biznesu, tj. prowadzenia księgowości, obsługi prawnej, pozyskiwania środków na rozwój działalności gospodarczej, a także bezpłatne usługi w zakresie marketingu i doradztwa dla przedsiębiorców, coaching, mentoring, organizacja izby gospodarczej, rzecznictwo interesów przedsiębiorców, promocja oferty handlowej przedsiębiorców, podnoszenie standardów obsługi klienta, szkolenia w zakresie sprzedaży, merchandising, budowa marki i inne działania świadomościowe, których celem jest zwiększenie liczby osób robiących zakupy na terenie Targowisk Miejskich, a tym samym wsparcie rozwoju przedsiębiorstw działających w ramach Targowisk.</p> | | | |
| 30 | Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim | Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych w Ostrowcu Świętokrzyskim | Obszar: A,B,C,D 2017-2023 | Zakres realizowanych zadań: - wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na obszarach rewitalizowanych - wsparcie firm w początkowym okresie działalności na obszarach rewitalizowanych poprzez zastosowanie następujących instrumentów: coaching, diagnoza kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo, | Liczba przedsiębiorstw, które skorzystają ze wsparcia – 40 Liczba osób, które otrzymały informację o środkach na podjęcie działalności gospodarczej – 25 | Liczba przedsiębiorstw, które skorzystają ze wsparcia – 114 Liczba osób, które otrzymały informację o środkach na podjęcie działalności gospodarczej – 300 | W ramach przedsięwzięcia rewitalizacyjnego w roku 2020 r. zrealizowano: 1. Szkolenie bezpłatne „Zrób to sam, czyli jak prawidłowo wypełnić wniosek o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej” 2. Udział w konferencji „Innowacje i przedsiębiorczość w Polsce Wschodniej. Prezentacja oferty PARP, w tym Funduszy Norweskich.” 3. Szkolenie bezpłatne „Środki na START” 4. Konkurs plastyczny „Lokalne NIEBANALNE” 5. Udział w Webinarium dot. wsparcia dla sektora MŚP oferowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości 6. Udział w Webinarium pod nazwą „Plan Pracy i Rozwoju” dla sektora MŚP przeprowadzonym przez Polską Agencję Rozwoju |

| | | | | | | | |
|----|--|---|---------------------------|--|---|-----|---|
| | | | | <p>szkolenia, informacja na temat dostępnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, informacja na temat wsparcia pomostowego, ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, kursy i szkolenia w zakresie tworzenia nowoczesnych modeli biznesowych budowy i rozwoju firm, poradnictwo w zakresie prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej itp. poprzez porady prawne, podatkowe, marketingowe, promocja przedsiębiorstw i przedsiębiorczości itp.</p> | | | <p>7. Opracowanie, nagranie i opublikowanie filmów informacyjnych :</p> <ul style="list-style-type: none"> • „Środki na podjęcie jednoosobowej działalności gospodarczej” • „Zakładanie jednoosobowej działalności gospodarczej” • „Spółdzielnia socjalna – ważny podmiot ekonomii społecznej” • „Wsparcie dla firm” • „Jak wypełnić wniosek o dofinansowanie jednoosobowej działalności gospodarczej – środki unijne” • „Budżet nastolatka – jak dzielić i rządzić” • „Pomysł na stowarzyszenie” <p>8. Konsultacje osobiste, telefoniczne, mailowe. Tematyka konsultacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> • środki na podjęcie działalności gospodarczej • zasady wypełniania wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej • konsultowanie wypełnionych wniosków o dofinansowanie działalności gospodarczej • rejestracja firmy • ulgi dla nowych przedsiębiorców • formy wsparcia z PUP dla pracodawców • zakładanie firmy • środki na rozwój działalności gospodarczej • dokumenty aplikacyjne <p>9. Zamieszczanie i promowanie informacji związanych z przedsiębiorczością, samozatrudnieniem na stronie internetowej ARL Sp. z o.o. (www.arl.ostrowiec.pl) oraz fanpejdżu (www.facebook.com/ARLOstrowiecSwietokrzyski/)</p> |
| 31 | Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim | Gminne Centrum Informacji w Ostrowcu Świętokrzyskim | Obszar: A,B,C,D 2017-2023 | <p>Zakres realizowanych zadań: Projekt przewiduje pomoc i koordynację działań mających na celu rozwiązywanie problemów w sferze społecznej, edukacyjnej wśród mieszkańców miasta zamieszkujących obszary rewitalizacji. Wśród działań przewidywane są:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Szkolenia aktywizacji zawodowej, przedsiębiorczości i rynku pracy: szkolenia z obszaru umiejętności osobistych pracownika, z zakresu umiejętności informatycznych, warsztaty z | Liczba osób uczestniczących w projekcie – 100 | 122 | <p>W ramach Gminnego Centrum Informacji prowadzone jest doradztwo i poradnictwo, dotyczące przybliżenia informacji na temat ofert pracy oraz wymagań pracodawców. Oferowana jest pomoc w przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych, udostępniane są informacje o firmach poszukujących pracowników. Przygotowano dokumenty dla 7 osób, przeprowadzono 36 spotkań konsultacyjnych dot. ofert pracy, pomocy w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych.</p> <p>Z powodu pandemii korona wirusa zwiększono ilość konsultacji telefonicznych oraz kontaktów poprzez pocztę elektroniczną. Przeprowadzono 44 konsultacje w trybie on-line oraz telefonicznie.</p> <p>Udzielano także informacji dotyczących szkoleń i przekwalifikowania.</p> <p>W ramach usługi GCI prowadzono też akcję informacyjną na temat projektów związanych z dofinansowaniem zakładania własnej działalności gospodarczej</p> |

| | | | | | | | |
|----|--|---|-----------------------------|---|--|-----------------------|---|
| | | | | rewitalizacją w Ostrowcu Św., a także takie, które chcą rozpocząć swoją działalność na tym obszarze lub na terenie miasta; przedstawiciele grup nieformalnych, aktywni obywatele społeczności, którzy chcą realizować projekty i inicjatywy społeczne. Wsparcie będzie udzielane bez względu na wiek – będą z niego korzystać zarówno przedstawiciele młodzieży, jak i seniorzy realizujący inicjatywy na tych obszarach. Wsparcie w ramach projektu udzielane będzie bezpłatnie i obejmować będzie następujący zakres usług: poradnictwo, szkolenia, seminaria, spotkania informacyjne, udostępnianie zaplecza techniczno-lokalowego, wydanie broszury informacyjnej „ABC uzależnień. Vademecum organizacji pomocowych i pozarządowych”. | | | <ul style="list-style-type: none"> • „Wsparcie sektora pozarządowego przez administrację i biznes” – transmisja debaty on-line zorganizowanej przez Fundację Uniwersyteckich Porad Prawnych • Szkolenie „Ochrona danych osobowych w organizacjach pozarządowych” zorganizowane przez agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w ramach CWISE. • „Profilaktyczne ABC z elementami przedsiębiorczości i doradztwa kariery” – doradztwo zawodowe, ja przedsiębiorczy obywatel, „bądź aktywny, kreatywny, względem nałogów negatywny” • „Profilaktyka zachowań ryzykownych z uwzględnieniem zainteresowań jako czynnika chroniącego i czynnika sukcesu edukacyjno-zawodowego” <p>Wspólnie z organizacjami, instytucjami przygotowywano wnioski, konsultowano, część wspólnie realizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • „BĄDŹ ZAWODOWCEM. Rozwijamy kształcenie zawodowe w Ostrowcu Świętokrzyskim” • „Dzieciaki na 5+” w partnerstwie z Polskim Czerwonym Krzyżem/Świętokrzyskim Oddziałem Okręgowego Polskiego Czerwonego • „Nowe perspektywy dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego” • „Silni w walce z korona wirusem” – wniosek przygotowywany wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim |
| 34 | Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim | Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar rewitalizowany | Obszar: A,B,C,D 2017 - 2023 | Zakres realizowanych zadań: W projekcie realizowane będą zindywidualizowane i kompleksowe działania prowadzące do poprawy poziomu aktywności zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Wsparcie osób w ramach projektu będzie odbywało się w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej z osób. Zastosowane zostaną instrumenty i narzędzia aktywnej integracji na rzecz osób doświadczających wykluczenia społecznego w wymiarze zawodowym i | Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje – 100 Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu projektu – 20 Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym objętych wsparciem – 150 | 18 7 23 | W związku z brakiem dedykowanych programów , w roku 2020 projekt nie był realizowany. |

| | | | | | | | |
|----|---|---------------------|---------------------|--|--|------------|---|
| | | | | społecznym, zmierzające do eliminacji barier w procesie aktywizacji społeczno-zawodowej i prowadzących do zmniejszenia ryzyka zjawiska wykluczenia. Działania w ramach projektu ukierunkowane będą na potrzeby osób w trudnej sytuacji na rynku pracy, doświadczające wykluczenia wielokrotnego. | | | |
| 35 | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Henryka Sienkiewicza | „Sportowa Siódemka” | Obszar: D 2020-2023 | Zakres realizowanych zadań: Modernizacja boiska trawiastego do gry w piłkę nożną wraz z okalającą boisko bieżnią, skoczni do skoku w dal, montaż trybun na ok. 100 osób, mini siłownia zewnętrzna, remont dróg wewnętrznych, chodników, parkingu i terenów zielonych. | Liczba zrewitalizowanych przestrzeni publicznych – 1 szt. Liczba zrewitalizowanych obiektów sportowych i rekreacyjnych – 1 szt. | 0 0 | Projekt planowany do realizacji po 2021 roku. |

Tab.6 Lista pozostałych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz z osiągniętymi wskaźnikami produktu i stopniem realizacji projektu.

| Lp. | Beneficjent | Nazwa projektu | Obszar Termin realizacji | Planowany zakres realizacji projektu | Wskaźnik produktu | Wartość wskaźnika w okresie sprawozdawczym stan na 31.12.2020r. | Stopień realizacji projektu |
|-----|---|---|----------------------------------|---|--|---|--|
| 1 | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski | Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim | Obszar: E,F 2015-2023 | Zakres realizowanych zadań: - opracowanie dokumentacji projektowej, - badania geotechniczne, - roboty budowlane, rekultywacja/remediacja gruntów, - prace rozbiórkowe, - wycinka drzew, - uzbrojenie w infrastrukturę techniczną, - przygotowanie terenów do sprzedaży (scalenie, podziały, operaty, ogłoszenia). | Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych –51,80 ha | 17,6 ha | W 2020 roku udostępniono inwestorom teren o pow. 11,17 ha przy ul. Bałtowskiej. Zakończono roboty budowlane związane z budową drogi i infrastruktury sieciowej. |
| 2 | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski | Remont odcinka ulicy Ostrowieckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim | Obszar: A 2020 Nowy termin | Zakres realizowanych zadań: - remont nawierzchni jezdni na dł. ok. 0,500km, - remont chodnika na dł. ok. 0,500km, - remont nawierzchni zjazdów do posesji, - remont nawierzchni zatoki autobusowej, - regulacja infrastruktury technicznej w chodniku i jezdni, - remont oznakowania pionowego i poziomego (w tym 2 przejść dla pieszych), - humusowanie i obsianie skarp, - wymiana 7 szt. słupów oświetleniowych oraz opraw na oświetlenie LED. | Liczba zmodernizowanych / wybudowanych ciągów komunikacyjnych – 1 szt. | 1 | Został wykonany zakres rzeczowy robót na odcinku od skrzyżowania z ulicą Chrzanowskiego do końca muru cmentarza obejmujący remont nawierzchni jezdni, chodnika, zjazdów do posesji, zatoki autobusowej, regulację infrastruktury technicznej chodnika i jezdni, oznakowania pionowego i poziomego (w tym 2 przejść dla pieszych) oraz wymianę słupów oświetleniowych i opraw na oświetlenie LED. Projekt został zakończony w 2020 roku. |
| 3 | Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” w Ostrowcu Św. | Remont drogi wraz z wykonaniem odwodnienia oraz budowa parkingu na 10 miejsc postojowych pomiędzy budynkami nr 23 i 24 na os. Ogrody w Ostrowcu Św. | Obszar: B 2020-2023 | Zakres realizowanych zadań: Odwodnienie i remont drogi, wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne, budowa miejsc parkingowych. | Liczba zrewitalizowanych przestrzeni – 1 szt. Liczba zmodernizowanych / wybudowanych ciągów komunikacyjnych – 1 szt. Liczba utworzonych miejsc parkingowych – 10 | 0 0 0 | Projekt planowany do realizacji po 2021 roku. |
| 4 | Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” w Ostrowcu Św. | Budowa drogi, parkingu na ok. 16 miejsc postojowych oraz strefy aktywności – park dla psów wraz z | Obszar: B 2020-2023 | Zakres realizowanych zadań: - wybudowanie nowego odcinka drogi, - odwodnienie terenu, - budowa miejsc parkingowych, - oświetlenie terenu lampami energooszczędnymi, | Liczba zrewitalizowanych przestrzeni – 1 szt. Liczba zmodernizowanych / wybudowanych ciągów komunikacyjnych – 1 szt. | 0 0 0 | Projekt planowany do realizacji po 2021 roku. |

| | | | | | | | |
|---|--|---|---------------------|---|---|--------|--|
| | | oświetleniem i odwodnieniem na os. Rosochy. | | - budowa urządzeń parku dla psów wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz ogrodzeniem, - dostawa i montaż urządzeń treningowych, | Liczba utworzonych miejsc parkingowych – 16 | | |
| 5 | Kinga Kamińska-Skuza oraz współwłaściciele kamienicy | Remont i modernizacja kamienicy przy Alei 3-go Maja 3. Remont elewacji oraz pomieszczeń w budynku wraz z dostosowaniem powierzchni na cele biurowe i usługowe | Obszar: A 2020-2023 | Zakres realizowanych zadań: Prace remontowe, budowlane i porządkowe związane z modernizacją (przebudową) wnętrza i instalacji technicznych lokali. Dostosowanie pomieszczeń do wymogów powierzchni biurowej, wyposażenie stanowisk do pracy w przestrzeni typu coworking z niezbędnymi instalacjami technicznymi i telekomunikacyjnymi. Remont pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, węzłów kuchennych i komunikacji ogólnej. Remont stolarki okiennej i drzwiowej lub ich wymiana na nowe. Termomodernizacja lokali i przywrócenie jakości oraz poprawa funkcjonalności lokali. Remont i restauracja elewacji obiektu. | Liczba zrewitalizowanych obiektów mieszkalnych/ usługowych – 1 szt. | 0 | Aktualnie prace nad realizacją projektu są zawieszono z uwagi na gromadzenie własnych środków finansowych. |
| 6 | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Parkowej | Obszar: C 2015-2020 | Problem: Niedostateczna ilość lokali socjalnych na terenie miasta. Zakres realizowanych zadań: Budowa budynku z 18 lokalami socjalnymi z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz instalacjami wraz z zagospodarowaniem terenu (parkingi, drogi dojazdowe, place zabaw, oświetlenie, mała architektura, zieleń). | Wskaźniki produktu: Liczba wybudowanych mieszkań socjalnych – 18 szt. | 18 | W 2020 roku zakończono wszystkie prace budowlane. Projekt został zrealizowany. |
| 7 | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski | Budowa hali targowej przy ul. J. Słowackiego, przeznaczonej na cele promocji lokalnych produktów wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu | Obszar: A 2016-2018 | Zakres realizowanych zadań: - prace rozbiórkowe, tj. rozbiórka istniejących pawilonów handlowych, - budowa hali targowej z instalacją wod.-kan, co, energii elektrycznej, instalacją kanalizacji deszczowej, instalacją fotowoltaiczną, - zagospodarowanie terenu (m.in. utwardzenie terenu, budowa miejsc parkingowych, wykonanie zjazdów publicznych, ogrodzenie terenu, nasadzenia). | Liczba zrewitalizowanych przestrzeni publicznych – 1 szt. Liczba przygotowanych przestrzeni dla podmiotów gospodarczych – 1 szt. | 1 1 | Projekt zrealizowany. |
| 8 | Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” w Ostrowcu Świętokrzyskim | Budowa ciągu pieszo – jezdni, parkingów na ok. 71 miejsc postojowych wraz z dojazdami manewrowymi, odwodnieniem i | Obszar: B 2020-2023 | Zakres realizowanych zadań: Odwodnienie terenu, wykonanie oświetlenia terenu, wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne, budowa ciągu pieszo – jezdni, budowa miejsc parkingowych, budowa placów manewrowych. | Liczba zrewitalizowanych przestrzeni publicznych – 1 szt. Liczba utworzonych miejsc parkingowych – 71 | 0 0 | W 2020 roku nie były prowadzone działania związane z projektem. Realizacja projektu planowana jest po roku 2021, kiedy to zostaną przygotowane mapy do celów projektowych oraz rozpoczną się prace nad dokumentacją. |

| | | | | | | | |
|----|--|--|------------------------------|---|--|--------|--|
| | | oświetleniem oraz placów gospodarczych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w rejonie budynków nr 81, 82, 84 i 86 os. Rosochy w Ostrowcu Św. | | | | | |
| 9 | Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim | Ostrowiecka Młodzież – Kreatywna Młodzież | Obszar: A,B,C,D 2017-2023 | Zakres realizowanych zadań: - indywidualne doradztwo zawodowe, - warsztatowe zajęcia grupowe, - młodzieżowych saloniki dyskusyjne. | Liczba uczniów korzystających z doradztw i warsztatów – 200 | 700 | W 2020 roku przeprowadzono następujące działania: - projekt „Dzieciaki na 5+”, celem którego było przeciwdziałanie oraz minimalizowanie skutków wykluczenia społecznego oraz rozszerzenie oferty wsparcia świetlic środowiskowych – liczba uczniów korzystających z warsztatów – 107, - projekt „BĄDŹ ZAWODOWCEM. Rozwijamy kształcenie zawodowe w Ostrowcu Świętokrzyskim”, celem którego było zwiększenie atrakcyjności i jakości kształcenia szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w Ostrowcu Świętokrzyskim – liczba uczniów korzystających z warsztatów – 109, liczba uczniów korzystających z doradztw – 113. |
| 10 | Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim | Świetlica środowiskowa przy Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim | Obszar: A 2020 - 2023 | Zakres realizowanych zadań: - adaptacja i odnowienie budynku w zakresie niezbędnym do funkcjonowania świetlicy środowiskowej, - zakup niezbędnego wyposażenia. | Liczba nowo uruchomionych świetlic środowiskowych – 1 szt. Liczba osób korzystających ze świetlicy środowiskowej – 20 | 0 0 | Projekt planowany do realizacji po 2021 roku. |
| 11 | Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi na rzecz prowadzonej Niepublicznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasz Dom” | Wyrównajmy „pas startowy”- przygotowanie wychowanków Niepublicznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasz Dom” w Ostrowcu Świętokrzyskim do integracji ze środowiskiem i | Obszar: A 2020-2023 | Zakres realizowanych zadań: 1. Kształtowanie kompetencji społecznych umożliwiających prawidłową integrację ze środowiskiem poprzez realizację warsztatów psycho-edukacyjnych, indywidualnych spotkań z psychologiem. 2. Organizacja działań integracyjnych z biologicznymi rodzinami wychowanków placówki poprzez: - wsparcie psychologiczne indywidualne i grupowe wychowanków oraz ich rodzin, - organizację Dnia Rodziny. 3. Rozwijanie zdolności i zainteresowań wychowanków placówki poprzez: | Liczba osób uczestniczących w projekcie – 20 | 20 | Planowane jest zorganizowanie kolejnych warsztatów i korepetycji dla wychowanków oraz wycieczki. |

| | | | | | | | |
|----|---|--|-----------------------|---|--|---|--|
| | | usamodzielnienia się | | <ul style="list-style-type: none"> - udział w zajęciach plastycznych i teatralnych umożliwiających integrację ze środowiskiem, - udział w zimowym i wakacyjnym obozie socjoterapeutycznym, - organizację wycieczki edukacyjnej, - kurs prawa jazdy dla najstarszych wychowanków, - korepetycje przedmiotowe. <p>4. Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników placówki poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizację warsztatów umiejętności wychowawczych, - indywidualnych i grupowych spotkań z psychologiem. | | | |
| 12 | Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi | Przebudowa budynków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasz Dom” Zgromadzenia Sióstr franciszkanek Rodziny Maryi | Obszar: A 2020-2023 | <p>Zakres realizowanych zadań:</p> <p>Przebudowa placówki jest zaplanowana w etapach, aby nie przerywać jej funkcjonowania. Pierwszy etap to remont dotychczasowej części biurowej i kilku pomieszczeń istniejącego wcześniej specjalnego ośrodka wychowawczego – budynki 17 i 19 b. Ten etap udało się zrealizować. Drugi etap to remont budynku nr 19 i przystosowanie go do potrzeb małej, bardziej rodzinnej placówki oraz przygotowanie pomieszczeń dla specjalistów. Trzeci etap to remont budynku po specjalnym ośrodku wychowawczym – ul. Szkolna 19a i przystosowanie go na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej z miejscami dla niepełnosprawnych dzieci. Kolejnym etapem będzie termomodernizacja budynku, doposażenie placu zabaw i wykonanie nowego ogrodzenia.</p> | Liczba zrewitalizowanych obiektów infrastruktury społecznej – 2 szt. | 1 | Przebudowa placówki realizowana jest w etapach, aby nie przerywać jej funkcjonowania. Zrealizowano w pełni I etap – remont Placówki „Nasz Dom nr 2”. Obecnie trwa remont Placówki „Nasz Dom nr 1” przy ul. Szkolnej 19. W 2020 r. wyremontowano część pokoi dzieci. W 2021 roku planowany jest remont pozostałych pokoi oraz wydzielenie klatki schodowej. W dalszej kolejności planowany jest remont poddasza oraz odnowienie elewacji. |
| 13 | Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim | Prowadzenie zajęć integracyjno-profilaktycznych w świetlicy środowiskowej przy Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim | Obszar: A 2018 - 2023 | <p>Zakres realizowanych zadań:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prowadzenie zajęć integracyjno-profilaktycznych, -umożliwianie dzieciom i młodzieży wszechstronnego rozwoju z udziałem wykwalifikowanych instruktorów w takich dziedzinach aktywności jak: sport, kultura i sztuka, edukacja i rekreacja co przyczyni się do kształtowania pożądanych zachowań społecznych i cech osobowości, - planuje się ćwiczenia grup sportowych pod kierunkiem instruktorów (np. zajęcia kulturyistyczne, szachy, tenis stołowy), | Liczba osób uczestniczących w projekcie – 30 | 0 | Projekt planowany do realizacji po 2021 roku. |

| | | | | | | | |
|----|--|--|---------------------------|--|---|-----|--|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> - przygotowanie do rywalizacji młodzieży w zawodach o zasięgu gminnym, powiatowym oraz regionalnym i ponadregionalnym, - w zakresie kultury i sztuki planuje się rozwój talentów w dziedzinach: malarstwa, rzeźby, ceramiki, grafiki komputerowej i fotografii, - projekcja wartościowych filmów posiadających walor wychowawczo-edukacyjny, - planuje się organizację wycieczek krajoznawczych i rajdów pieszych oraz rowerowych, - przewiduje się prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży wymagającej wsparcia w tym zakresie. | | | |
| 14 | Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim | Prowadzenie Punktów Konsultacyjnych ds. Uzależnień w Ostrowcu Świętokrzyskim | Obszar: A,B,C,D 2017-2023 | <p>Zakres realizowanych zadań:</p> <p>Punkt konsultacyjny ds. uzależnień to miejsce, w którym specjalista dokonuje wstępnej diagnozy problemu, zbiera wywiad dotyczący stopnia zaawansowania uzależnienia, edukuje, udziela informacji, motywuje do podjęcia leczenia.</p> <p>Działanie prowadzone będzie dwutorowo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych, eksperymentujących z narkotykami i ich rodzin, prowadzony w budynku Centrum Edukacji Obywatelskiej 2. Punkty konsultacyjne prowadzone w gminnych placówkach oświatowych . <p>Zadania punktów konsultacyjnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, - udzielanie osobom i rodzinom konsultacji oraz porad terapeutycznych, psychologicznych i profilaktycznych w sprawach uzależnień, - wspomaganie osób używających ryzykownie i szkodliwie w podjęciu decyzji w sprawie zmiany, - motywowanie osób współuzależnionych do ewentualnego podjęcia psychoterapii w zakładach leczenia odwykowego, - gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb i instytucji z terenu gminy, zajmujących się systemową pomocą dla rodziny, | Liczba osób uczestniczących w projekcie – 100 | 786 | <p>W 2020 r. ARL realizowała zadanie „Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin”. Działania prowadzone w Punkcie dotyczyły profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi. Ponadto prowadzone były:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zajęcia informacyjno-edukacyjne dotyczące budowania postaw prozdrowotnych, - zajęcia informacyjno-edukacyjne dotyczące zjawiska przemocy w kontekście uzależnień, - grupowe profilaktyczne spotkania informacyjno-edukacyjne w formie mini-saloników dyskusyjnych, - szkolenie „Praca z osobami zagrożonymi przemocą i uzależnieniem w czasie izolacji społecznej” <p>W 2021 roku planowana jest kontynuacja realizacji zadania „Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin”.</p> |

| | | | | | | | |
|----|--|---|------------------------------|--|---|--------|---|
| | | | | - współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień, w szczególności lekarzami psychiatrii. | | | |
| 15 | Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim | Aktywni seniorzy – aktywna społeczność | Obszar: A,B,C,D 2018-2023 | Zakres realizowanych zadań: Projekt będzie obejmował wsparcie organizacji, inicjatyw i instytucji zajmujących się tematyką senioralną w pozyskaniu środków zewnętrznych na organizację zajęć angażujących czas wolny seniorów np. zajęć komputerowych, plastycznych, gimnastycznych w zakresie zdrowego stylu życia i żywienia, nauki radzenia sobie ze stresem i animacją czasu wolnego, a także warsztaty dla liderów z zakresu samoorganizacji i prowadzenia grup seniorskich. Ostatecznym odbiorcą projektu będą osoby starsze zamieszkujące w Ostrowcu Św. | Liczba osób uczestniczących w projekcie – 100 | 130 | ARL w ramach współpracy z Osiedlowym Klubem Aktywnych Seniorów przeprowadziła spotkanie „KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA”, ponadto na swojej stronie internetowej zamieszczała informacje dotyczące akcji i konkursów skierowanych do seniorów np.: dot. naboru na członków Świętokrzyskiej Rady Seniorów, naboru do Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, konkursu „Seniorzy w akcji”. |
| 16 | Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” w Ostrowcu Św. | Poprawa społeczno - gospodarczego wykorzystania Osiedlowego Domu Społecznego „Malwa” w Ostrowcu Św. | Obszar: B 2021-2023 | Zakres realizowanych zadań: - promowanie przedsiębiorczości i aktywności społecznej poprzez organizację różnego rodzaju szkoleń, - zajęcia teatralno - wokalne, taneczne, rękodzielnicze, - promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego, - gimnastyka relaksacyjna, - doposażenie sal. | Liczba osób uczestniczących w spotkaniach – 200 osób, Ilość stworzonych miejsc pracy - 2 | 0 0 | W 2020 roku nie aplikowano o środki z powodu braku programów dedykowanych spółdzielniom. Realizacja projektu planowana jest po 2021 roku. |
| 17 | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski | Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siemieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych | Obszar: A 2015-2019 | Zakres realizowanych zadań: - rozbiórki części suszarni, magazynu, słodowni, warzelni, magazynu zbożowego, - rewitalizacja zespołu obiektów polegająca na przebudowie i adaptacji do nowych funkcji budynku, - wykonanie fragmentów dobudowanych do budynku, - prace termomodernizacyjne, - nawierzchnie utwardzone i ciągi pieszo-jezdne, - parkingi, zieleń, - sieci zewnętrzne, - wyposażenie, mała architektura (ławki, kosze na śmieci, oświetlenie, stacja trafo, itp.). | Liczba zrewitalizowanych obiektów kultury – 1 szt. | 1 | Projekt zrealizowany. |
| 18 | Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim | „Rozbudowa Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia o salę koncertową wraz z instalacjami | Obszar: A 2021-2022 | Zakres realizowanych zadań: Projekt dotyczy rozbudowy, przebudowy i remontu niezabytkowej infrastruktury na cele działalności kulturalnej. Beneficjentem projektu będzie Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia | Liczba zrewitalizowanych obiektów kultury – 1 szt. | 0 | W 2020 roku zostało przyznane dofinansowanie w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W związku z przyznaniem dofinansowania planowana |

| | | | | | | | |
|----|---|--|-------------------------------|---|--|------------|--|
| | | wod.-kan., gazu, c.o., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, energii elektrycznej, techniczną i niskoprądową – na działkach nr ew. 48/9, 49/2, 50 (obręb 36, arkusz 1) położonych przy ul. Łżeckiej w Ostrowcu Św.” | | prowadzona i nadzorowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zakres inwestycji będzie obejmował rozbudowę budynku o budowę sali koncertowej wraz z zapleczem i wyposażeniem. | | | jest rozbudowa Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim o salę koncertową na 265 miejsc. |
| 19 | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski | Budowa ścieżek rowerowych | Obszar: A,B,C,D,E,F 2017-2023 | Zakres realizowanych zadań: Budowa ścieżek rowerowych na terenach rewitalizowanych o długości ok. 6 km wraz z małą architekturą oraz stacjami umożliwiającymi naprawę rowerów. | Długość wybudowanych/zmodernizowanych ścieżek rowerowych – 6 km | 1,4 | Wybudowana została ścieżka rowerowa przy ul. Przemysłowej w ramach zadania „Budowa otwarcia komunikacyjnego terenów inwestycyjnych – drogi gminnej bocznej od ulicy Bałtowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z przebudową dróg wewnętrznych” |
| 20 | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski / MOSiR Ostrowiec Św. | Remont i doposażenie Miejskiego Stadionu Sportowego KSZO | Obszar: C 2020-2023 | Zakres realizowanych zadań: - malowanie konstrukcji stalowej trybun stadionu (zalecenia wykazane w okresowym przeglądzie budowlanym - 640 000 zł wycena na podstawie wykonanego kosztorysu inwestorskiego oraz ekspertyzy technicznej), - wymiana siedzisk dla kibiców (410 000 zł wycena na podstawie cen producenta), - budowa nowego ogrodzenia od strony ul. Zgoda (350 000 zł wycena własna na podstawie kosztorysu inwestorskiego budowy hali), - wykonanie instalacji nawadniającej płytę boiska (100 000 zł wycena na podstawie oferty producenta), - montaż nowego systemu nagłośnienia stadionu (440 000 zł wycena na podstawie ofert firm wykonawczych), - montaż piłko chwytów za bramkami (40 000 zł wycena własna na podstawie cen rynkowych). | Liczba zrewitalizowanych obiektów infrastruktury sportowej – 1 szt. | 0 | W 2020 roku z własnych środków wykonano doraźne prace zabezpieczające polegające na częściowym malowaniu trybun stadionu piłkarskiego. Projekt przewidziany jest do realizacji po 2021 roku. |
| 21 | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski | Budowa zbiornika retencyjno-rekreacyjnego Stawki II | Obszar: B 2020-2023 | Zakres realizowanych zadań: - budowa zbiornika retencyjno-rekreacyjnego o pojemności 49tys.m3, - odbudowa koryta Strugi Denkowskiej, - budowa przepustu z piętrzeniem, - formowania podwyższenia zbiornika, - budowa kanału deszczowego, przerzutowego, rowów izolacyjnych, - budowa przystani kajakowej, | Liczba zrewitalizowanych przestrzeni publicznych – 1 szt. Liczba utworzonych zbiorników retencyjno-rekreacyjnych – 1 szt. | 0 0 | Zadanie planowane do realizacji po 2021 roku. |

| | | | | | | | |
|----|--|--|--------------------------|---|--|-----|---|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> - odmulenie przepustów, młnich spustowych - budowa ciągów spacerowych, ścieżek rowerowych, oświetlenia. | | | |
| 22 | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski | Budowa placów zabaw przy gminnych placówkach oświatowych | Obszar: B,D 2017-2023 | <p>Zakres realizowanych zadań: Projekt obejmuje budowę 3 ogólnodostępnych placów zabaw przy gminnych przedszkolach, przystosowanych dla różnych grup wiekowych i składających się m.in.: z nawierzchni sztucznej amortyzującej upadek wraz z różnymi elementami zabawowymi (np. karuzele, zjeżdżalnie, słuchawki, zestawy sprawnościowe, urządzenia interaktywne, itp).</p> | Liczba zrewitalizowanych przestrzezi przy obiektach publicznych – 3 szt. | 2 | W 2020 roku projekt nie był realizowany |
| 23 | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski/ Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 | Działamy- matematykę odkrywamy | Obszar: A 2016-2017 | <p>Zakres realizowanych zadań: W ramach projektu będą prowadzone zajęcia innowacyjnymi metodami, w szczególności metodą eksperymentu: - zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze z matematyki dla uczniów posiadających braki edukacyjne z zakresu matematyki, - dodatkowe zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania z zakresu matematyki, - zajęcia psychologiczne zwiększające kompetencje uczenia się i kompetencje społeczne. Ponadto uczniowie otrzymają poczęstunek oraz materiały piśmiennicze. Dodatkowo zostanie utworzona jedna pracownia międzyszkolna oraz zostaną doposażone pracownie przedmiotowe w pomoce dydaktyczne do nauczania matematyki metodą eksperymentu</p> | Ilość osób uczestniczących w projekcie – 182 | 182 | Projekt zrealizowany. |
| 24 | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski/ Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 | Lepsza edukacja - lepsza przyszłość | Obszar: A 2016-2018 | <p>Zakres realizowanych zadań: - zwiększenie kompetencji matematycznych, - poprawa porozumiewania się w języku obcym, również u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, - utworzenie kół zainteresowań, - zajęcia z zakresu umiejętności uczenia się i technik szybkiego zapamiętywania z wykorzystaniem zakupionej w ramach projektu bazy dydaktycznej, - wycieczki edukacyjne , - uczniowski projekt edukacyjny, - zwiększenie kompetencji zawodowych u nauczycieli.</p> | Ilość osób uczestniczących w projekcie – 132 | 144 | Projekt zrealizowany. |

| | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|--|--------------|--|
| 25 | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski | Nowoczesna Szkoła – modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej | Obszar: A,B,D 2016-2019 | Zakres realizowanych zadań: - modernizacja dwóch boisk wielofunkcyjnych przy PSP nr 4 i PSP nr 14 wraz z zagospodarowaniem terenu - wyposażenie placówek w nowoczesne pomoce dydaktyczne - modernizacja PSP nr 3 i PSP nr 14 (szatnie, korytarze, łazienki, sale gminastyczne) | Liczba placówek oświatowych biorących udział w projekcie – 8 szt. | 8 | Projekt zrealizowany. |
| 26 | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski / Zespół Szkół i Placówek Publicznych Nr 3 | „One Two Three – eksperymentujemy z matematyką i językiem angielskim - program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim | Obszar: B 2016-2018 | Zakres realizowanych zadań: Główne działania w projekcie: - dodatkowe zajęcia matematyczne, językowe, doradztwo edukacyjno-zawodowe, - spartakiada umiejętności matematycznych i językowych - wycieczka do CN Kopernik i British Council, - program wspomagania nauczycieli, - doposażenie międzyszkolnej pracowni matematycznej w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK, co zapewni warunki do nauczania opartego na metodzie eksperymentu. | Ilość osób uczestniczących w projekcie – 186 | 186 | Projekt zrealizowany. |
| 27 | Niepubliczny Żłobek i Przedszkole „Pajacyk” s.c. | Stworzenie warunków do lepszego rozwoju dzieci uczęszczających do Niepublicznego Żłobka i Przedszkola „Pajacyk” | Obszar: B 2016 – 2023 Nowy termin | Zakres realizowanych zadań: Projekt przewiduje zwiększenie intensywności i różnorodności oferty zajęć dodatkowych, np. zajęć gimnastycznych, relaksacyjnych, muzycznych, tanecznych, logopedycznych, terapeutycznych, pracy z psychologiem, teatralnych, wycieczek w ciekawe miejsca, plastycznych, naukowych, językowych itp. Zaprojektowanie, przystosowanie i wyposażenie pomieszczeń na których przebywają dzieci w pomoce dydaktyczne, naukowe, meble, meblościanki, zabawki rozwijające funkcje poznawcze, społeczne i rozwijające talenty, tablice lub ekrany multimedialne, kącki relaksacyjne, sprzęt gimnastyczny itp. Zaprojektowanie i wykonanie ogrodu połączonego z edukacyjno – relaksacyjnym placem zabaw. Organizacja wspólnych imprez, festynów i pikników rodzinnych dla dzieci i ich opiekunów oraz dziadków i babci, które sprzyjać będą | Liczba doposażonych obiektów infrastruktury edukacyjnej – 1 szt. Liczba osób uczestniczących w projekcie – 25 | 0 100 | W latach 2018-2020 z udziałem jedynie wkładu własnego były realizowane programy: „Pajacykowe ekoludki”, „Szkoła tuż tuż”, „Program ABC dobrego wychowania”, „Dziecięcy ogródek”. Ogólna liczba dzieci biorących w powyższych programach wynosi 100 osób. |

| | | | | | | | |
|----|--|---|--|---|--|--------------|---|
| | | | | integracji środowiska i budowaniu pozytywnych relacji z otoczeniem. | | | |
| 28 | Niepubliczny Żłobek i Przedszkole „Pajacyk” s.c. | Rozbudowa i adaptacja budynku oraz przebudowa placu zabaw i ogrodu Niepublicznego Żłobka i Przedszkola „Pajacyk” | Obszar: B 2016- 2023 Nowy termin | Zakres realizowanych zadań: Projekt polega na adaptacji i remoncie istniejących pomieszczeń budynku Niepublicznego Żłobka i Przedszkola „Pajacyk” oraz rozbudowie budynku o dodatkowy moduł, w którym to znajdują się sala gimnastyczna, przynajmniej jedna dodatkowa grupa dziecięca oraz inne potrzebne do realizacji zamierzonych celów pomieszczenia. Remont i adaptacja budynku polegać będzie na renowacji dachu, kuchni i innych pomieszczeń w których przechowywana lub przetwarzana jest żywność, biur, łazienek, korytarzy, grup dziecięcych, pomieszczeń gospodarczych. Planowane działania dotyczą również, instalacji poprawiającej bezpieczeństwo, termomodernizacji budynku, wyposażenia go w urządzenia do alternatywnego wytwarzania energii. Projekt zakłada remont dróg wewnętrznych, parkingów, chodników i terenów zielonych oraz placu zabaw i ogrodu. Wraz z rozwojem żłobka i przedszkola zwiększyła się, a docelowo zwiększy się jeszcze bardziej, liczba dzieci stale uczęszczających do placówki, stąd też powiększenia wymagają pomieszczenia gospodarcze, kuchnie, zmywalnie, obieralnie, magazynki żywności, szatnie, biura itp. | Liczba miejsc żłobkowych i / lub przedszkolnych – 12 Liczba wybudowanych/ zmodernizowanych obiektów – 1 szt. | 0 0 | W latach 2018-2020 została zrealizowana przebudowa placu zabaw oraz ogrodu. Została przeprowadzona termomodernizacja ścian budynku. Zadania te wykonano ze środków własnych. W 2021 roku planowany jest remont dachu. |
| 29 | Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach | Utworzenie ścieżki edukacyjno-sportowej poprzez modernizację boiska sportowego, zakup urządzeń zabawowych, doposażenie klasopracowni matematycznej i przyrodniczej oraz zlikwidowanie bariery architektonicznej dla osób niepełnosprawnych przy głównym | Obszar: C 2017-2018 | Zakres realizowanych zadań: - modernizacja boiska szkolnego: wymiana nawierzchni z asfaltowej na nawierzchnię bezurazową, montaż elementów do gry w piłkę nożną, siatkowa i ręczną, - wyposażenie placu przyszkolnego w urządzenia zabawowe dla dzieci, zjeżdżalnię, huśtawki, bujaczki, urządzenia równoważne, piaskownicę, - likwidacja barier architektonicznych, - wyposażenie sal lekcyjnych. | Liczba przebudowanych obiektów rekreacyjno-sportowych – 1 szt. Liczba osób korzystających z nowej infrastruktury – 600 osób | 1 600 | Projekt zrealizowany. |

| | | | | | | | |
|----|---|--|----------------------|---|--|--------|---|
| | | wejściu budynku szkoły w Częstocicach | | | | | |
| 30 | Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach | Utworzenie ścieżki edukacyjno-sportowej poprzez modernizację boisk sportowych, doposażenie klasopracowni fizyczno-chemicznej i językowej oraz remont i wyposażenie szatni szkolnej – etap II | Obszar: C 2019-2022 | Zakres realizowanych zadań: - modernizacja boisk sportowych; - doposażenie klasopracowni fizyczno-chemicznej; - doposażenie klasopracowni językowej; - remont i wyposażenie szkolnej szatni. | Liczba przebudowanych obiektów rekreacyjno-sportowych – 1 szt. Liczba osób korzystających z nowej infrastruktury – 145 osób | 0 0 | Odstąpiono od realizacji projektu. |
| 31 | Rada Osiedla Denków | Rozbudowa placu zabaw Pod Wiatrakami w Denkowie | Obszar: A 2020-2023 | Zakres realizowanych zadań: Zagospodarowanie w całości terenu przeznaczonego pod plac zabaw, doposażenie go w nowoczesne urządzenia, oświetlenie, zabezpieczenie monitoringiem, poprawa wizualizacji otoczenia poprzez pomalowanie barierki wzdłuż ulicy Samsonowicza do skrzyżowania z Zieloną na barwy Ostrowca. | Liczba zrewitalizowanych przestrzeni publicznych – 1 szt. | 0 | Projekt planowany do realizacji po 2021 roku. |
| 32 | Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach | Edukacja szansą na lepszą przyszłość | Obszar: C 2016- 2017 | Zakres realizowanych zadań: - dodatkowe zajęcia z języka angielskiego i informatyki, - dodatkowe zajęcia z pedagogiem, - zakup tablicy multimedialnej, - zakup pomocy dydaktycznych, - wycieczka edukacyjna. | Liczba uczniów którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu – 30 | 30 | Projekt zrealizowany. |
| 33 | Fundacja Szkoła bez Barier | Przebudowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową przy Zespole Edukacyjnym „Dwunastka” | Obszar: F 2019 | Zakres realizowanych zadań: Projekt przewiduje przebudowę boiska wielofunkcyjnego, - powstanie szkolnego klubu sportowego oraz pozaszkolnych młodzieżowych zespołów sportowych, - prowadzenie dwóch dodatkowych pozalekcyjnych zajęć sportowych tygodniowo, - przeprowadzenie corocznej imprezy sportowo-rekreacyjnej, - integrację z innymi osiedlami poprzez organizowanie wspólnych rozgrywek sportowych. | Liczba wybudowanych obiektów sportowo-rekreacyjnych – 1 szt. | 1 | W 2019 roku inwestycję częściowo zrealizowano ze środków Budżetu Obywatelskiego. Przebudowano boisko na terenie Zespołu Edukacyjnego „Dwunastka” w ramach zadania: „Budowa kompleksu sportowego w dzielnicy Koszary – boisko wielofunkcyjne”. Pozostały zakres nie będzie realizowany z powodu braku środków. Projekt zrealizowany. |

| | | | | | | | |
|----|---|--|---------------------------------------|--|--|-----------------|---|
| 34 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim | Czwórka - szkoła nowych możliwości. Modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim | Obszar: A 2019-2021 Nowy termin | Zakres realizowanych zadań: W ramach projektu szkoła zostanie wyposażona w narzędzia TiK, w tym w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne do pracowni przedmiotowych: geograficzno-przyrodniczej, matematyczno-fizycznej oraz biologiczno-chemicznej. Doposażony zostanie również gabinet logopedyczny w program wspomagający pracę nauczyciela z dziećmi z niedosłuchem, które uczęszczają do naszej szkoły. Projekt zakłada wyposażenie w sprzęt sportowy bloku sportowego oraz zostanie przeprowadzony remont bloku sportowego oraz szatni wraz z wyposażeniem w szafki. | Liczba doposażonych obiektów infrastruktury edukacyjnej – 1 szt. Liczba osób korzystających z nowej infrastruktury – 460 osób Liczba usprawnień dla osób niepełnosprawnych – 1 pracownia logopedyczna. | 0 0 1 | W 2020 roku ogłoszono postępowania przetargowe oraz wybrano wykonawców do realizacji zadań. Rozpoczęto realizację zadań, planowane zakończenie zadania – I.kw.2021 (przedłużono termin realizacji projektu oraz zmieniono wartość wskaźnika Liczba osób korzystających z nowej infrastruktury – 460 osób) |
| 35 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 w Ostrowcu Świętokrzyskim | Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK (Poddziałanie 8.3.3 RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020) | Obszar: B 2020-2021 | Zakres realizowanych zadań: W ramach przedsięwzięcia szkoła zostanie doposażona w nowoczesny sprzęt TIK, a uczniowie w ramach zajęć dodatkowych podniosą swoje kompetencje cyfrowe. Nauczyciele zostaną przeszkoleni w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. | Liczba doposażonych obiektów infrastruktury edukacyjnej – 1 szt. Liczba osób (nauczycieli) uczestniczących w szkoleniach - 81 Liczba osób korzystających z nowej infrastruktury – 711 (stan na 2019 rok) | 0 0 0 | Odstąpiono od realizacji projektu. |
| 36 | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski /Zespół Szkół i Placówek Publicznych Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim | Z wiedzą informatyczną wkraczamy we współczesny świat | Obszar: B 2020-2022 | Zakres realizowanych zadań: 1. Podniesienie kompetencji cyfrowych uczniów dodatkowe zajęcia informatyczne w klasach I - VIII oraz utworzenie międzyszkolnych pracowni informatycznych. 2. Liczę, badam i odkrywam dodatkowe zajęcia matematyczno przyrodnicze w klasach I - VIII oraz utworzenie międzyszkolnych pracowni matematycznych i przyrodniczych. 3. Humanista na czasie -dodatkowe zajęcia dla uczniów klas I - VIII prowadzone w oparciu o nowoczesne technologie oraz doposażenie międzyszkolnych pracowni humanistycznych. 4. Wsparcie psychologiczne i doradztwo edukacyjno- zawodowe dla uczniów klas IV - VII oraz doposażenie międzyszkolnej pracowni zawodoznawczej. 5. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu. | Liczba doposażonych obiektów infrastruktury edukacyjnej – 1 szt. Liczba osób (nauczycieli) uczestniczących w szkoleniach – 50 osób | 0 0 | Odstąpiono od realizacji projektu. |

| | | | | | | | |
|----|--|--|---------------------------------------|--|---|---|---|
| 37 | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski | Termomodernizacja budynków mieszkalnych | Obszar: A 2020-2023 | Zakres realizowanych zadań: - docieplenie ścian, stropu, dachu, piwnic , - wymiana stolarki okiennej, drzwiowe, - wymiana oświetlenia w częściach wspólnych budynku na energooszczędne, - wymiana elementów metalowych, remont daszków, kominów, | Liczba budynków wielorodzinnych poddanych termomodernizacji – 2 szt. | 0 | Projekt planowany do realizacji po 2021 roku. |
| 38 | Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” w Ostrowcu Św. | Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych wraz z wymianą pokrycia dachowego | Obszar: A,B 2016-2023 | Zakres realizowanych zadań: - ocieplenie budynku - wymiana okien, drzwi zewnętrznych i oświetlenia w częściach wspólnych budynków, - instalacja OZE, , wymiana pokrycia dachowego. | Liczba budynków wielorodzinnych poddanych termomodernizacji – 11 szt. | 9 | W 2020 roku nie aplikowano o środki z powodu braku programów dedykowanych spółdzielniom. W 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynków Rynek 9 i Siennieńska 9 |
| 39 | Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami "TWÓJ DOM" Sp. z o.o. | Termomodernizacja budynków Wspólnot Mieszkaniowych | Obszar: A,B 2017-2023 | Zakres realizowanych zadań: Izolacja fundamentów, docieplenie ścian, docieplenie stropu, remont dachów, remont instalacji centralnego ogrzewania oraz wod.–kan. | Liczba budynków wielorodzinnych poddanych termomodernizacji – 11 szt. | 9 | Na 2021 rok planowana jest termomodernizacja budynków ul. Polna 7B oraz os. Ogrody 17B. |
| 40 | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski | Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE – Urząd Miasta, Kino Etiuda, Środowiskowy Dom Samopomocy „Przystań” | Obszar: A 2014-2022 Nowy termin | Zakres realizowanych zadań: - opracowanie dokumentacji projektowej - docieplenie ścian, stropu, dachu, piwnic , - wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, - wymiana elementów metalowych, remont daszków, kominów, - wymiana rynien i rur spustowych, - modernizacja instalacji c.w.u, c.o., wentylacji, - montaż kolektorów słonecznych, - wymiana oświetlenia na energooszczędne. | Liczba obiektów użyteczności publicznej poddanych termomodernizacji – 3 szt. | 0 | We wrześniu 2020 roku rozpoczęto prace termomodernizacyjne budynku Kina Etiuda. W grudniu 2020 roku ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku Urzędu Miasta. W 2021 roku planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku Środowiskowego Domu Samopomocy „Przystań” |
| 41 | Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” w Ostrowcu Świętokrzyskim , os. Ogrody 7a | Termomodernizacja oraz remont budynków z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną | Obszar: C 2020-2023 | Zakres realizowanych zadań: 1. Remont konstrukcji dachu połączony ze zmianą pokrycia dachowego oraz dociepleniem stropu ostatniej kondygnacji, a także dociepleniem ścian. 2.Opracowanie projektów instalacji centralnie ciepłej wody użytkowej. Demontaż podgrzewaczy wody i wykonanie w to miejsce instalacji wg opracowanych projektów. Działania realizowane w następujących lokalizacjach: 1. Ul. Klimkiewiczowska 8A, 2. Ul. Świętokrzyska 4, 3. Ul. Poniatowskiego 3, 4. Ul. Traugutta 12, | Liczba budynków wielorodzinnych, w których zmodernizowano infrastrukturę sieciową – 18 szt. | 4 | W 2020 roku wykonano następujące prace częściowe z zakresu termomodernizacji: - ul. Sandomierska 3 – budowa instalacji c.o. i c.c.w., - ul. Sandomierska 5 - budowa instalacji c.o. i c.c.w., - ul. Staszica 1 - budowa instalacji c.o. i c.c.w. - ul. Staszica 7 - budowa instalacji c.o. i c.c.w. - ul. Poniatowskiego 10 – remont dachu budynku, Zakres powyższych prac nie wyczerpuje przewidzianego zakresu prac termomodernizacyjnych dla budynków ujętych w projekcie. |

| | | | | | | | |
|----|--|---|-------------------------------------|---|--|--------|--|
| | | | | 5. Ul. Traugutta 6, 6. Ul. Staszica 7, 7. Ul. Staszica 3, 8. Ul. Staszica 1, 9. Ul. Moniuszki 6, 10. Ul. Moniuszki 5, 11. Ul. Moniuszki 4, 12. Ul. Moniuszki 3, 13. Ul. Moniuszki 1, 14. Ul. Poniatowskiego 10, 15. Ul. Poniatowskiego 5, 16. Ul. Poniatowskiego 7, 17. Ul. Sandomierska 5, 18. Ul. Sandomierska 3. | | | |
| 42 | Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” w Ostrowcu Św. | Termomodernizacja oraz remont Społecznego Domu Kultury „Malwa” w Ostrowcu Św. | Obszar: B 2020-2023 | Zakres realizowanych zadań: - ocieplenie budynku, - wymiana okien, drzwi zewnętrznych i oświetlenia w budynku na energooszczędne, - instalacja OZE – paneli fotowoltaicznych, - instalacja oświetlenia awaryjnego, - wykonanie instalacji ciepłej wody i cyrkulacji wraz z podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej, - remont łazienek, - remont sali widowiskowo – teatralnej. | Liczba budynków poddanych termomodernizacji – 1 szt. | 0 | Projekt planowany do realizacji po 2021 roku. |
| 43 | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski / Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o./Powiat Ostrowiecki | Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim | Obszar: A,B,C,D,E,F 2016-2022 | Zakres realizowanych zadań: - budowa bazy operatora transportu publicznego, - zakup ekologicznych autobusów na potrzeby miejskiej komunikacji publicznej, - modernizacja przystanków i zatok autobusowych na terenie miasta, - wdrożenie systemu zarządzania transportem miejskim - utworzenie Park & Ride, - budowa i przebudowa drogi i ścieżek rowerowych -modernizacja oświetlenia ulicznego | Liczba zakupionego taboru – 15 szt. Liczba systemów komunikacji publicznej – 1 kpl. | 0 0 | W roku 2020 trwały prace projektowe, jak również rozpoczęto roboty budowlane nowej bazy operatora transportu publicznego, wykonano parking „Bike&Ride” przy ul. Świętokrzyskiej, a także częściową modernizację oświetlenia. Rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Samsonowicza i ul. 11 Listopada. |

Spis tabel:

| | |
|--|----|
| <i>Tabela 1.</i> Ilość realizowanych projektów wpisanych na listy przedsięwzięć Programu Rewitalizacji z podziałem na obszary oraz na projekty zakończone, realizowane, planowane i od których odstąpiono od realizacji | 6 |
| <i>Tabela 2.</i> Planowane przez beneficjentów źródła finansowania dla projektów | 8 |
| <i>Tabela 3.</i> Stan realizacji projektu pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego” realizowanego przez Partnerów: Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, Ostrowiecką Spółdzielnię Mieszkaniową i Spółdzielnię Mieszkaniową Krzemionki | 10 |
| <i>Tabela 4.</i> Wartości wskaźnika dla badanych kryteriów | 13 |
| <i>Tabela 5.</i> Lista podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz z osiągniętymi wskaźnikami produktu i stopniem realizacji projektu | 18 |
| <i>Tabela 6.</i> Lista pozostałych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz z osiągniętymi wskaźnikami produktu i stopniem realizacji projektu | 35 |

Spis wykresów:

| | |
|--|----|
| <i>Wykres 1.</i> Ilość realizowanych projektów rewitalizacyjnych z podziałem na projekty zakończone, realizowane, planowane i odstąpione od realizacji | 7 |
| <i>Wykres 2.</i> Planowane przez beneficjentów źródła finansowania dla projektów | 8 |
| <i>Wykres 3.</i> Liczba mieszkańców na obszarze rewitalizacji | 14 |
| <i>Wykres 4.</i> Liczba osób długotrwale bezrobotnych zamieszkujących obszar rewitalizacji | 15 |
| <i>Wykres 5.</i> Liczba osób z obszarów rewitalizacji korzystających z pomocy społecznej | 15 |
| <i>Wykres 6.</i> Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą na obszarach rewitalizacji (zarejestrowana w CEDG) | 16 |
| <i>Wykres 7.</i> Wartości monitorowanych wskaźników w latach 2015-2020 | 16 |

Spis rysunków:

| | |
|---|---|
| Rysunek 1. Mapa obszarów zrewitalizowanych i zdegradowanych | 4 |
|---|---|

Sprawozdanie sporządził: Tomasz Bogdański - Inspektor Wydziału Planowania i Rozwoju Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Sprawdził: Dominik Smoliński – Wiceprezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Opinia Komitetu Monitorującego Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na kata 2016-2023

- 1) Pozytywnie bez zastrzeżeń;
- 2) Pozytywnie z jednoczesnym uwzględnieniem uwag;
- 3) Negatywnie.
