


**Raport z monitoringu  
Gminnego Programu Rewitalizacji  
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego  
za 2025 rok**



## **Spis treści**

<b>1. PRZEBIEG PRAC NAD OPRACOWANIEM GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI.....</b>	<b>3</b>
<b>2. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA GMINNEGO PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZY- SKIEGO .....</b>	<b>4</b>
<b>3. STAN REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH .....</b>	<b>7</b>
<b>ZAŁĄCZNIK NR 1. STAN REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH .....</b>	<b>9</b>
<b>ZAŁĄCZNIK NR 2. ZREALIZOWANE WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJ- NYCH .....</b>	<b>23</b>

## 1. Przebieg prac nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji

W 2022 roku przystąpiono do prac związanych z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (GPR) w oparciu o ustawę z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485). Po przeprowadzeniu diagnozy delimitacyjnej, uchwałą nr LXXVII/32/2023 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 26 kwietnia 2023 r., wyznaczono obszar zdegradowany. W roku 2023, po podjęciu 29 maja przez Radę Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego uchwały nr LXXVIII/49/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, kontynuowano prace związane z opracowaniem GPR. W pracach tych wykorzystano metodę partycypacji społecznej, dążąc do zaangażowania jak najszerszego grona odbiorców (mieszkańców miasta, zarządców nieruchomości, wspólnot mieszkaniowych, organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą), czego wyrazem były m.in. organizowane spotkania, konsultacje społeczne i badania ankietowe, a także przeprowadzony z udziałem wielu podmiotów proces opiniowania dokumentów.

W dniu 30 listopada 2023 r. zostały podjęte przez Radę Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego następujące uchwały:

- uchwała nr LXXXVI/117/2023 w sprawie zasad wyznaczania Komitetu Rewitalizacji oraz zasad jego działania,
- uchwała nr LXXXVI/118/2023 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Następnie wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z wnioskiem o wydanie opinii w zakresie możliwości finansowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego pełniącego funkcje Strategii IIT z programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Uchwałą nr 8461/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 stycznia 2024 r. została wydana pozytywna opinia dotycząca możliwości finansowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Jednocześnie Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego został wpisany do prowadzonego przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Wykazu Gminnych Programów Rewitalizacji spełniających wymogi Strategii IIT.

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Zarządzeniem Nr V/147/2024 z dnia 29 lutego 2024 roku powołał **Komitet Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego**, w skład którego wchodzi dwudziestu, wybranych w ramach otwartego naboru, przedstawicieli obszarów objętych rewitalizacją, w tym przedstawicieli mieszkańców, podmiotów zarządzających nieruchomościami, podmiotów prowadzących działalność społeczną, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz przedstawicieli Urzędu Miasta i jednostek podległych Gminie Ostrowiec Świętokrzyski. Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem i oceną procesu rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

## **2. Główne założenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego**

GPR to wieloletni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.

W oparciu o wskaźniki sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i społecznej wyznaczono obszar zdegradowany, a więc fragment miasta znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych oraz co najmniej jednego z negatywnych zjawisk pozostałych sfer. Wyznaczony w oparciu o wyniki diagnozy delimitacyjnej obszar zdegradowany objął osiedla: Częstocice, Denków, Hutnicze, Kamienna, Kuźnia, Ludwików, Pułanki, Spółdzielców, Śródmieście, Trójkąt. Obszar ten przekraczał wartości wskazane w ustawie o rewitalizacji tj. był większy niż 20% powierzchni miasta oraz zamieszkiwało go więcej niż 30% mieszkańców. W związku z powyższym, celem wskazania obszaru rewitalizacji, konieczne było stosowne zawężenie wyznaczonego obszaru zdegradowanego. W tym celu posłużono się przede wszystkim danymi statystycznymi dotyczącymi koncentracji przestrzennej osób korzystających z pomocy społecznej oraz wynikami działań partycypacyjno-badawczych. W efekcie wyznaczony został obszar rewitalizacji obejmujący łącznie 16,05% powierzchni miasta (7,45 km<sup>2</sup>), zamieszkiwany przez 29,78% mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego (18 459 osób) i składający się z czterech podobszarów:

Podobszar 1. Pułanki;


Podobszar 2. Kuźnia-Spółdzielców-Trójkąt-Śródmieście-Kamienna;

Podobszar 3. Częstocice-Hutnicze-Ludwików oraz


Podobszar 4. Denków.

W dniu 29 sierpnia 2024 roku Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przyjęła uchwałę nr VIII/58/2024 w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Specjalna Strefa Rewitalizacji została ustanowiona na podobszarze nr 4 Denków.

Zakres terytorialny obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji przedstawia poniższa mapa.

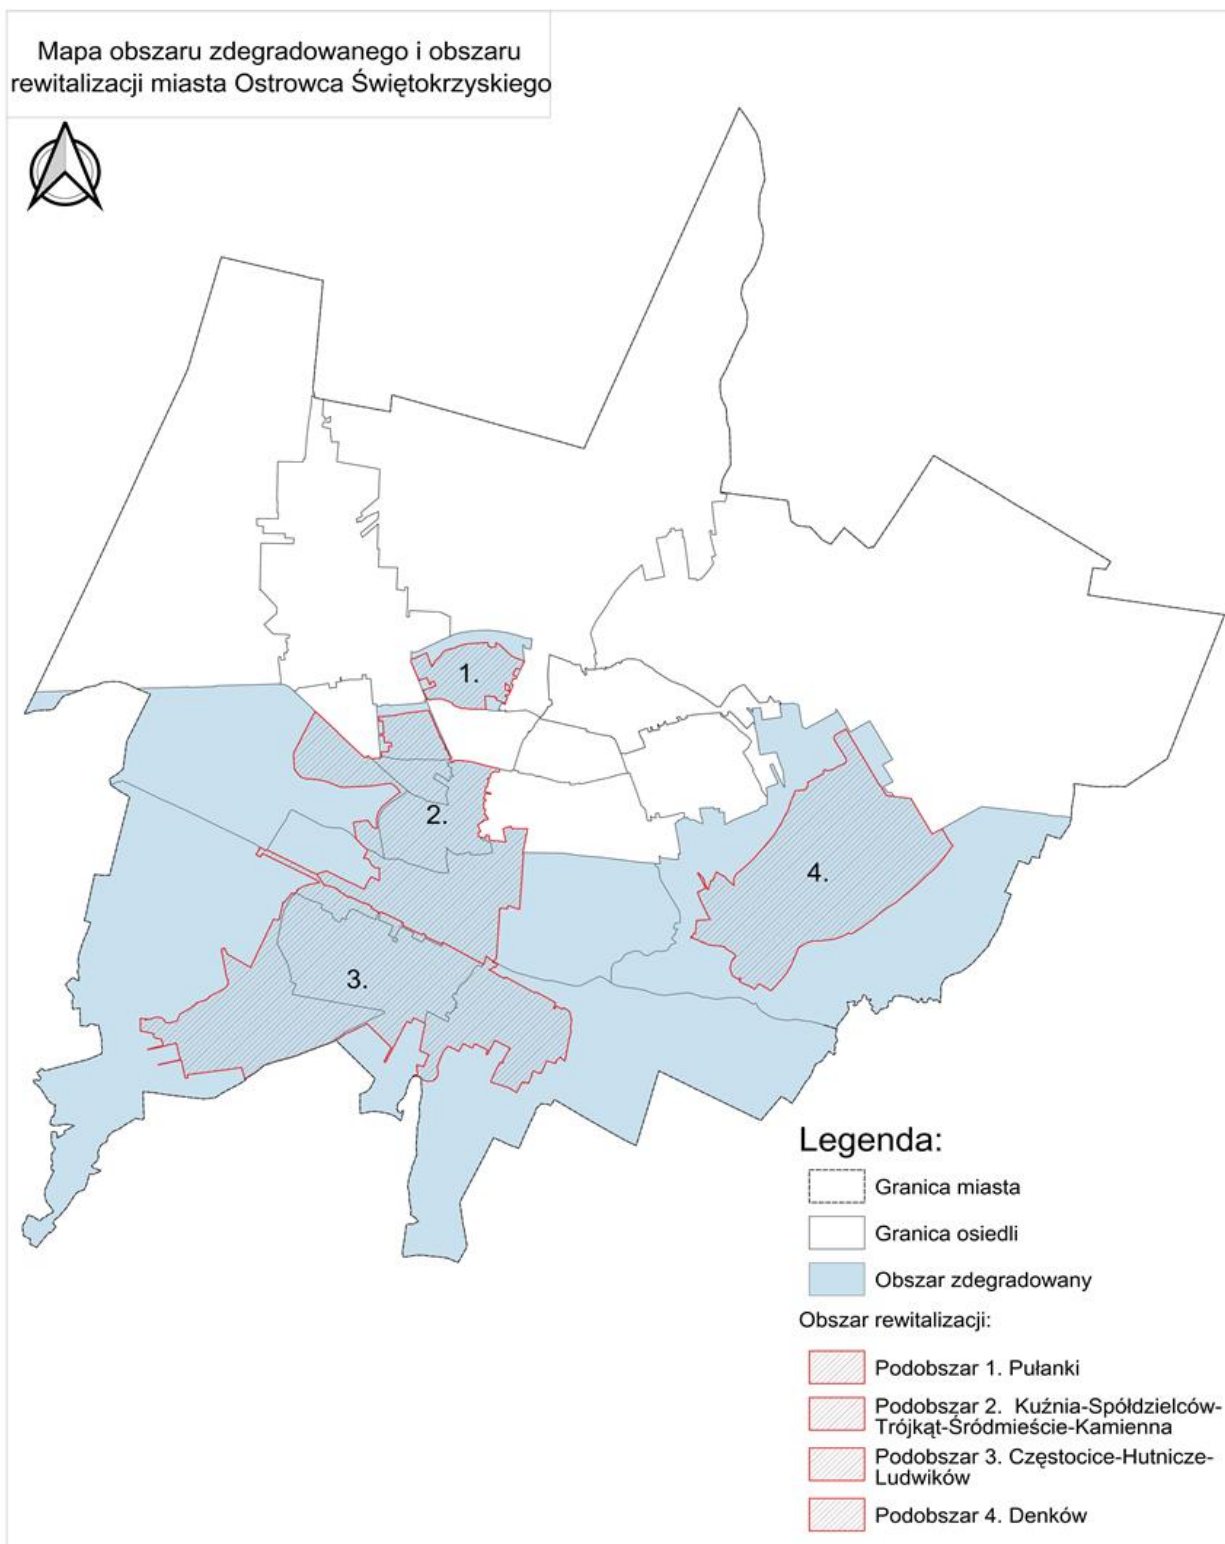

W Gminnym Programie Rewitalizacji zostały wyznaczone trzy główne cele rewitalizacji, kierunki działań, które wskazują sposób osiągnięcia celów.

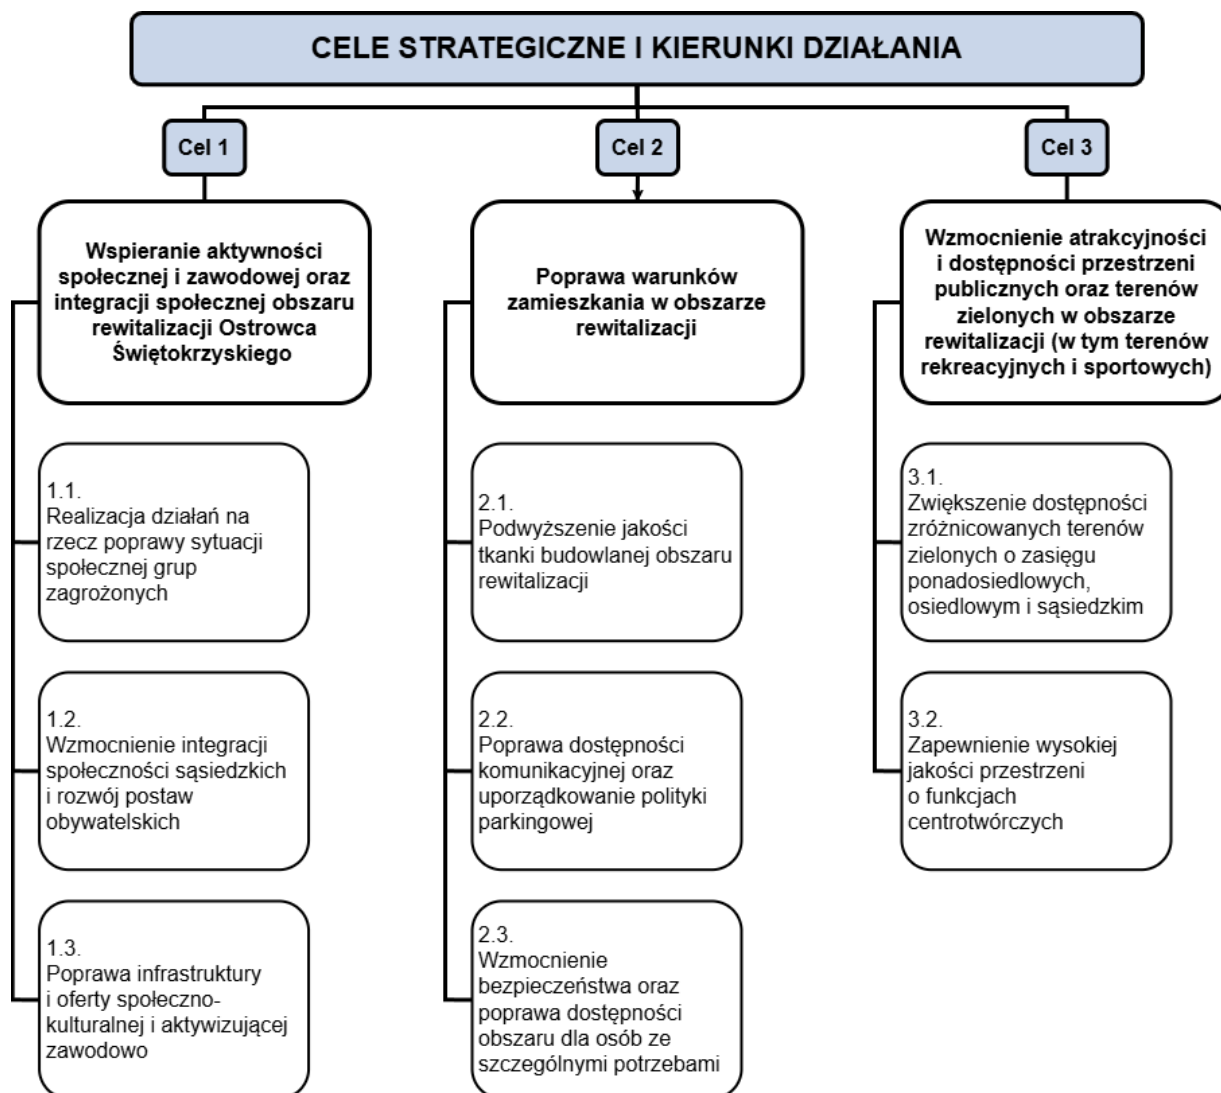


W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zaplanowano 59 podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz przedsięwzięcia uzupełniające, których wdrażanie będzie prowadziło do minimalizowania zdiagnozowanych zjawisk kryzysowych oraz ożywienia terenów składających się na obszar rewitalizacji. Przedsięwzięcia te koncentrują się m.in. na osobach wykluczonych (bezrobotni, osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami), modernizacji budynków użyteczności publicznej oraz infrastruktury drogowej, zwiększeniu oferty kulturalnej czy rozwoju terenów zieleni miejskiej. Spośród 59 przedsięwzięć podstawowych:

- 6 znajduje się na Podobszarze 1. Pułanki,
- 19 na Podobszarze 2. Kuźnia-Spółdzielców-Trójkąt-Śródmieście-Kamienna,
- 11 na Podobszarze 3. Częstocice-Hutnicze-Ludwików,
- 4 na Podobszarze 4. Denków.

Ponadto, 19 przedsięwzięć jest wspólnych dla wszystkich podobszarów.

Spośród przedsięwzięć rewitalizacyjnych najczęściej zostało zgłoszonych przez jednostki Gminy Ostrowiec Świętokrzyski – 33 oraz Powiat Ostrowiecki – 11. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne realizowane przez pozostałe podmioty realizujące przedstawiono na poniższym wykresie.

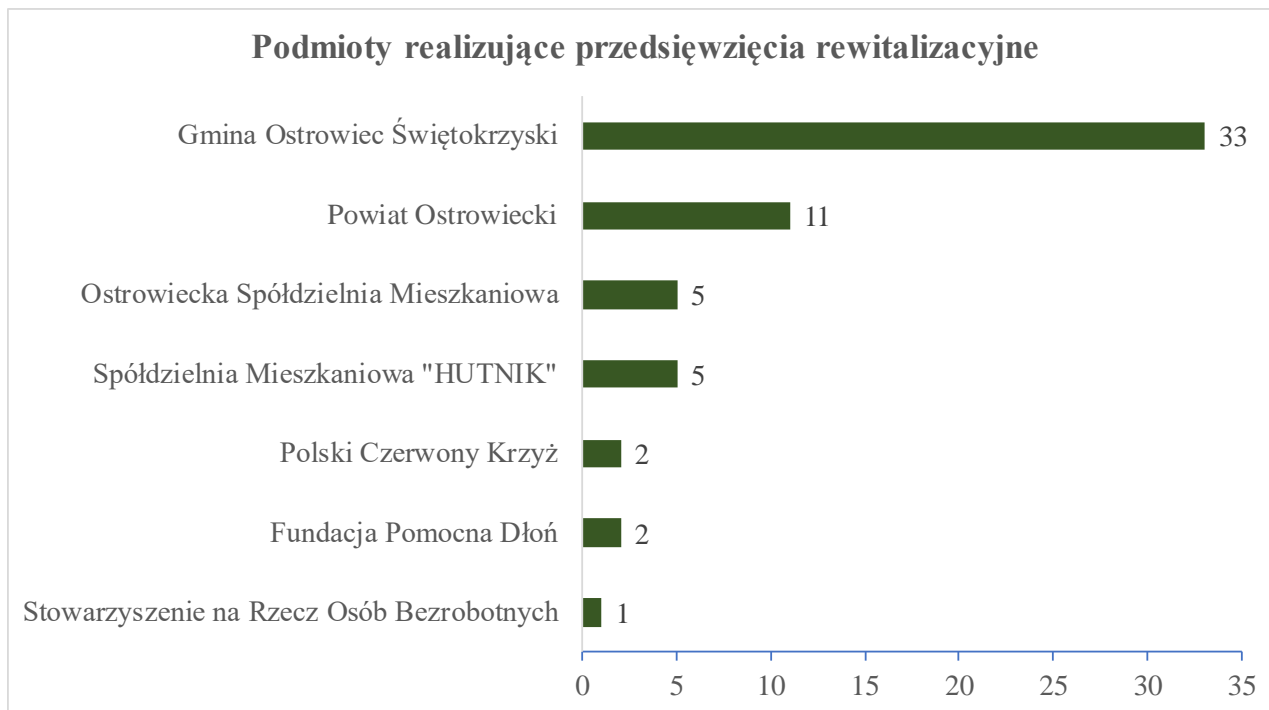

### 3. Stan realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Stały monitoring GPR zakłada przygotowanie corocznego raportu z postępów w realizacji przedsięwzięć ujętych w Programie. Raport powstaje z uwzględnieniem danych przekazywanych przez podmioty odpowiedzialne za realizację konkretnych przedsięwzięć. Z informacji zebranych za 2025 r. wynika, że na 59 przedsięwzięć rewitalizacyjnych 27 jest w trakcie realizacji, 5 zostało zrealizowanych, w przypadku 3 kolejnych odstąpiono od realizacji, a realizacja pozostałych planowana jest na 2026 rok i lata kolejne. Jako początek realizacji, w przypadku zadań infrastrukturalnych, przyjęto rozpoczęcie robót budowlanych lub podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych. W 2025 r. zakończono realizację następujących przedsięwzięć: 3.7 Zagospodarowanie na terenie parku przy Pałacu Wielopolskich w Częstocicach; 4.3 Budowa, przebudowa, remonty dróg na Podobszarze nr 4; 5.2 Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim; 5.10. Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży – uczniów ostrowieckich szkół oraz 5.12 Festiwal Wielki Ogień im. Miry Kubasińskiej. Wśród przedsięwzięć od realizacji których odstąpiono znalazły się następujące: 5.3 Wsparcie aktywnego wypoczynku seniorów – montaż ławek oraz spoczników przy głównych ciągach pieszych; 5.13 Festiwal Interdyscyplinarny IronART FESTIWAL oraz 5.17 Organizacja wsparcia specjalistycznego w ramach świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. Powodem odstąpienia od realizacji ostatniego wymienionego przedsięwzięcia był brak środków finansowych oraz możliwego miejsca jego realizacji.

Na realizację przedsięwzięć wydatkowano w 2025 roku kwotę 41 498 208,23 zł, a suma wszystkich wydatków poniesionych od początku realizacji przedsięwzięć wynosi 99 302 663,58 zł. W kwotach tych ujęte są także wydatki na działania przygotowawcze, tj. opracowanie dokumentacji projektowych, audytów i innych dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia prac. Znaczna część przedsięwzięć była realizowana przy udziale środków zewnętrznych – krajowych i unijnych – pochodzących między innymi z następujących źródeł finansowania:

- Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy,
- Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027,
- Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027,
- Europejski Fundusz Społeczny Plus,
- Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności,
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg,
- Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- Rządowy Program Odbudowy Zabytków,
- Fundusz Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego,
- Program Aktywny Maluch 2022-2029.

Według stanu na 31 grudnia 2025 roku na realizację 26 przedsięwzięć przyznano dofinansowanie o łącznej wartości 205 102 723,26 zł, natomiast łączna wartość dofinansowania 3 przedsięwzięć, które oczekują na decyzję wynosi 5 179 694,68 zł.

Podmioty wymieniły następujące problemy i trudności, z jakimi borykały się przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz w jej trakcie:

- niewystarczające środki finansowe lub ich brak,
- brak decyzji,
- konieczność zmiany Wykonawcy,
- przedłużające się procedury uzyskania premii termomodernizacyjnej,
- trudna w pracy społeczność,
- znalezienie przestrzeni pod mural,
- opóźnienia w ogłoszeniu naboru do Działania 6.2. Rewitalizacja Miast Powiatowych z Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

Stan realizacji przedsięwzięć na koniec 2025 roku, planowane działania na kolejne lata oraz kwoty pozyskanego i wnioskowanego dofinansowania przedstawia tabela nr 1. W tabeli nr 2 zestawiono natomiast wykaz przedsięwzięć i wartości osiągniętych wskaźników.

Załączniki:

Tabela nr 1. Stan realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Tabela nr 2. Zrealizowane wskaźniki dotyczące przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Lp.	Nr przedsięwzięcia	Nazwa przedsięwzięcia	Podmiot realizujący	Stan realizacji: P – planowane R – w realizacji Z – zrealizowano O – odstąpiono	Dotychczasowe działania	Planowane działania w 2026	Kwota dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Wnioski w trakcie oceny (wg. stanu na 31.12.2025)	Kwota dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Dofinansowanie przyznane (wg. stanu na 31.12.2025)
1	1.1	Zagospodarowanie terenu po byłej bazie MZK	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Urząd Miasta	P	–	Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej zagospodarowania terenu oraz budowy obiektów mieszkaniowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00 zł	0,00 zł
2	1.2	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP Nr 7	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Urząd Miasta	R	Zadanie obejmuje wykonanie robót termomodernizacyjnych (ocieplenie ścian i dachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż pomp ciepła, wymiana c.o.) oraz roboty towarzyszące.	Zakończenie realizacji zadania planowane jest na 28 maja 2026 r.	0,00 zł	12 297 180,00 zł
3	1.3	"Sportowa siódemka" – teren rekreacyjno-sportowy na os. Pułanki	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – PSP Nr 7	P	–	W dalszym ciągu planowane jest przedsięwzięcie "Sportowa siódemka", które ma na celu modernizację boiska trawiastego do gry w piłkę nożną wraz z bieżnią, skocznią do skoków wzwyż, mini siłownią zewnętrzną.	0,00 zł	0,00 zł
4	1.4	Żłobek miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Urząd Miasta	R	Opracowano dokumentację projektową. W trakcie prace budowlane, wykonanie szachtu dźwigowego wraz z zakupem dźwigu. Termomodernizacja ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Wykonanie nowych instalacji.	Kontynuacja prac budowlanych na terenie obiektu. Rozpoczęcie prac związanych z wyposażeniem żłobka. Zakończenie prac do 15.05.2026 r.	0,00 zł	8 491 132,80 zł
5	1.5	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych będących w zasobach OSM zlokalizowanych na os. Pułanki	Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa	P	–	Poszukiwanie możliwości dofinansowania tego typu przedsięwzięcia ze środków zewnętrznych.	0,00 zł	0,00 zł
6	1.6	Instalacja systemu monitoringu na terenie os. Pułanki	Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa	P	–	Poszukiwanie możliwości dofinansowania tego typu przedsięwzięcia ze środków zewnętrznych.	0,00 zł	0,00 zł
7	2.1	Adaptacja podpiwniczenia budynku OBK na funkcje kulturalno-edukacyjne	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Urząd Miasta	R	Wykonano: roboty wyburzeniowe, demontażowe, izolacje wodochronne ścian, roboty ziemne (fundamenty i podbicia ścian, płyty na gruncie), stropy i schody żelbetowe, słupy żelbetowe, instalacje elektryczne, instalacje wentylacji i klimatyzacji.	Zakończenie prac budowlanych i prac wykończeniowych planowane do 12.04.2026 r. Pozyskanie dodatkowych środków na realizację projektu.	0,00 zł	1 300 000,00 zł
8	2.2	Przebudowa terenów publicznych w Ostrowcu Świętokrzyskim - zagospodarowanie Rynku	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Urząd Miasta	R	Opracowano dokumentację projektową wraz z uzyskanym pozwoleniem na budowę	Ogłoszenie postępowania przetargowego na wykonanie zadania przebudowy i zagospodarowania Rynku wraz z budową na tym terenie budynku usługowego typu kawiarnia. Pozyskanie dodatkowych środków na realizację projektu.	0,00 zł	4 340 199,55 zł
9	2.3.	Kompleksowa modernizacja i zagospodarowanie terenu na osiedlu Kuźnia	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Urząd Miasta	P	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy zagospodarowania działek oznaczonych nr ew. 240/9 oraz 2/49 (obręb 12, arkusz 3), 240/4 (obręb 12, arkusz 3) na osiedlu Kuźnia.	Uzyskanie dofinansowania na przedmiotowe zadanie.	0,00 zł	0,00 zł

10	2.4	Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim - Podobszar 2	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Urząd Miasta	P	Opracowano dokumentację projektową zagospodarowania części parku Miejskiego.	Uzyskanie dofinansowania na przedmiotowe zadanie.	0,00 zł	0,00 zł
11	2.5	Przebudowa dróg gminnych na Podobszarze nr 2	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Urząd Miasta	R	Zawarto umowę z Wykonawcą zadania na opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Rozbudowa ul. J. Słowackiego i ks. J. Ostrogskiego"	Opracowanie map podziałowych, projektu budowlanego wraz ze złożeniem wniosku w imieniu Inwestora do organu administracji architektoniczno-budowlanej o uzyskanie decyzji ZRID do 10 lipca 2026 r. Uzyskanie prawomocnej decyzji ZRID, trwała stabilizacja punktów granicznych wraz z opracowaniem inwentaryzacji gruntów przejętych z mocy prawa do 8 września 2026 r.	0,00 zł	0,00 zł
12	2.6	Rozbudowa i modernizacja, w tym wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich w budynku Urzędu Stanu Cywilnego	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Urząd Miasta	R	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku USC wraz z zagospodarowaniem terenu. Zostały wykonane m.in. roboty wyburzeniowe, demontażowe.	Planowany termin zakończenia zadania 24.10.2026 r. Pozyskanie dodatkowych środków na realizację projektu.	0,00 zł	6 500 000,00 zł
13	2.7	Przywrócenie pełnej funkcjonalności powierzchni handlowych i magazynowych na terenie Targowisk Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Targowiska Miejskie	P	–	–	0,00 zł	0,00 zł
14	2.8	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ostrowieckiego poprzez przebudowę/ remont odcinków dróg powiatowych nr 1613T, nr 1609T, nr 1646T, nr 1644T oraz nr 1649T	Powiat Ostrowiecki	R	1. Złożono wnioski o dofinansowanie zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 1613T ul. St. Żeromskiego ze środków Rządowego Rozwoju Dróg. 2. Zakończono realizację zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 1609T ul. Iłżecka. Wykonano remont nawierzchni na odcinku 0,428 km, w tym remont 16 zjazdów, 2 skrzyżowań, zatoki autobusowej, chodników oraz ścieżki rowerowej, wymianę oświetlenia ulicznego i wykonanie oznakowania poziomego. 3. Zadanie remontu drogi powiatowej nr 1646T, 1644T oraz 1649T: złożono wnioski o dofinansowanie, które rozpatrzone negatywnie.	Zlecenie opracowania dokumentacji projektowych dla poszczególnych zakresów projektu oraz w ramach dostępnych źródeł dofinansowania aplikowanie o pozyskanie środków finansowych na realizację tych odcinków dróg powiatowych, dla których powiat posiada dokumentację projektową.	0,00 zł	2 507 874,00 zł
15	2.9	Wsparcie infrastruktury edukacyjno-sportowej oraz poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego	Powiat Ostrowiecki	R	Aplikowano o dofinansowanie z budżetu państwa na kompleksową modernizację hali przy ZSOMS w ramach programu rozwoju infrastruktury sportowej w województwie lubelskim, podkarpackim i świętokrzyskim – Edycja 2025. Wniosek jest w trakcie oceny, nie podjęto innych działań.	W przypadku przyznania dofinansowania planowana jest realizacja prac modernizacyjnych.	597 908,38 zł	16 200 000,00 zł
16	2.10	Poprawa efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Iłżeckiej 37	Powiat Ostrowiecki	P	Nie podjęto działań ze względu na dotychczasowy brak możliwości realizacji zadania ze środków zewnętrznych.	Podjęcie działań w zakresie przygotowania projektu do realizacji uzależnione jest od możliwości aplikowania o środki finansowe w ramach dostępnych źródeł dofinansowania ze środków zewnętrznych oraz od możliwości finansowych budżetu Powiatu Ostrowieckiego. W przypadku pojawienia się takiej możliwości, Zarząd Powiatu Ostrowieckiego przeanalizuje możliwość realizacji przedmiotowego projektu.	0,00 zł	0,00 zł

17	2.11	Wsparcie infrastruktury edukacyjno-sportowej oraz poprawa efektywności energetycznej LO Nr II im. Joachima Chreptowicza	Powiat Ostrowiecki	R	1. Zadanie pn.: "Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaniem o stałej konstrukcji przy LO Nr II w Ostrowcu Św" zostało zrealizowane w 2024 r. 2. W zakresie zadania "Poprawa efektywności energetycznej ZS Nr 3 oraz LO Nr II im. Joachima Chreptowicza" opracowano dokumentację projektową, która stanowiła podstawę do przygotowania postępowania przetargowego na wykonanie robót termomodernizacyjnych. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w listopadzie 2025 r. zawarto umowę z wykonawcą robót z terminem realizacji do dnia 31.08.2026 r. Po podpisaniu umowy przystąpiono do rzeczowej realizacji robót.	Rzeczowa realizacja oraz zakończenie robót budowlanych. W zakresie wsparcia infrastruktury edukacyjnej i sportowej – w przypadku możliwości aplikowania o środki finansowe w ramach dostępnych źródeł dofinansowania ze środków zewnętrznych, Zarząd Powiatu Ostrowieckiego przeanalizuje możliwość realizacji przedmiotowego zakresu projektu z uwzględnieniem możliwości finansowych budżetu Powiatu Ostrowieckiego.	0,00 zł	6 902 736,56 zł
18	2.12	Wsparcie infrastruktury edukacyjno-sportowej oraz poprawa efektywności energetycznej CKZiU	Powiat Ostrowiecki	P	–	Podjęcie działań w zakresie przygotowania projektu do realizacji uzależnione jest od możliwości aplikowania o środki finansowe w ramach dostępnych źródeł dofinansowania ze środków zewnętrznych oraz od możliwości finansowych budżetu Powiatu Ostrowieckiego. W przypadku pojawienia się takiej możliwości, Zarząd Powiatu Ostrowieckiego przeanalizuje możliwość realizacji przedmiotowego projektu.	0,00 zł	0,00 zł
19	2.13	Wsparcie infrastruktury edukacyjno-sportowej oraz poprawa efektywności energetycznej LO Nr III im. Władysława Broniewskiego	Powiat Ostrowiecki	P	W 2025 r. złożono wniosek o dofinansowanie ze środków FESW 2021-2027. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę. Realizacja zadania przewidziana na lata 2026-2027.	Przystąpienie do realizacji prac modernizacyjnych.	3 983 423,65 zł	0,00 zł
20	2.14	Wsparcie infrastruktury edukacyjno-sportowej oraz poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących	Powiat Ostrowiecki	P	W 2025 r. złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki	W przypadku uzyskania dofinansowania planowana jest realizacja prac modernizacyjnych.	598 362,65 zł	0,00 zł
21	2.15	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych będących w zasobach OSM zlokalizowanych na osiedlu Spółdzielców	Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa	R	Remont elewacji budynku mieszkalnego, ul. Polna 66. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, uzyskano niezbędne pozwolenia na wykonanie robót, rozpisano i rozstrzygnięto przetarg na realizację robót, zawarto umowę na realizację robót, złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach premii termomodernizacyjnej.	Realizacja robót, rozliczenie przedsięwzięcia w ramach premii termomodernizacyjnej.	0,00 zł	315 790,72 zł
22	2.16	Budowa i przebudowa parkingów w zasobach Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej - osiedle Spółdzielców	Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa	P	–	Poszukiwanie możliwości dofinansowania tego typu przedsięwzięcia ze środków zewnętrznych.	0,00 zł	0,00 zł
23	2.17	Dostawa, montaż, instalacja systemu monitoringu na terenie parku na osiedlu Spółdzielców	Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa	P	–	Poszukiwanie możliwości dofinansowania tego typu przedsięwzięcia ze środków zewnętrznych.	0,00 zł	0,00 zł
24	2.18	Termomodernizacja budynku Mickiewicza 11	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Hutnik"	R	Została wykonana dokumentacja projektowa, przeprowadzono przetarg na wykonanie remontu budynku	Złożenie wniosku o pożyczkę do WFOSiGW w Kielcach; Termomodernizacja budynku	0,00 zł	0,00 zł

25	2.19	Akademia Bezpieczeństwa Polskiego Czerwonego Krzyża	Oddział rejonowy PCK	P	W latach 2023-2024 wyremontowano część budynku, w którym ma działać Akademia Bezpieczeństwa, jednak w 2025 r. nie udało się pozyskać środków na dalszy remont dlatego realizację zadania przesunięto na kolejne lata.	W przypadku pozyskania środków kontynuowanie remontu Budynku B, zakup specjalistycznego sprzętu.	0,00 zł	0,00 zł
26	3.1	Modernizacja infrastruktury na terenie Starej Huty	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Urząd Miasta	P	W 2025 r. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski zbyła na rzecz PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna działkę nr 3/62 ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego i działkę nr 3/65 ul. Świętokrzyska. Nieruchomości będą przeznaczone na rozbudowę Głównego Punktu Zasilającego nr 1 na terenie Starej Huty.	Rozpoczęcie projektowania rozbudowy Głównego Punktu Zasilającego nr 1 na terenie Starej Huty.	0,00 zł	0,00 zł
27	3.2	Utworzenie Ostrowieckiego Integratora Edukacji i Przedsiębiorczych (OIEP)	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Urząd Miasta	R	Prace w zakresie aktualizacji kosztorysów i wyłonienia nowego wykonawcy.	Realizacja robót budowlano-montażowych.	0,00 zł	12 629 813,23 zł
28	3.3	Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim – Podobszar 3	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Urząd Miasta	P	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy nowego zagospodarowania Parku Pałacowego w Częstocicach	Uzyskanie dofinansowania na przedmiotowe zadanie.	0,00 zł	0,00 zł
29	3.4	Budowa, przebudowa, remonty dróg na Podobszarze nr 3	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Urząd Miasta	R	1. W 2023 r. opracowano projekt techniczny przebudowy ul. Osadowej; 2. W 2024 r. zakończono realizację przedsięwzięcia obejmującego odcinki dróg: ul. Śliska, ul. Niska, ul. Różana, ul. Jasna oraz remont ul. Wiejskiej; 3. W 2025 r. rozpoczęto realizację przebudowy ul. Osadowej oraz złożono wniosek o dofinansowanie z RFRD zadania polegającego na rozbudowie ul. Sadowej.	1. Zakończenie robót związanych z przebudową ul. Osadowej; 2. Rozpoczęcie robót związanych z rozbudową ul. Sadowej.	0,00 zł	13 062 244,00 zł
30	3.5	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ostrowieckiego poprzez modernizację kluczowych odcinków dróg powiatowych nr 1614T, nr 1613T oraz nr 1647T	Powiat Ostrowiecki	P	W 2023 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie rozbudowy dróg powiatowych nr 1613T oraz 1614T wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu inżynierskiego. W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania dokumentacji formalno-prawnej termin jej oddania to II kwartał 2026. W 2025 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 1614T - ul. Świętokrzyskiej od ronda im. 25-lecia NSZZ Solidarność do Pałacu Wielopolskich w Częstocicach. Zgodnie z podpisaną umową wykonawca zobowiązał się oddać dokumentację do 21 kwietnia 2027 r.	Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 1614T - ul. Świętokrzyska, odcinek od ronda im. 25-lecia NSZZ Solidarność do Pałacu Wielopolskich w Częstocicach. W II kwartale 2026 r. planowane jest przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi decyzjami, uzgodnieniami i opiniami, na podstawie której oszacowany będzie koszt wykonania robót budowlanych dot. rozbudowania odcinków dróg powiatowych nr 1613T oraz 1614T wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu inżynierskiego.	0,00 zł	0,00 zł
31	3.6	Wsparcie infrastruktury edukacyjno-sportowej oraz poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Nr 3	Powiat Ostrowiecki	R	1. Zadanie pn.: "Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrowcu Św." - w 2025 r. opracowano dokumentację projektową stanowiącą podstawę do przygotowania postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych. W listopadzie 2025 r. zawarto umowę z wyłoniętym wykonawcą robót z terminem realizacji do 30 października 2026 r. i przystąpiono do rzeczowej realizacji robót; 2. Zadanie pn.: "Poprawa efektywności energetycznej ZS Nr 3 oraz LO Nr II im. Joachima Chreptowicza" - w 2025 r. opracowano dokumentację projektową stanowiącą podstawę do przygotowania postępowania przetargowego. W listopadzie 2025 r. podpisano umowę z wyłoniętym wykonawcą robót z terminem realizacji do dnia 31 sierpnia 2026 r. i przystąpiono do rzeczowej realizacji robót.	Rzeczowa realizacja oraz zakończenie robót budowlanych w zakresie obu zadań. Dla zadania 1., zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe na zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby modernizowanych pracowni praktycznej nauki zawodu. Ponadto, w zakresie wsparcia infrastruktury sportowej, w przypadku możliwości aplikowania o środki finansowe w ramach dostępnych źródeł dofinansowania ze środków zewnętrznych, Zarząd Powiatu przeanalizuje możliwość realizacji przedmiotowego zakresu projektu z uwzględnieniem możliwości finansowych budżetu Powiatu.	0,00 zł	13 804 597,51 zł

32	3.7	Zagospodarowanie na terenie parku przy Pałacu Wielopolskich w Częstocicach	Powiat Ostrowiecki – Muzeum Historyczno-Archeologiczne	Z	Zadanie zostało zrealizowane w latach 2024-2025 w zakresie: zagospodarowania i rewitalizacji terenu parku okalającego zabytkowy Pałac Wielopolskich w Częstocicach poprzez wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu ciągów pieszych i pieszo-jezdnych oraz drogi dojazdowej w obrębie zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego wraz z uporządkowaniem zagospodarowania zieleni na terenie parku.	-	0,00 zł	3 290 742,00 zł
33	3.8	Osiedlowa Strefa Rekreacji – Ludwików	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Hutnik"	P	Nie podjęto ze względu na brak środków.	Nie przewiduje się żadnych działań w 2026 r.	0,00 zł	0,00 zł
34	3.9	Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy dawnych Zakładach Ostrowieckich	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Hutnik"	R	Wykonano dokumentację projektową dla części budynków.	Przetarg na dokumentację projektową dla kolejnych budynków.	0,00 zł	0,00 zł
35	3.10	Remont dróg wewnętrznych oraz ciągów pieszo-jezdnych na os. Hutniczym i os. Ludwików wraz z wykonaniem dodatkowych miejsc parkingowych	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Hutnik"	R	Częściowa naprawa ubytków na ciągach pieszo-jezdnych.	Miejscowe naprawy dróg wewnętrznych oraz ciągów pieszo-jezdnych.	0,00 zł	0,00 zł
36	3.11	Przebudowa zewnętrznej sieci ciepłej na os. Ludwików wraz z wykonaniem wewnętrznej instalacji c.c.w.	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Hutnik"	P	Nie podjęto ze względu na brak środków.	Projekt budowlano-wykonawczy "Zmiana lokalizacji węzła ciepłego zasilającego 14 budynków na os. Ludwików"	0,00 zł	0,00 zł
37	4.1	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim w obrębie ul. J. Samszonowicza – budowa dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą – etap II	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Urząd Miasta	R	W 2024 r. zawarto umowę na realizację zadania. W czerwcu 2025 r. opracowano wstępny projekt sytuacyjno-wysokościowy. Opracowano projekt budowlany wraz ze złożeniem wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla budowy publicznej drogi gminnej składającej się z pięciu odcinków o łącznej długości około 5086,24 m w ramach utworzenia i udostępnienia terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim. Uzyskano prawomocną decyzję ZRID z klauzulą natychmiastowej wykonalności uprawniającej do wykonania robót, opracowania dokumentacji wykonawczych, specyfikacji technicznych realizacji i odbioru robót dla wszystkich branż, przedmiotów robót oraz kosztorysów ofertowych zgodnych w zakresie robót z dokumentacją projektową. Wykonanie przedmiotu umowy ustalono na grudzień 2028 r.	Rozpoczęcie robót budowlanych po uzyskaniu w terminie do 22 maja 2026 r. prawomocnej decyzji ZRID. Pozyskanie dodatkowych środków na realizację projektu.	0,00 zł	60 364 016,50 zł
38	4.2.	Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim – Podobszar nr 4	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Urząd Miasta	P	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy nowego zagospodarowania PSP 9.	Uzyskanie dofinansowania na przedmiotowe zadanie.	0,00 zł	0,00 zł
39	4.3	Budowa, przebudowa, remonty dróg na Podobszarze nr 4	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Urząd Miasta	Z	Opracowano dokumentację projektową, zawarto umowę na realizację robót budowlanych, spisano końcowy protokół odbioru robót 13 lutego 2025 r.	-	0,00 zł	4 715 029,00 zł
40	4.4	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ostrowieckiego poprzez przebudowę/ remont drogi powiatowej nr 1624T - ul. Rudzkiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Powiat Ostrowiecki	P	W 2024 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na "Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1624T - ul. Rudzka w Ostrowcu Św." obejmującej odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1640T - ul. Jana Samszonowicza w Ostrowcu Św. do granicy administracyjnej z gminą Bodzechów (ok. 1566 m) od km 0+293 do km 1+859. W wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego	Do końca I półrocza 2026 r. planowane jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, na podstawie której możliwe będzie oszacowanie kosztu wykonania robót budowlanych dla planowanego przedsięwzięcia związanego z przebudową/ remontem drogi powiatowej nr 1624T.	0,00 zł	0,00 zł

					została zawarta umowa na realizację przedmiotu zamówienia. Termin wykonania przedmiotu umowy został wydłużony do 30.06.2026 r.			
41	5.1.	Zrównoważona i zintegrowana mobilność w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Urząd Miasta	R	Projekt "Zrównoważona i zintegrowana mobilność miejska w Gminach Ostrowiec Świętokrzyski i Kunów" Zadanie nr 1. Organizacja miejsc obsługi rowerzystów (MOR) w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski. W 2025 r. zakończono roboty związane z budową 7 MOR-ów. Zadanie 2. Organizacja systemu parkingowego w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski – trwa przygotowanie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy. Zadanie 3. Rozbudowa systemu dynamicznej informacji pasażerskiej w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski – w 2025 r. rozpoczęto prace projektowe dotyczące przyłączenia obiektów do sieci dystrybucyjnej PGE oraz proces produkcji 36 sztuk dwustronnych wyświetlaczy LED. W listopadzie 2025 r. odebrano 7 tablic, zawarto 15 umów przyłączeniowych z operatorem sieci. Zadanie 4. Montaż wiat przystankowych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski – w 2025 r. zakończono realizację zadania, tzn. wykonano 49 wiat przystankowych. Projekt "Poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym i pieszym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego" Zadanie 5. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym i pieszym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, tj. rozwój infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego z uwzględnieniem zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu w szczególności dla pieszych oraz rowerzystów, także poprzez doświetlenie przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych przy ulicach: Miodowa, Zwierzyniecka, Północna, Osadowa, Wronia, drogi łączącej ul. Polną z ul. Denkowską, Nowe Piaski, Metalurgów, drogi łączącej ul. Samsonowicza z ul. Metalurgów, Dunałka, Grzybowej, Granicznej, Kraszewskiego, Denkowskiej, Ogrodowej, Szymanowskiego. Zadanie 6. Elementy sprzyjające adaptacji do zmian klimatu, tj. urządzenie terenów zielonych w ramach prowadzonych robót drogowych - zadanie polegające na obsianiu trawą po uprzednim humusowaniu terenów wzdłuż ww. dróg dla rowerów i pieszych zostało w większości zrealizowane. Zadanie 7. Budowa wiat rowerowych na terenie miasta - wybudowanie w 26 lokalizacjach wiat rowerowych przy obiektach użyteczności publicznej - w 2025 r. podpisano umowę na realizację zadania. W 2025 r. wykonano 13 wiat spośród 39 do wykonania. Zadanie 7. Budowa wiat rowerowych na terenie miasta – wybudowanie w 2025 r. 13 wiat z 39 zaplanowanych.	Zadanie 2. Ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy zadania polegającego na organizacji i wdrożeniu systemu parkingowego na terenie gminy. Zadanie 3. Wykonanie wszystkich prac związanych z dostawą, montażem oraz uruchomieniem elementów systemu ora przeprowadzenie niezbędnych testów i odbiorów technicznych, umożliwiających jego pełne wdrożenie do użytkowania. Zadanie 5. oraz Zadanie 6. Realizacja inwestycji w obrębie ul. Osadowej oraz na obszarze Nowe Piaski (roboty drogowe, elementy infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, a także nasadzenia zieleni). Zadanie 7. Zakończenie planowane na 28 kwietnia 2026 r. Do tego czasu przewiduje się zakończenie wszystkich prac związanych z przygotowaniem terenu, dostawą i montażem wiat rowerowych oraz przeprowadzenie odbiorów końcowych inwestycji. Zadanie 8. Dla zadania pn. "System Roweru Miejskiego" ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dostawy, uruchomienia oraz obsługi systemu. Termin składania ofert wyznaczono na 31 marca 2026 r. Planowany termin uruchomienia Systemu Roweru Miejskiego określono na 1 kwietnia 2027 r.	0,00 zł	21 349 654,16 zł
42	5.2	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Urząd Miasta	Z	W 2024 r. ogłoszono i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy. W tym samym roku przystąpiono do prac projektowych związanych z doбором opraw oświetleniowych. W kwietniu 2025 r. odebrano roboty I etapu obejmującego modernizację 750 szt. istniejących punktów oświetleniowych, a w sierpniu 2025 r. odebrano II etap robót w ramach którego zmodernizowano pozostałe 600 szt. punktów oświetleniowych. Na obszarze objętym GPR zlokalizowanych jest 368 zmodernizowanych punktów oświetleniowych, co stanowi 27% całkowitego zakresu rzeczowego inwestycji.	–	0,00 zł	664 200,00 zł
43	5.3	Wsparcie aktywnego wyczynku seniorów – montaż ławek oraz spoczników przy głównych ciągach pieszych	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Urząd Miasta	O	–	–	0,00 zł	0,00 zł

44	5.4	Budowa, przebudowa i rozbudowa budynków na potrzeby gospodarki mieszkaniowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Urząd Miasta	R	Została wykonana dokumentacja projektowa na budowę trzech nowych budynków, przebudowę – adaptację budynku istniejącego oraz budowę nowego budynku w zarysie starego przy ul. Parkowej. Została wykonana dokumentacja projektowa na przebudowę istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu położonego przy ul. Osadowej 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim.	Planowane są prace budowlane dla budynku przy ul. Osadowej oraz pozyskanie środków na ul. Parkową.	0,00 zł	5 071 161,52 zł
45	5.5	Poprawa warunków mieszkalnych w budynkach komunalnych	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Urząd Miasta	R	Została wykonana dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę na budynki wielorodzinne przy ul. Kuźnia 48.	-	0,00 zł	0,00 zł
46	5.6	Wsparcie pozainstytucjonalne dla osób bezdomnych	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Centrum Usług Społecznych (MOPS)	R	1. Wyremontowano budynek noclegowni przy ul. J. Samsonowicza 80. W ramach aktywizacji społecznej i zawodowej bezdomni wykonali następujące prace: odgrzybianie, malowanie ścian, częściowa wymiana hydrauliki w łazience, uzupełniono ubytki w ścianach i podłogach, wymieniono drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, zlikwidowano progi, w łazience zamontowano uchwyty dla osób z niepełnosprawnością. 2. Do zadania "Pomoc w drodze" wykorzystywano samochód własny. Streetworkerzy wraz z pielęgniarką docierali busem do miejsc przebywania osób w kryzysie bezdomności. Świadczone im pomoc w zakresie: udostępnienia jedzenia, wody, gorących napojów i środków opatrunkowych, pomocy medycznej, w tym dowożenie do przychodni i specjalistów. 3. W noclegowni działa warsztat stolarski, w którym osoby w kryzysie bezdomności przyuczają się do zawodu stolarza. Stalarnia aktywizuje i integruje społecznie.	1. Kontynuowanie remontu noclegowni przy ul. J. Samsonowicza 80; 2. Pozyskanie środków na zakup nowego busa; 3. Poszerzenie oferty pomocowej dla osób w kryzysie bezdomności; 4. Zwiększenie dostępności i poprawa sytuacji tych osób.	0,00 zł	8 605 195,44 zł
47	5.7	Organizowanie Społeczności Lokalnej	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Centrum Usług Społecznych (MOPS)	R	Rozszerzono działanie "Organizowanie Społeczności Lokalnej" – praca z mieszkańcami osiedli położonych na obszarze rewitalizacji mająca na celu pobudzenie ich aktywności, odbudowanie lub tworzenie więzi wspólnotowych i międzyludzkich, wzmocnienie poczucia przynależności do danego miejsca oraz solidarności społecznej. Nastąpiło wzmocnienie i wspieranie grup społeczności znajdujących się w trudnym położeniu w nowych lokalizacjach (nowy MAL ul. Świętokrzyska 24, Kuźnia 28). W obu MALach zapewniono dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami. Powstał Klub Młodzieżowy Strefa 17 na Kuźni.	Kontynuacja prac we wszystkich lokalizacjach, szczególnie na Kuźni.	0,00 zł	22 954,00 zł
48	5.8	Miejsca Integracji Mieszkańców na obszarach rewitalizowanych w Ostrowcu Świętokrzyskim	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Centrum Rozwoju Lokalnego	P	-	Przedsięwzięcie planowane do realizacji po 2026 r.	0,00 zł	0,00 zł
49	5.9	Rozwój przedsiębiorczości na obszarach rewitalizacyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Centrum Rozwoju Lokalnego	R	<b>I. Przeprowadzone zostały konsultacje</b> w zakresie: zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, tworzenia biznesplanów, wypełniania wniosków o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, możliwości pozyskiwania środków na start. Z konsultacji skorzystało 69 osób. <b>II. Zorganizowano następujące a) spotkania informacyjne:</b> 1. „Baza usług rozwojowych”, we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach. W spotkaniu udział wzięło 17 osób; 2. „Dotacja z PUP na rozpoczęcie działalności gospodarczej”, we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim. W spotkaniu udział wzięło 9 osób; 3. „Pożyczka na samozatrudnienie – PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE”, we współpracy z Funduszem Pożyczkowym BARR S.A. W spotkaniu wzięło udział 12 osób; 4. „E-DORĘCZENIA w instytucjach administracji publicznej”. W spotkaniu wzięło udział 30 osób; 5. „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców”, we współpracy z Punktem Infor-	Kontynuacja dotychczasowych działań, tzn.: organizacja bezpłatnych konsultacji indywidualnych dotyczących przedsiębiorczości oraz organizacja spotkań informacyjnych, warsztatów, szkoleń, wizyt studyjnych itp., których tematyka związana będzie z obszarami problemowymi.	0,00 zł	0,00 zł

				<p>macyjnym Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego w Skarżysku-Kamiennej. W spotkaniu wzięło udział 19 osób; 6. „Oferta dla biznesu Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar” przeprowadzone we współpracy ze Świętokrzyskim Kampusem Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar. W spotkaniu wzięło udział 43 osoby; 7. „Urzędowe kontrole żywności przeprowadzane przez Państwową Inspekcję Sanitarną w zakładach branży spożywczej – jak skutecznie przygotować się do kontroli Sanepidu”, we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Ostrowcu Świętokrzyskim. W spotkaniu wzięły udział 22 osoby; 8. „Ochrona własności intelektualnej – zasady, możliwości, korzyści”, we współpracy z Urzędem Patentowym RP. W spotkaniu wzięły udział 34 osoby; 9. „Wypadki w pracy – obowiązki pracodawców i pracowników”, we współpracy z Okręgowym Inspektorem Pracy w Kielcach. W spotkaniu wzięło udział 20 osób; 10. „Oferta Świętokrzyskiego Funduszu Rozwoju”, we współpracy z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego w Skarżysku - Kamiennej oraz z Świętokrzyskim Funduszem Rozwoju w Kielcach. W spotkaniu wzięło udział 15 osób; 11. „ZUS dla przyszłych i obecnych przedsiębiorców”, we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Ostrowcu Świętokrzyskim. W spotkaniu wzięło udział 14 osób; 12. „E-fakturowanie – nowy obowiązek wystawiających faktury. Krajowy System e-Faktur (KSEF)”, we współpracy z Urzędem Skarbowym w Ostrowcu Świętokrzyskim. W spotkaniu wzięło udział 37 osób. <b>b) konferencje:</b> 1. Konferencja podsumowująca warsztaty z przedsiębiorczości „Dzisiaj uczeń, jutro przedsiębiorca!”, w których brali udział uczniowie klas ósmych ostrowieckich szkół podstawowych. W konferencji wzięło udział około 400 osób; 2. Konferencja podsumowująca konkurs plastyczny „Lokalne NIEBANALNE”, którego celem jest promocja ostrowieckich firm jednoosobowych i spółek cywilnych. Konkurs skierowany jest do uczniów ostrowieckich szkół podstawowych. W konferencji wzięło udział około 100 osób. <b>c) wizyty studyjne:</b> 1. Zorganizowano 28 wizyt studyjnych u przedsiębiorców działających w Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej dla dzieci i młodzieży z ostrowieckich szkół podstawowych. W wizytach udział wzięło 462 uczniów klas ósmych; 2. Zorganizowano 9 wizyt studyjnych w firmie Finow Polska Sp. z o.o. dla uczniów ostrowieckich technicznych szkół ponadpodstawowych. W wizytach udział wzięło 168 uczniów. <b>d) warsztaty:</b> 1. Przeprowadzono warsztaty z przedsiębiorczości pn. „Dzisiaj uczeń, jutro przedsiębiorca!” skierowane do uczniów klas ósmych ostrowieckich szkół podstawowych. W 28 warsztatach wzięło udział 462 uczniów; 2. Przeprowadzono warsztaty z przedsiębiorczości „Vademecum przedsiębiorczych” dla uczniów klas drugich i trzecich ostrowieckich szkół ponadpodstawowych. W 14 warsztatach udział wzięło 265 uczniów. <b>e) inne wydarzenia:</b> 1. Zorganizowano Jarmark Młodych Przedsiębiorczych. Wzięło w nim udział 62 Uczestników w formule indywidualnej oraz 22 Uczestników w formule dwuosobowego zespołu (11 zespołów – 6 szkół podstawowych i 5 szkół ponadpodstawowych) – łącznie 84 osoby; 2. Zorganizowano Regionalne Misje Gospodarcze - to miejsce spotkań handlowych oraz sieciowania biznesu działającego na terenie trzech miast: Ostrowca Świętokrzyskiego, Starachowic oraz Skarżyska-Kamiennej. Ich celem jest ożywienie gospodarcze Obszaru Funkcjonalnego „Trójmiasto nad Kamienną”. Inicjatywa organizacji Misji wyszła z samorządu ostrowieckiego. W RMG organizowanych w Ostrowcu udział</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

					wzięło ponad 40 podmiotów gospodarczych, a ich tematyka dotyczyła obronności i bezpieczeństwa.			
50	5.10	Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży – uczniów ostrowieckich szkół	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Centrum Rozwoju Lokalnego	Z	1. Zajęcia dodatkowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – zrealizowano łącznie 303 h; pozalekcyjne zajęcia dodatkowe: korekcyjno-kompensacyjne – 9 grup dla 45 os.; logopedyczne w PSP 5 – 3 grupy dla 12 os., socjoterapeutyczne w PSP 5 – 1 grupa dla 10 os. 2. Zajęcia dodatkowe dwujęzyczne – zrealizowano łącznie 263 h zajęć; pozalekcyjne zajęcia dodatkowe: informatyczne w PSP 4 – 2 grupy; j. angielski w PSP 5 – 4 grupy, matematyczne, w PSP 5 – 4 grupy oraz z nativespeaker'em w PSP 4 i PSP 5 – 4 grupy. 3. Warsztaty dziennikarskie w PSP 4 – zrealizowano łącznie 24 h warsztatów dla 15 osób. 4. Warsztaty teatralne w PSP 4 – zrealizowano łącznie 36 h warsztatów dla 30 osób. Zorganizowano i przeprowadzono wyjazd do teatru dla uczestników warsztatów. 5. Zrealizowano łącznie 327 h doradztwa zawodowego dla uczniów PSP 4 i PSP 5.	–	0,00 zł	844 340,58 zł
51	5.11	Budowanie umiejętności i kompetencji ostrowieckich organizacji pozarządowych i grup nieformalnych	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Centrum Rozwoju Lokalnego	R	W 2025 roku CRL współpracowało z organizacjami pozarządowymi prowadząc Centrum Aktywności Obywatelskiej (CAO). Centrum stało się miejscem służącym integracji międzypokoleniowej i aktywizacji bardzo różnych środowisk. CAO wspiera organizacje pozarządowe, podmioty działające w zakresie aktywności obywatelskiej i edukacji, sportu, kultury, oświaty, wychowania i profilaktyki, podmioty ekonomii społecznej, podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, podmioty realizujące zadania na zlecenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski (poprzez użyczenie lokali, wynajem lokali, udostępnienie adresu). W 2025 roku z oferty lokalowej CAO korzystało 21 podmiotów (16 umów na użyczenie lokali oraz 5 umów na wynajem lokali/sali szkoleniowej). W ramach Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (CWIS-E) przeprowadzono 47 usług doradczych. W 2025 r. zorganizowano następujące spotkania i szkolenia dla przedstawicieli NGO: • Współpraca podmiotów ekonomii społecznej z lokalnym samorządem kluczem do efektywnych usług społecznych) – 102 os.; • Wprowadzenie do zarządzania organizacją pozarządową – misja, wizja, cele, struktura organizacyjna, rola lidera (Akademia Liderów i Animatorów NGO) - 11 os.; • Dotacje na realizację zadań publicznych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski – 11.03.2025r. – 17 os.; • Rozwój osobisty lidera – umiejętności przywódcze, zarządzanie czasem, radzenie sobie ze stresem (Akademia Liderów i Animatorów NGO) – 12 os.; • Komunikacja w organizacji pozarządowej - komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna, budowanie relacji, promocja organizacji (Akademia Liderów i Animatorów NGO) - 14 os.; • Program: Świętokrzyski Fundusz Lokalny – 19 os.; • Fundusze Europejskie Dla NGO na lata 2021-2027 – 14 os.; • Prawo dla organizacji pozarządowych – przepisy dotyczące działalności NGO (Akademia Liderów i Animatorów NGO) – 12 os.; • Marketing dla NGO – budowanie marki organizacji, promocja w mediach społecznościowych – 6 os.; • Zarządzanie projektami – cykl życia projektu, planowanie, monitorowanie i ewaluacja – 9 os.; • Finanse w NGO – rachunkowość, sprawozdawczość finansowa, pozyskiwanie sponsorów – 8 os.; • Podnoszenie potencjału partnerów społecznych ...- warsztaty z pisania projektów do działania 9.6 programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – 6 os. 278 razy udostępniono sale szkoleniowo-doradcze. Organizacje pozarządowe promowane były poprzez wykorzystanie	Kontynuacja działań w zakresie: doradztwa indywidualnego, udzielania pomocy merytorycznej organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym, prowadzenia wspólnych przedsięwzięć na rzecz społeczności lokalnej, organizacja szkoleń, seminariów i konferencji, organizacja wizyt studyjnych, promocja III sektora w Ostrowcu Św., udostępnianie zaplecza techniczno-lokalowego na preferencyjnych warunkach w budynku Centrum Aktywności Obywatelskiej.	0,00 zł	0,00 zł

					<p>strony internetowej CRL (www.crl.ostrowiec.pl) i funpage'u FB CRL. Na kanałach informacyjnych CRL publikowane były informacje dotyczące ogłaszanych konkursów i grantów dedykowanych dla NGO. Ponadto zrealizowana została kampania informacyjno-promocyjna dotycząca możliwości przekazania 1,5% należnego podatku dochodowego na rzecz NGO. W ramach realizacji zadania wykonano i wyemitowano 60-sekundowy spot promujący organizację pozarządową oraz ideę ekonomii społecznej, skierowany do mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego. Spot był emitowany przez 10 dni w telewizji regionalnej, w systemie zapętlenia – 24 emisje dziennie oraz funpage'u FB CRL. w okresie sprawozdawczym udzielono pomocy w przygotowaniu ofert realizacji zadania publicznego oraz wniosku o dofinansowanie dla Fundacji „Z SERCA”, trzech ofert dla Stowarzyszenia Sport Academy Ostrowiec, dwóch ofert dla Polskiego Towarzystwa Stomijnego POL-ILKO Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim, trzech ofert dla Fundacji Vis in Actu, dwóch ofert dla Stowarzyszenia „Razem dla Piątki” oraz dla Fundacji „Pomocna Dłoń” i Ostrowieckiego Stowarzyszenia Środowisk Twórców Kultury Ziemi Świętokrzyskiej Klub Literacki „Aspekt”. Zawarto 3 porozumienia o współpracy między CRL a (1) Stowarzyszeniem Osiedlowy Klub Aktywnych Seniorów dotyczące organizacji działań edukacyjnych na rzecz osób starszych – mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego (organizacja spotkań edukacyjnych), (2) – Miejskim Centrum Kultury oraz Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” dotyczące aktywizacji młodzieży, dorosłych oraz seniorów w dobrowolną działalność na rzecz lokalnej społeczności oraz (3) Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” dotyczące rozwoju kompetencji osób zaangażowanych w działalność organizacji pozarządowych. Realizowane były działania edukacyjne na temat prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej wśród młodzieży oraz mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego – szkolenia z edukacji obywatelskiej dla uczniów klas VII szkół podstawowych – 7 edycji (78 os.) oraz wizyty studyjne połączone z warsztatami nt. ekonomii społecznej dla młodzieży szkół ponadpodstawowych – łącznie 2 edycje oraz wizyta studyjna dla NGO (Obywatelskie Świętokrzyskie). Prowadzono działania wspierające nawiązywanie kontaktów pomiędzy organizacjami pozarządowymi – zrealizowano Randki Obywatelskie „Współpraca zamiast konkurencji – razem dla Ostrowca Świętokrzyskiego” jako działanie sieciujące lokalne organizacje pozarządowe oraz przedstawicieli innych sektorów. W wydarzeniu wzięli udział aktywiści społeczni, edukatorzy, przedstawiciele samorządu oraz lokalnego biznesu łącznie 47 osób. Dyrektor i pracownicy CRL spotykali się z przedstawicielami lokalnych NGO, w tym organizacji wspierających ostrowieckich seniorów, zorganizowano 10 spotkań wspierających nawiązywaniu kontaktów pomiędzy samorządem oraz organizacjami pozarządowymi.</p>			
52	5.12	Festiwal Wielki Ogień im. Miry Kubasińskiej	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Miejskie Centrum Kultury	Z	<p>W dniach 11-13 lipca 2025 r. odbył się XVIII Festiwal im. Miry Kubasińskiej "Wielki Ogień". Podczas wydarzenia na dziedzińcu OBK zaprezentowało się 14 zespołów konkursowych. Odbyły się również koncerty gwiazd, wystawy plenerowe oraz Konkurs Młodych Wykonawców.</p>	Organizacja kolejnej trzydniowej edycji Festiwalu – złożono wnioski o dofinansowanie XIX edycji "Wielkiego Ognia" do MKiDN – brak dofinansowania na 2026 r.	0,00 zł	85 000,00 zł
53	5.13	Festiwal Interdyscyplinarnej IronART FESTIWAL	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski –	O	–	–	0,00 zł	0,00 zł

			Miejskie Centrum Kultury					
54	5.14	Legendy Ostrowca Świętokrzyskiego – międzypokoleniowe spotkania artystyczne ze sztuką murali	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Biuro Wystaw Artystycznych	R	W 2025 r. powstał 1 mural autorstwa Marcina Jedlikowskiego na os. Kuźnia oraz przeprowadzono cykl warsztatów z budowania tożsamości lokalnej (16 wydarzeń)	Złożono projekt do NCK - "Miejsce wspólne - kontynuacja. Praktyki otwartości BWA Ostrowiec Świętokrzyski". Obejmuje on realizację 2 wystaw z całym programem edukacyjnym oraz stworzenie kolejnego muralu w przestrzeni miasta objętej GPR.	0,00 zł	59 000,00 zł
55	5.15	Rozszerzenie oferty programowej Centrum Integracji Społecznej	Fundacja Pomocna Dłoń	P	Rozeznanie potrzeb grupy docelowej (osoby wykluczone zawodowo i społecznie), wsparcie osób potrzebujących poprzez zatrudnienie socjalne w Centrum Integracji Społecznej oraz wsparcie psychologów, psychoterapeutów uzależnień, doradztwo obywatelskie oraz zawodowe, pracownika socjalnego. Doposażono grupy szkoleniowe w niezbędny sprzęt.	Udział w konkursach o pozyskanie środków do realizacji założeń rewitalizacji	0,00 zł	891 728,11 zł
56	5.16	"Akademia kreatywnych umysłów" – Między świetlicowa integracja wychowanków świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii, prowadzonych przez PCK i znajdujących się na terenie publicznych szkół podstawowych miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	Oddział Rejonowy PCK	R	ŚOO PCK w Kielcach/ OR PCK w Ostrowcu Św. prowadziło 8 świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii. W ramach zajęć opiekuńczo-wychowawczych w 2025 r. udział wzięło 210 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i niezaradnych życiowo. Świetlice umożliwiają dzieciom rozwijanie swoich pasji i zainteresowań, dają interesującą formę spędzania czasu wolnego. Zajęcia były zróżnicowane i obejmowały: organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację gier i zabaw na świeżym powietrzu oraz zajęć sportowych, wyjścia do parku, na Gutwin, do kina, itp., pomoc w kryzysach rodzinnych, rówieśniczych, osobistych, pomoc socjalna, zapewnienie poczęstunku, warsztaty z pierwszej pomocy, półkolonie, spotkanie z okazji Dnia Dziecka, wigilijno-mikołajkowe. Wręczono 20 paczek.	W przypadku pozyskania środków kontynuowanie działania, zakup specjalistycznego sprzętu do przeprowadzania zajęć, wzbogacenie oferty świetlicowej	0,00 zł	548 385,50 zł
57	5.17	Organizacja wsparcia specjalistycznego w ramach świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Bezrobotnych	O	Z uwagi na brak środków finansowych oraz wskazania miejsca realizowanego przedsięwzięcia odstąpiono od jego realizacji.	-	0,00 zł	0,00 zł
58	5.18	Modernizacja Centrum Aktywności Obywatelskiej	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Urząd Miasta	R	Wykonano dokumentację projektową. Złożono wnioski o dofinansowanie na termomodernizację obiektu.	-	0,00 zł	0,00 zł
59	5.19	Rozwój i rozszerzenie oferty "Centrum Seniora" w Ostrowcu Świętokrzyskim	Fundacja Pomocna Dłoń	P	Dotychczasowe działania polegały na rozeznaniu potrzeb grupy docelowej – Seniorów; doposażeniu placówki w projektor oraz ekran projekcyjny, wykorzystywany w ramach zajęć - zakupiono ze środków Gminy na prowadzenie "Centrum Seniora". Rozszerzono zakres działania, zwiększono ilość miejsc z 30 do 50 osób. Na bieżąco śledzona jest możliwość pozyskania dodatkowych środków. Wszystkie te działania są wstępne przed realizacją założeń w ramach rewitalizacji i nie wymagały dodatkowych nakładów finansowych poza wspieranym przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski prowadzeniem "Centrum Seniora".	Doposażenie placówki w celu podniesienia jakości zajęć – zakup szaf na akta, kolorowej drukarki, pralki oraz dwóch komputerów na zajęcia z informatyki dla Seniorów.	0,00 zł	239 748,08 zł

Lp.	Nr przedsięwzięcia	Nazwa przedsięwzięcia	Podmiot realizujący	Wskaźniki osiągnięte w roku sprawozdawczym	Wskaźniki osiągnięte od początku realizacji
1.	2.8	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ostrowieckiego poprzez przebudowę/remont odcinków dróg powiatowych nr 1613T, nr 1609T, nr 1646T, nr 1644T oraz nr 1649T	Powiat Ostrowiecki	Długość wyremontowanych, przebudowanych lub zmodernizowanych dróg - 0,428 km	Długość wyremontowanych, przebudowanych lub zmodernizowanych dróg – 0,428 km
2.	2.19	Akademia Bezpieczeństwa PCK	Oddział Rejonowy PCK	–	Liczba osób przeszkolonych rocznie – 120 osób Liczba warsztatów z zakresu bezpieczeństwa zorganizowanych w ciągu roku – 12 szt.
3.	3.4	Budowa, przebudowa, remonty dróg na Podobszarze nr 3	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Urząd Miasta	Długość wyremontowanych, przebudowanych lub zmodernizowanych dróg – 2,477 km	Długość wyremontowanych, przebudowanych lub zmodernizowanych dróg – 4,952 km
4.	3.7	Zagospodarowanie na terenie parku przy Pałacu Wielopolskich w Częstocicach	Powiat Ostrowiecki – Muzeum Historyczno-Archeologiczne	Liczba zrewitalizowanych parków – 1 szt.	Liczba zrewitalizowanych parków – 1 szt.
5.	4.3	Budowa, przebudowa, remonty dróg na Podobszarze nr 4	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Urząd Miasta	Długość wyremontowanych, przebudowanych lub zmodernizowanych dróg – 0,723 km	Długość wyremontowanych, przebudowanych lub zmodernizowanych dróg – 0,723 km
6.	5.1	Zrównoważona i zintegrowana mobilność miejska w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Urząd Miasta	Wspierana infrastruktura rowerowa – 8,45 km	Wspierana infrastruktura rowerowa – 10,11 km
7.	5.2	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Urząd Miasta	Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia ulicznego – 368 szt.	Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia ulicznego – 1118 szt.
8.	5.6	Wsparcie pozainstytucjonalne dla osób bezdomnych	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Centrum Usług Społecznych	Liczba miejsc noclegowych w noclegowni – 22 szt. Liczba osób w kryzysie bezdomności, które skorzystały z „Pomocy w drodze” – 70 osób	Liczba miejsc noclegowych w noclegowni – 44 szt. Liczba osób w kryzysie bezdomności, które skorzystały z „Pomocy w drodze” – 112 osób
9.	5.7	Organizowanie Społeczności Lokalnej	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Centrum Usług Społecznych	Liczba osób objętych pracą socjalną w formule organizowania społeczności lokalnej – 300 osób	Liczba osób objętych pracą socjalną w formule organizowania społeczności lokalnej – 1211 osób
10.	5.9	Rozwój przedsiębiorczości na obszarach rewitalizacyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Centrum Rozwoju Lokalnego	Liczba osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej biorących udział w spotkaniach konsultacyjnych, spotkaniach informacyjnych – 85 osób; Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą biorących udział w spotkaniach informacyjnych, szkoleniach – 266 osób	Liczba osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej biorących udział w spotkaniach konsultacyjnych, spotkaniach informacyjnych – 263 osoby; Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą biorących udział w spotkaniach informacyjnych, szkoleniach – 564 osoby
11.	5.10	Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży – uczniów ostrowieckich szkół	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Centrum Rozwoju Lokalnego	Liczba uczniów uczestniczących w przedsięwzięciu – 325 osób Liczba zrealizowanych godzin zajęć edukacyjno-rozwojowych – 953 godz.	Liczba uczniów uczestniczących w przedsięwzięciu – 496 osób Liczba zrealizowanych godzin zajęć edukacyjno-rozwojowych – 1456 godz.

12.	5.11	Budowanie umiejętności i kompetencji ostrowieckich organizacji pozarządowych i grup nieformalnych	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Centrum Rozwoju Lokalnego	Liczba przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych uczestniczących w przedsięwzięciu – 25 osób; Liczba godzin edukacyjno-doradczych skierowanych do przedstawicieli NGO, grup nieformalnych i aktywnych mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego – 47 h; Liczba wydarzeń (wizyt studyjnych, dni otwartych NGO, spotkań integracyjnych) skierowanych do przedstawicieli NGO, grup nieformalnych i aktywnych mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego – 3 szt.	Liczba przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych uczestniczących w przedsięwzięciu – 50 osób; Liczba godzin edukacyjno-doradczych skierowanych do przedstawicieli NGO, grup nieformalnych i aktywnych mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego – 87 godz. ; Liczba wydarzeń, wizyt studyjnych, dni otwartych NGO, spotkań integracyjnych) skierowanych do przedstawicieli NGO, grup nieformalnych i aktywnych mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego – 4 szt.
13.	5.12	Festiwal Wielki Ogień im. Miry Kubasińskiej	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Miejskie Centrum Kultury	Liczba słuchaczy (widzów) biorących osobiście udział w wydarzeniu kulturalnym – 10 000 osób; Liczba wydarzeń kulturalnych takich jak koncerty, konkursy, spektakle, wystawy, kursy, warsztaty, sesje, konferencje, wykłady – 13 szt.	Liczba słuchaczy (widzów) biorących osobiście udział w wydarzeniach kulturalnych – 15 000 osób; Liczba wydarzeń kulturalnych, takich jak koncerty, konkursy, spektakle, wystawy, kursy, warsztaty, sesje, konferencje, wykłady – 23 szt.
14.	5.14	Legendy Ostrowca Świętokrzyskiego – międzypokoleniowe spotkania artystyczne ze sztuką murali	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Biuro Wystaw Artystycznych	Liczba zrealizowanych warsztatów – 16 szt. Liczba wykonanych murali – 1 szt.	Liczba zrealizowanych warsztatów – 16 szt. Liczba wykonanych murali – 1 szt.
15.	5.16	"Akademia kreatywnych umysłów" – Międzyświatlicowa integracja wychowanków świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii, prowadzonych przez PCK i znajdujących się na terenie publicznych szkół podstawowych miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	Oddział Rejonowy PCK	Liczba dzieci ze świetlic środowiskowych w wieku 7-15 lat korzystających z oferty – 100 osób; Liczba zorganizowanych wydarzeń – 12 szt. Liczba przeprowadzonych warsztatów – 84 szt.	Liczba dzieci ze świetlic środowiskowych w wieku 7-15 lat korzystających z oferty – 200 osób; Liczba zorganizowanych wydarzeń – 22 szt. ; Liczba przeprowadzonych warsztatów – 164 szt.
16.	5.19	Rozwój i rozszerzenie oferty „Centrum Seniora” w Ostrowcu Świętokrzyskim	Fundacja Pomocna Dłoni	–	Liczba uczestników korzystających z oferty „Centrum Seniora” – 140 osób; Liczba godzin zajęć realizowanych w „Centrum Seniora” – 361 godz.

**Raport zatwierdził:**

Dominik Smoliński

Naczelnik Wydziału Planowania i Rozwoju
